

令和５年度 第１回 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 配布資料一覧

○会議次第

○資料１ 公共施設等総合管理計画の進捗状況について

○資料２ 寒川町公共施設再編計画進行管理票

○資料３ 進捗状況管理シート

○資料４ 公民連携セミナーチラシ

○資料５ 寒川町公共施設再編整備基金条例の概要について

○資料６ 寒川町ＰＦＩ等選定委員会条例の概要について

令和5年度 第1回 公共施設再編計画進行管理委員会 会議次第

日時：令和5年11月10日（金）

9時30分から

場所：町民センター 講義室

1. 開会

2. 議題

（1）議事録承認委員の指名

（2）公共施設等総合管理計画の進捗状況について
（令和4年度の事業実施事項についての報告）

3. その他

4. 閉会



寒川町公共施設等総合管理計画の 進捗状況について

2023年11月10日



目次

1.公共施設再編計画 実施体制について・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2.公共施設再編計画 令和4年度実施事項について・・・・・・・・	7
3.令和4年度に進めたものについて・・・・・・・・・・・・・・・・	27


＊この資料内の金額について

・表示単位未満を切り上げて表記しています。

1 .公共施設再編計画 実施体制について


1. 公共施設再編計画 実施体制について

1-1. 寒川町公共施設再編計画の位置付け

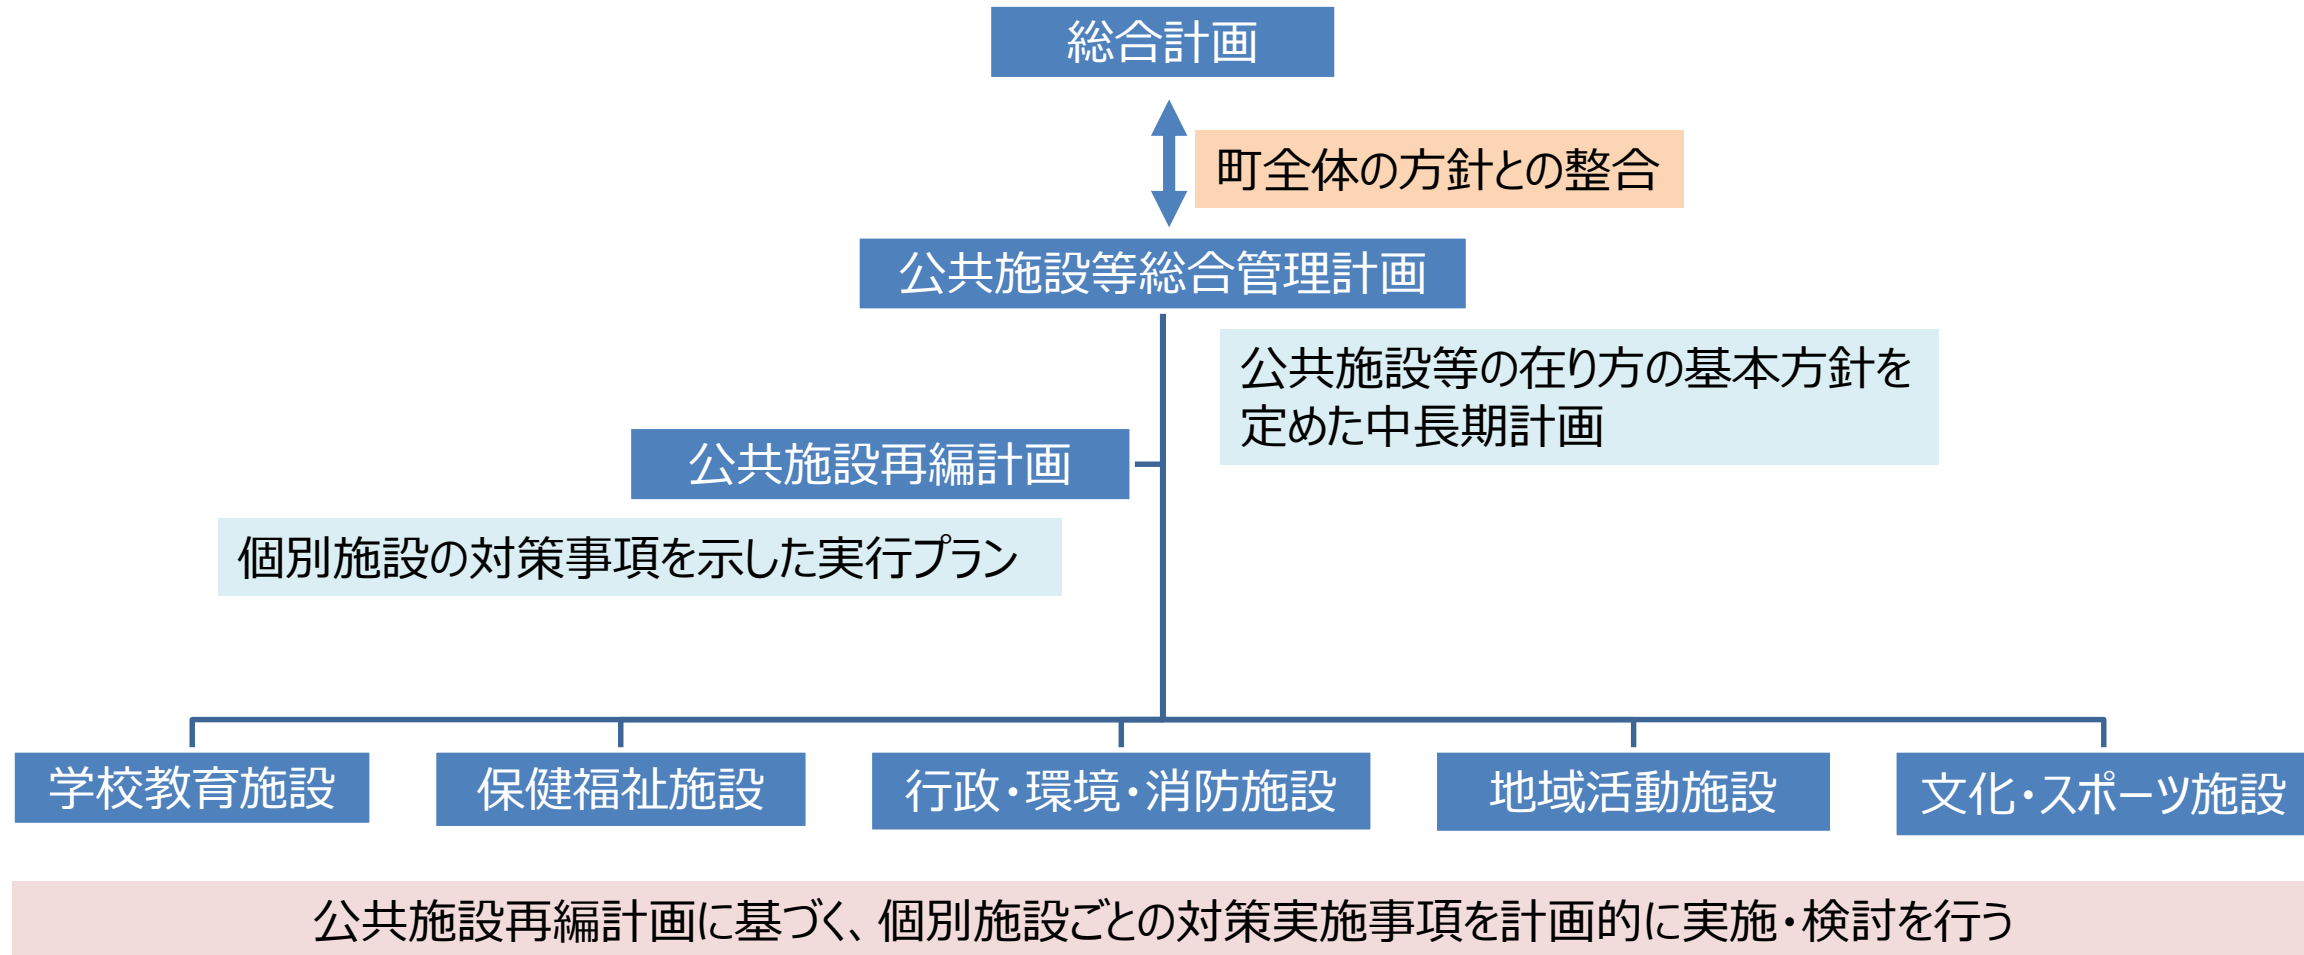


1. 公共施設再編計画 実施体制について

1-2. 公共施設再編計画の実施体制

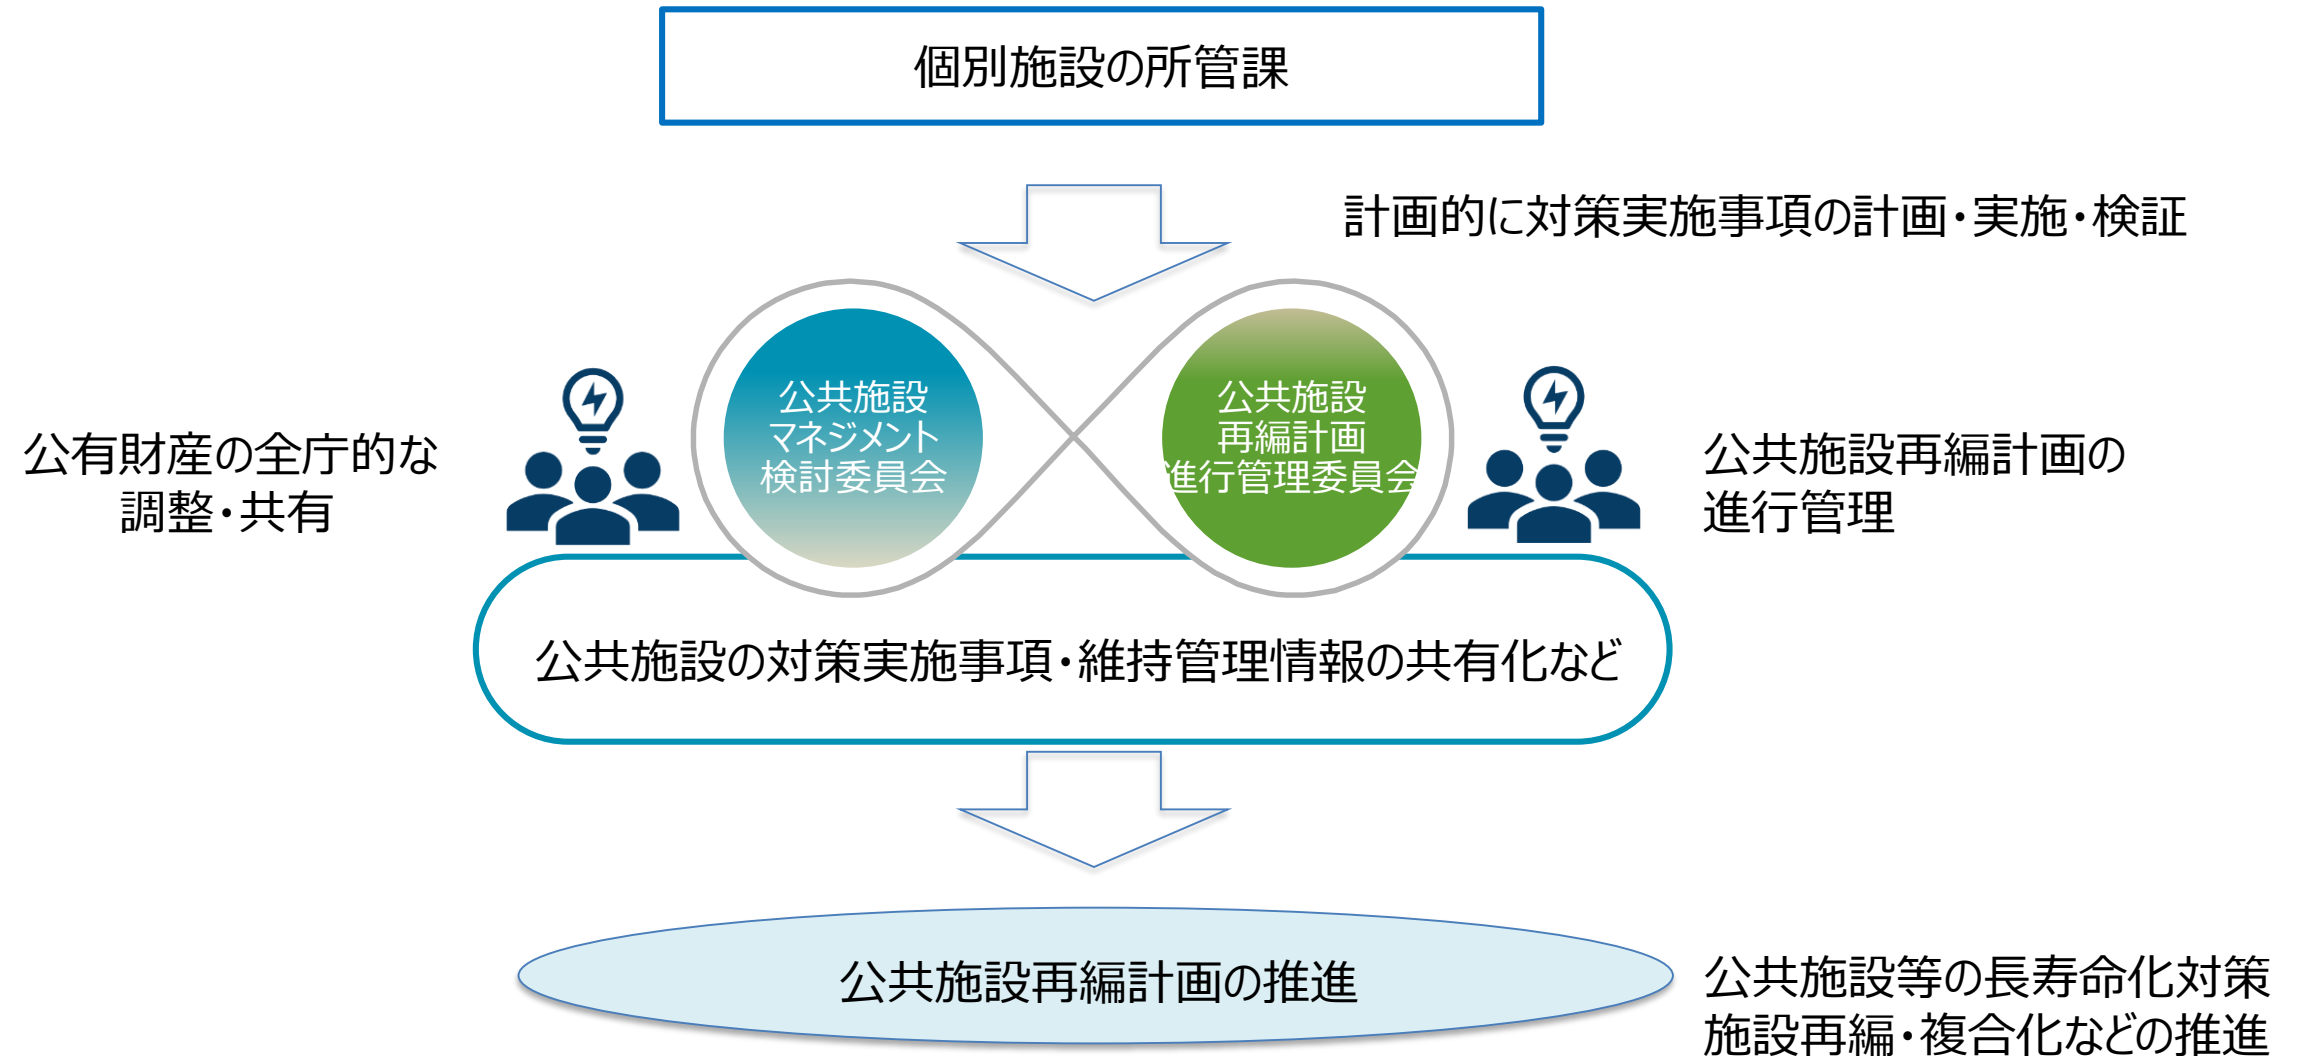

1. 公共施設再編計画 実施体制について

1-3. 公共施設再編計画のPDCAサイクル

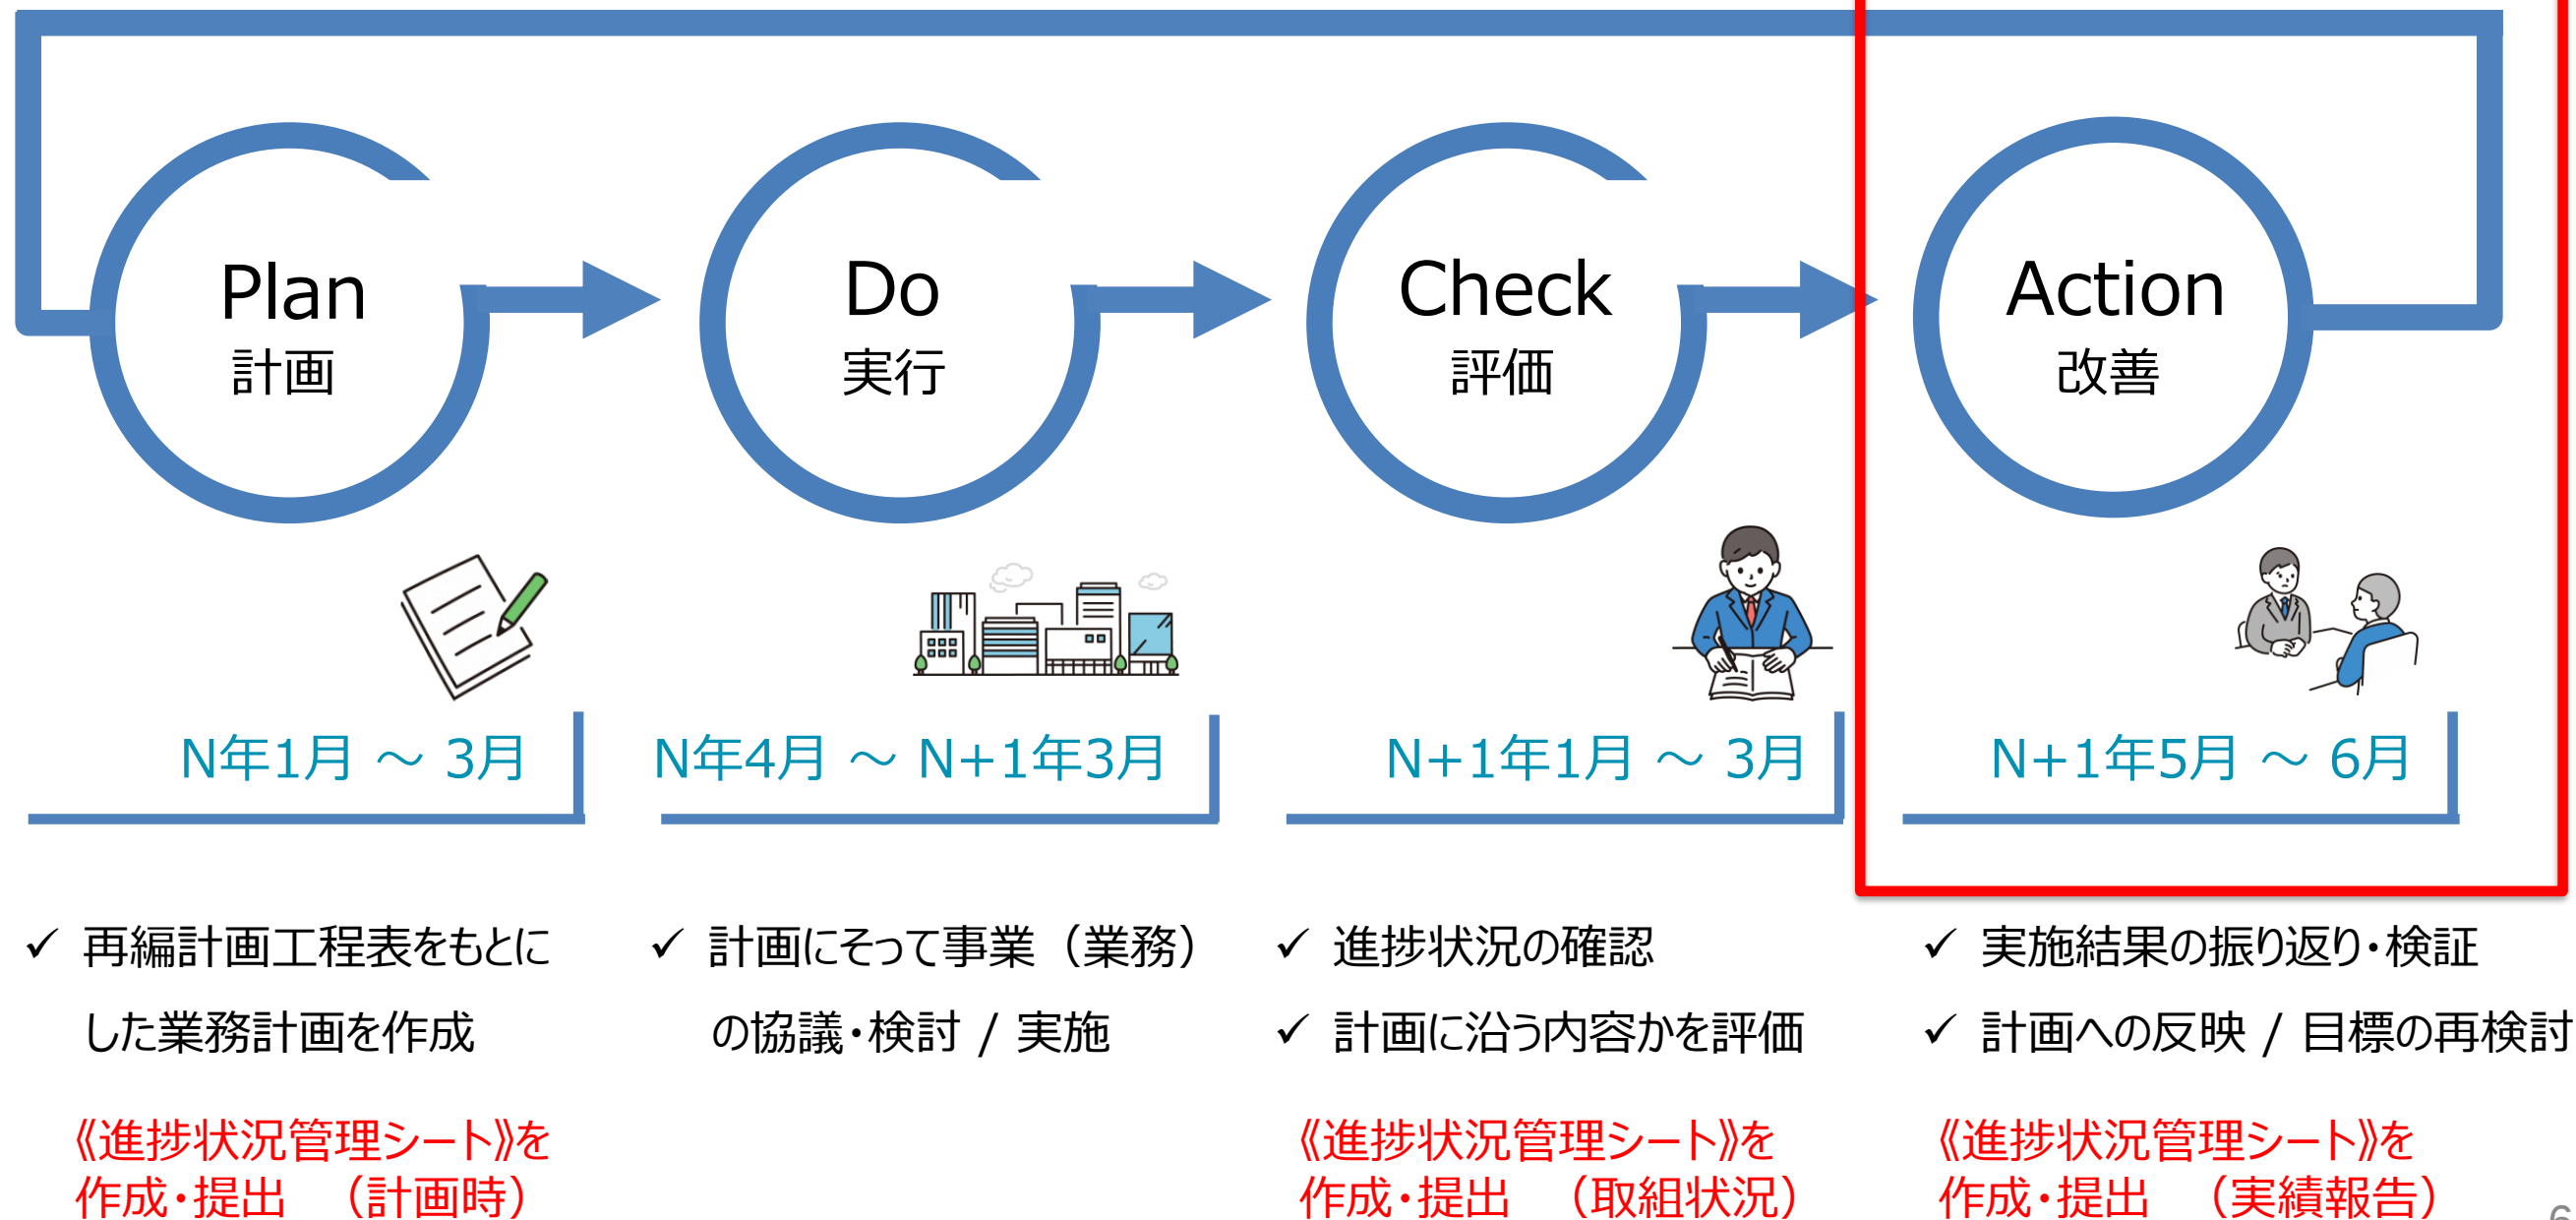

2 .公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

2.公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

○再編計画における令和4年度実施事項一覧

対象施設	再編計画計上額(千円)	計画年度	決算額(千円)	実施年度
①ふれあいセンター 設備機能修繕	2,000	R4	1,804	R4
②健康管理センター アスベスト含有分析調査	517	R4	— (P.11参照)	—
③総合体育館外壁面補修・アルミ製建具（引違い・すべり出し）等修繕	9,200	R4	— (P.12参照)	—
④総合体育館 アルミ製建具（固定式）更新	12,573	R4	— (P.12参照)	—
⑤総合体育館 吸収式冷温発生機修繕	17,600	R4	— (P.13参照)	—
⑥総合体育館 多目的室AV設備更新	10,000	R4	1,573	R4
⑦総合体育館 中央監視盤等更新	58,564	R4	7,579	R3
⑧総合体育館 体育器具設備修繕	6,608	R4 一部R9	10,560	R4
⑨総合体育館 武道場空調機新設工事	45,000	R4	— (P.16参照)	—
⑩総合体育館 武道場サブアリーナ空調機設置工事設計委託	—	—	8,278	R4
⑪総合体育館 サウナ浴槽設備修繕工事	10,000	R4	1,210	R4
⑫総合体育館 高圧ケーブル更新工事	—	—	3,520	R4
⑬総合体育館 アスベスト調査委託	—	—	490	R4
2022(R4)年度 小計	172,062		35,014	

「—」の表記は再編計画上、未計上、未実施事項となります。

2.公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

○再編計画における令和4年度実施事項一覧

対象施設	再編計画計画額(千円)	計画年度	決算額(千円)	実施年度
⑭寒川東中学校 外壁修繕工事	35,000	R4	21,237	R4
⑮一之宮小学校 外壁修繕工事	35,000	R4	26,681	R4
⑯旭が丘中学校外壁修繕工事設計委託	—	—	2,178	R4
⑰旭小学校小谷小学校外壁修繕工事設計委託	—	—	4,180	R4
⑱寒川総合図書館 1階空調機修繕	1,096	R4	1,253	R4
⑲寒川総合図書館 4階空調機修繕	634	R4	880	R4
⑳寒川総合図書館 自動ドア装置更新修繕	1,169	R4	1,272	R4
㉑南部地域の新たな消防拠点整備	40,000	R4	—(P.22参照)	—
㉒北部地域の新たな消防拠点整備	—	R9以降	2,212	R4
㉓美化センター 機器類定期修繕	49,306	R4	40,442	R4
㉔町営プール 整備費償還	28,248	R3以降	25,681	R4
2022(R4)年度 小計	190,453		126,016	
2022(R4)年度 合計	362,515		161,030	

「—」の表記は再編計画上、未計上、未実施事項となります。

2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

①ふれあいセンター設備機能修繕：1,804千円

平成15年（2003年）3月建設（20年経過）

- ・柱上高圧気中開閉器（＊）及び高圧ケーブル、高圧交流負荷開閉器の交換を実施。

＊ 柱上高圧気中開閉器：異常電流が発生した場合、近隣への被害を最小限に抑えるため、電流を遮断する物。



2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

②健康管理センターアスベスト含有分析調査

保健福祉の集約施設を「白紙」としたことにより、再編計画で令和5年度に予定していた健康管理センター解体工事も見直しとなり、分析調査を未実施とした。

【白紙とした理由】

- ・子育てサポートセンターに賃貸借契約延長が可能となったため。
- ・神奈川県福祉事務所の茅ヶ崎市保健所からの撤退期日が不透明となったため。

【今後の対応】

- ・健康管理センターを一旦、仮設にすることを含め対応策を検討。

2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

シンコースポーツ寒川アリーナ（寒川総合体育館）

平成9年（1997年）11月建設（25年経過）

③総合体育館外壁面補修・アルミ製建具（引違・すべり出し）等修繕

④総合体育館アルミ製建具（固定式）更新

- ・アルミ製建具は令和4年度工事予定であったが、修繕箇所の選定に時間を要したこと や設計が必要であったため、職員による設計を実施し、**工事は令和5年度に実施。**
- ・外壁面補修は、**劣化度合いからアルミ製建具の修繕を優先したことにより、将来的に公民連携手法を導入した際の改修に含むことを検討している。**



2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

⑤総合体育館 吸収式冷温水発生機修繕

- ・令和4年度修繕予定であったが、空調機設置工事との調整や設計が必要となったため令和4年度に実施した設計の内容を反映し、**令和5年度に実施。**



吸収式冷温水発生機

⑥総合体育館 多目的室AV設備更新：1,573千円

- ・既存設備の修繕を予定していたが、多目的室以外の場所でも利用できる移動式の音響設備を導入することが効果的かつ安価なため、機器更新とした。



多目的AV設備

2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

⑦総合体育館 中央監視盤等更新：7,579千円 **【令和3年度実施】**

- ・契約額：37,891千円/60ヶ月（＝機械リース契約）
- ・令和3年度中に故障し臨時的な応急措置で仮復旧をしたが、設備機器が古いことや再度故障した際、施設運営に支障をきたすことから、前倒しにて実施。



2.公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

⑧総合体育館 体育器具設備修繕

■バスケットゴールの更新：7,810千円

故障が続くことからバスケットゴールの修繕を予定していたが、耐用年数を超過し部品調達ができないとの指摘を受けたため、再度故障した際の安全面及び施設運営に支障をきたすため、購入とした。



■武道場の畳の更新：2,750千円

計画上、令和9年度更新予定の畳の損傷がひどく、ケガのもとになる可能性が高かったため、前倒しにして実施した。



2.公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

⑨総合体育館 武道場空調機新設工事

- ・令和4年度工事予定であったが、吸収式冷温水発生機修繕と関連し、その調整に時間を要したことや設計が必要であったため、令和4年度は設計を実施し、**工事はサブアリーナと合わせて令和5年度に実施。**



⑩総合体育館 武道場サブアリーナ空調機設置工事設計委託：8,278千円

- ・再編計画上、サブアリーナ空調機設置工事費の計上はないが、武道場と同様防災の拠点となることから、新たに空調機を設置するため設計を実施。



2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

⑪総合体育館 サウナ浴槽設備修繕工事：1,210千円

- ・老朽化により浴槽設備修繕を予定していたが、給湯ミキシングバルブ及びスチームサウナ温調弁が故障し、使用できない状態となったため、緊急度の高い修繕箇所を実施。

⑫総合体育館 高圧ケーブル更新工事：3,520千円

- ・耐用年数である20年を経過し、漏電等の恐れがあることから工事を実施。

⑬総合体育館 アスベスト調査委託：490千円

- ・令和5年度実施工事のために、アスベスト含有調査を実施。



2.公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

⑭寒川東中学校外壁修繕：21,237千円

平成元年（1989年）3月建設



⑮一之宮小学校外壁修繕：26,681千円



昭和56年（1981年）3月建設



・各校とも外壁の経年劣化による落下防止の為の対策を実施。

2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

- ・外壁の経年劣化による落下防止の為の対策を実施

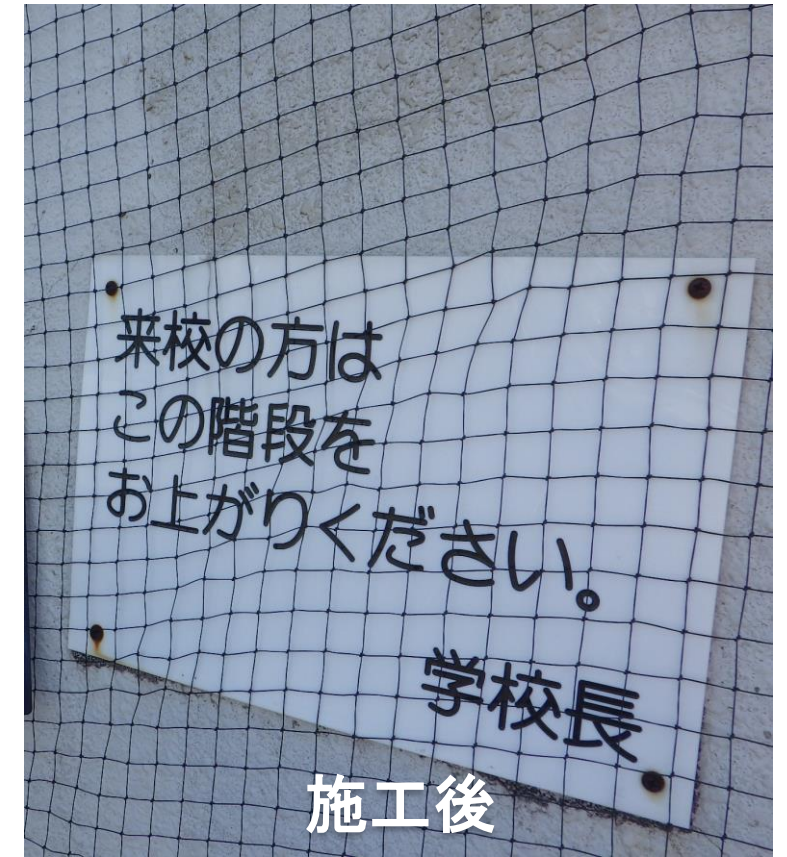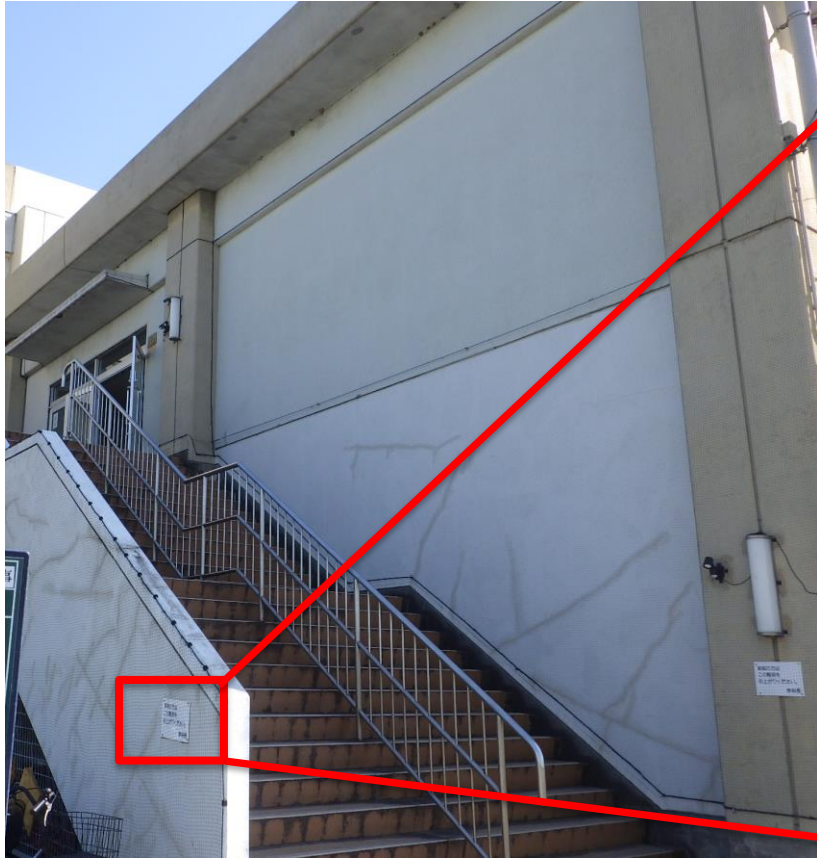



外壁にネットを張り補強
(寒川東中学校北棟北面)

2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

①⑥旭が丘中学校外壁修繕工事設計委託：2,178千円

①⑦旭小学校小谷小学校外壁修繕設計委託：4,180千円

・各校とも外壁の経年劣化による落下防止対策のため、設計を実施。

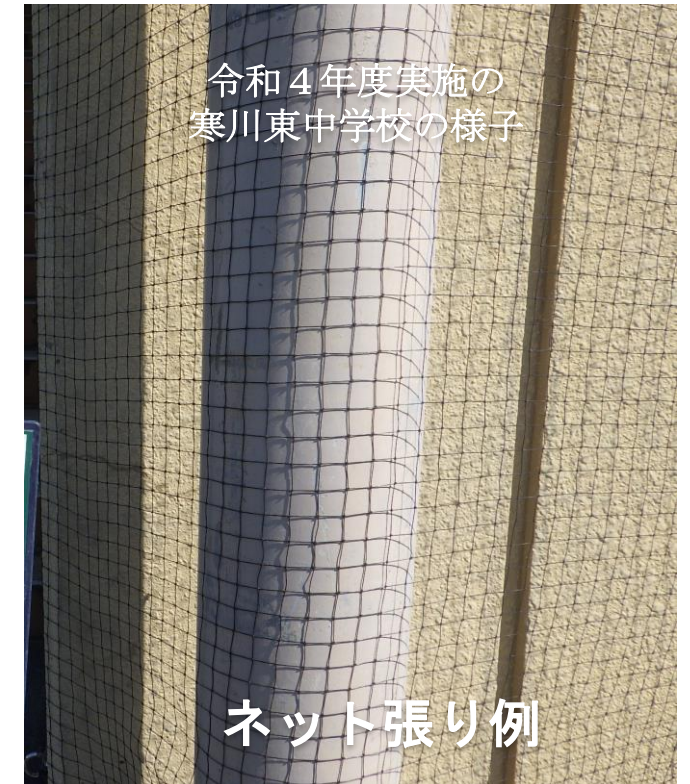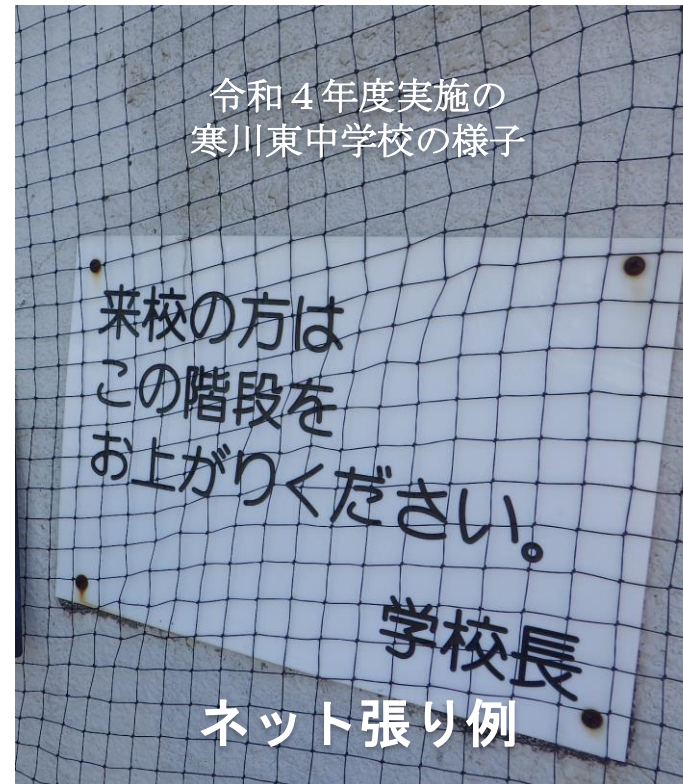

2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

寒川総合図書館 平成18年（2006年）6月建設（17年経過）

⑱ 1階空調機修繕：1,253千円

⑲ 4階空調機修繕：880千円

⑳ 自動ドア装置更新修繕：1,272千円




2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

②南部地域の新たな消防拠点整備

・令和2年度に土地取得が不調となった。

そのため、令和9年度以降に計画されている北部地域の消防拠点整備の土地取得も並行して進めることにしたところ、土地取得に向けた事務が捗っている。

＝再編計画上、南部地域の新たな消防拠点整備の費用を計上していたが、方針を変更し、南部地域ではなく北部地域の消防拠点整備を先行実施。

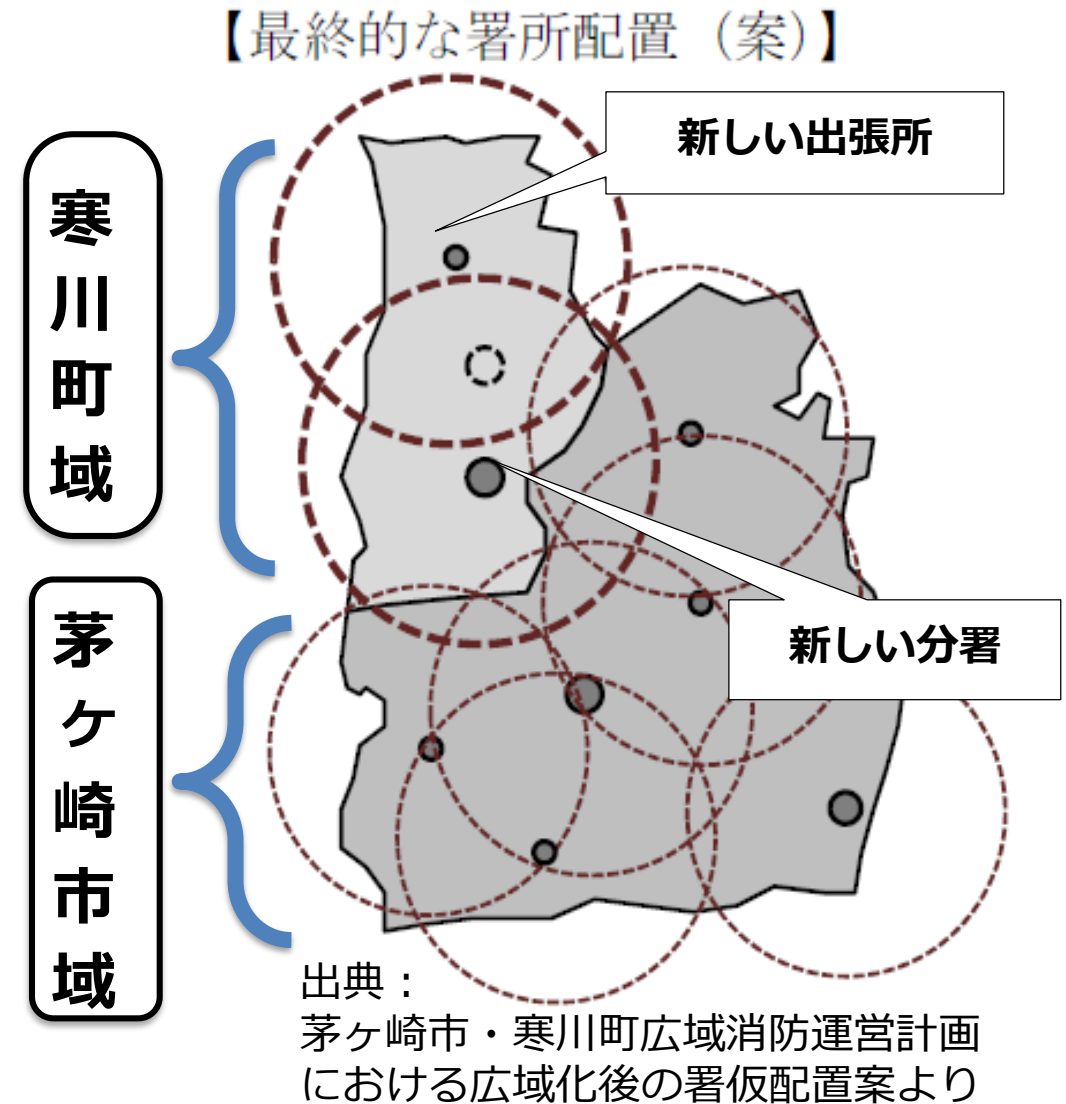

2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について


②北部地域の新たな消防拠点整備：2,212千円

- ・宮山出張所の先行整備に向けた建設用地の不動産鑑定及び測量を実施。

【参考：令和5年度取組内容】

- ・令和5年度予算に「土地購入費」、「物件補償金」を計上し、建設用地の取得を進めている。
- ・建設手法についても、「寒川町PPP/PFI手法導入検討規程」に基づき、進めている。

※令和5年6月に用地取得完了。物件についても解体済。

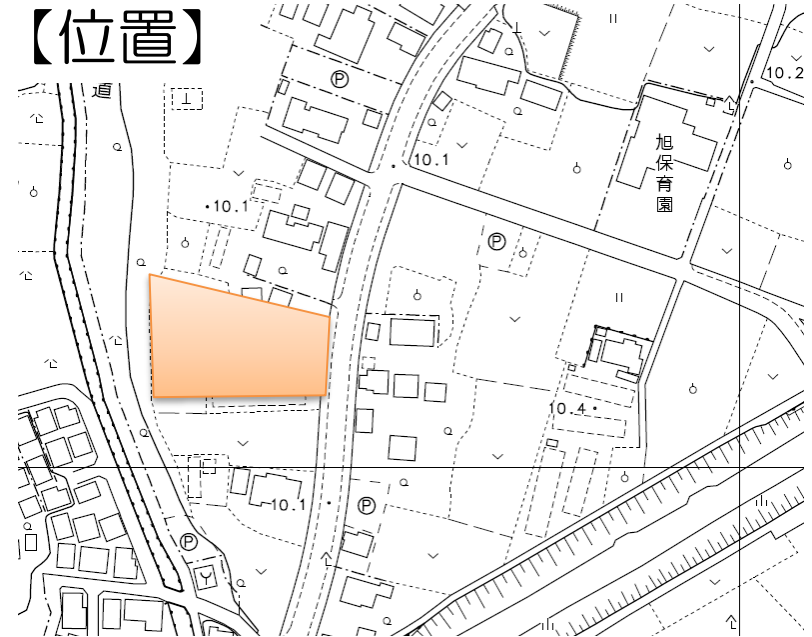

2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

②③美化センター機器類定期修繕 平成7年（1995年）12月建設（27年経過）

- ・し尿及び浄化槽汚泥の処理施設。
- ・機械設備類について、毎年度定期的に修繕を実施。

- 動力制御盤端子台修繕：55千円
（美化センターの機械設備等の動力を制御する電気設備）
- 加圧曝気槽水位発信機修繕：730千円
（生物処理によりし尿等进行处理する設備）
- 高圧ケーブル更新工事：3,872千円
- 消防設備修繕：60千円
- トラックスケール等整備工事：3,487千円
（し尿等の重量を計量する秤）



2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

②③美化センター機器類定期修繕

- DCSシステム等点検整備工事 3,638千円
(し尿処理施設運転制御システム)
- スクリューポンプ等整備工事 19,250千円
(センター内複数箇所)
- 空気溶解機整備工事 9,350千円
(し尿処理工程において、汚泥を浮上させるために必要な空気と生物処理後の処理水を混合する機械)



DCSシステム



スクリーポンプ



空気溶解機

2. 公共施設再編計画 令和4年度実施事項について

②④町営プール完成後の整備費償還 整備費用 488,847千円

令和3年度より20年間で償還（利息を含む）

■ 約26,000千円を毎年度償還。



3 .令和 4 年度に進めたものについて

3.令和4年度に進めたものについて

①にぎわい交流創出ゾーンのビジョンづくり

- 保健福祉の集約施設を「白紙」としたことへの対応策として、マーケティングの視点を取り入れ、施設整備のよりどころとなるビジョンづくりを開始。



- 「**多様な人がゆるやかにつながる きっかけと過ごしたくなる場**」を目指すべき姿とし、まちなかアンケート、関係団体とのヒアリングを実施。



- ビジョン（案）を作成しパブリックコメントを実施。（R.5.3.28～R5.4.27）



- 令和5年6月会議全員協議会において、ビジョンのパブリックコメント実施結果を報告し、ビジョンを確定。



多様な人がゆるやかにつながる きっかけと過ごしたくなる場

多様な人が

このゾーンには、特定の人だけでなく、
誰もが集まり利用できる場とします。

ゆるやかにつながる

ゆるやかで多様なつながりは、
こころ豊かな暮らしをもたらします。

きっかけと

一人ひとりの想いや可能性に寄り
添った機会を作り出します。

過ごしたくなる場

「自分の居場所」「みんなの居場所」と
思える安心できるエリアを目指します。

エリアの図（イメージ）



3.令和4年度に進めたものについて

②公共施設の整備手法選択のための指針づくり

- 公共施設の老朽化が進んでいる中、厳しい財政状況、少子高齢化・人口減少社会といった要因から全公共施設の建替え、改修、修繕を実施することが難しい課題がある。



- PPP/PFI等の公民連携による施設整備を検討し、管理運営方法についても見直しを図り、サービス維持・向上及び財政負担を軽減する。
- 国では、これまで人口10万人以上の地方公共団体に対し、優先的検討規程の策定を令和5年度末までに行う要請。令和3年6月には、10万人未満の地方公共団体にも、同様の取組を推進の依頼があった。



- PPP/PFI手法導入を積極的に推進・検討するための体制を整えるため、「寒川町PPP/PFI手法導入優先的検討規程」及び実務マニュアルを作成し、令和5年1月1日施行。

3.令和4年度に進めたものについて

③【地域集会所】今後の施設のあり方の検討

再編計画上の検討事項

「完全地域移管」、「一部地域移管（＝無償貸与）」、「学校への複合化」の中から選択する。

実施事項

- ・ 他自治体における認可地縁団体等の取組状況の調査、研究を実施。
- ・ 各地域集会所に対し、利用者アンケートを実施。
- ・ 地域集会所運営委員会連絡協議会にて、寒川町公共施設再編計画における地域集会所の考え方について説明。

今後の取り組み事項

- ・ 認可地縁団体設立に向けた条例等制定に向けた調査・研究
- ・ 地区集会所の施設老朽化に備えた、解体費用を目的とした補助金要綱制定に向けた調査・研究
- ・ 先進自治体の地域集会所の集約化や今後の施設のあり方を調査・研究

3.令和4年度に進めたものについて

④【福祉活動センター】今後の施設のあり方の検討

再編計画上の検討事項

民間への譲渡も視野に入れ、施設のあり方の検討を行う。

実施事項

- センター機能について考え方を整理し、民間譲渡に向けた課題の検討を実施。

今後の取り組み事項

- 次期指定管理期間の中であり方（民間譲渡）を含めて先進事例などを調査・研究
- 施設機能の現状維持を最優先に考えた修繕箇所の整理

3.令和4年度に進めたものについて

⑤【寒川総合図書館】今後の施設のあり方の検討

再編計画上の検討事項

将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設とするかの検討を行う

実施事項

- 社会教育委員会議において「寒川町公共施設再編計画における今後の文化スポーツ施設のあり方について」を協議。

今後の取り組み事項

- 集客機能を兼ね備えた施設とするかの利用者アンケートの実施
- 大規模改修に向けた、修繕箇所・修繕額の調査を実施
- 大規模改修を含めた指定管理者更新の可能性について、サウンディング型市場調査実施の検討

3.令和4年度に進めたものについて

⑥【公民館】今後の施設のあり方の検討

再編計画上の検討事項

町内南北に整備予定の新たな消防拠点の近隣への移転も視野に入れ、機能移転を検討

実施事項

- 社会教育委員会において「寒川町公共施設再編計画における今後の文化スポーツ施設のあり方について」を協議。

今後の取り組み事項

- 新たな消防拠点の設置時期に合わせ、公民館としての機能のあり方を検討
→消防拠点周辺への移転及び学校との複合化も視野に入れて検討する

3.令和4年度に進めたものについて

⑦寒川町立小・中学校の適正化

- ・寒川町立小・中学校適正化等検討委員会の開催

【令和4年度開催回数（令和5年3月31日時点）】 委員会： 11回 / 作業部会 8回

【委員構成（18名）】

- ・学識経験者
- ・学校に在籍する児童又は生徒の保護者代表
- ・自治会長連絡協議会代表
- ・寒川町立小学校長会代表 ・寒川町立中学校長会代表
- ・小、中学校教職員代表 ・公募の町民
- ・企画部長 ・総務部長 ・町民部長 ・学び育成部長

3.令和4年度に進めたものについて

【検討委員会での検討内容】

- (1) 寒川町立小・中学校適正化等基本方針（案）のパブリックコメントの実施
(R4.3.21～4.20)
- (2) 寒川町が目指す学校の新たな「かたち」づくり
- (3) 適正配置検討の基本的な考え方
- (4) 小・中学校の施設の現状把握
- (5) 学校再配置案の比較検討（詳細は40ページに記載）
- (6) （仮称）寒川町立小・中学校適正化等基本計画骨子（案）
- (7) 寒川町立小・中学校適正化等基本計画（素案）

3.令和4年度に進めたものについて

学校再配置案の比較検討

【基本要件】

- 公共施設再編計画により小・中学校を8校から6校への再編を基本とする。
- 財政面を考慮し、既存の学校用地の位置を基本とする。
- 児童生徒の居住分布に応じた学校配置を目指す。
- 児童生徒の負担面や安全面を考慮し、適切な通学距離が確保できる学校配置を目指す。
- 適正な学校規模を確保できる学校配置を目指す。



上記から 小学校4校とする配置案5案、中学校2校とする配置案3案を
掛け合わせた全15案の学校配置候補を選出

3.令和4年度に進めたものについて

将来の学校づくりに関する地域懇談会

(全4回開催：令和4年3月12日,9月25日,11月26日,12月4日)



- ◆めざす教育について
- ◆本検討の位置づけについて
- ◆スケジュールについて
- ◆学校の配置について
- ◆学区について
- ◆通学について
- ◆学校施設について
- ◆小中一貫教育について
- ◆コミュニティ・スクール（学校運営協議会）について
- ◆少人数教育について
- ◆人口推計について
- ◆財源・費用について
- ◆その他

3.令和4年度に進めたものについて

(5) 学校再配置案の比較検討

- 配置の【基本要件】と【3つの視点】により比較検討した結果、
全15案のうち、下記の4案が全ての要件を満たしていることとなった。

	A案	B案	C案	D案
小学校	寒川小学校	寒川小学校	寒川小学校	寒川小学校
	一之宮小学校	旭小学校	一之宮小学校	旭小学校
	旭小学校	小谷小学校	旭小学校	小谷小学校
	小谷小学校	南小学校	小谷小学校	南小学校
中学校	寒川中学校	寒川中学校	旭が丘中学校	旭が丘中学校
	旭が丘中学校	旭が丘中学校	寒川東中学校	寒川東中学校

引き続き、比較検討を進め、令和5年度中をめどに適正化に関する一定の考え方を
出す予定

今後も、施設所管課と再編計画を所管している財産管理課が
密に連携しPDCAサイクルを確実に実行し、時代に見合った公共施設の維持・管理・運営をして
まいりたいと考えております。

1. 地域活動施設

(単位：千円)

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項〔上段〕 実績事項〔下段〕		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度																															
宮山地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容	※地域集会所全12施設は、全て下記のとおり																																														
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
小動地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容																																															
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
倉見大村地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容																																															
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
岡田地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容																																															
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
中瀬地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容	※地域集会所全12施設は、全て下記のとおり																																														
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
田端地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容											今後10年程度を目途に各集会所の方向性を決定 手法は①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化																																				
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項	合意形成																					合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成																	
筒井地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容																																															
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
一之宮地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容																																															
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
倉見地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容																																															
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
大蔵地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容																																															
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
小谷地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容																																															
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
大曲地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画	対策内容																																															
計画額																																																			
実績			実績額																																																
			取組事項																																																
計画額（小計）					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
実績額（小計）					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															

赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目

2. 保健福祉施設

(単位：千円)

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項〔上段〕 実績事項〔下段〕		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度		
健康管理センター	集約化・除却	健康づくり課	計画	対策内容	役場南側用地に集約		解体工事															
				計画額		517	121,859															
			実績	実績額																		
				取組事項	機能整理	機能整理 ビジョン作成	工事															
わかばクラブ (学童保育)	現状維持	学び推進課	計画	対策内容	既存の施設は機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持（増設部分については、別に計上）																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
げんきっ子クラブ (学童保育)	現状維持	学び推進課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福祉活動センター	民間譲渡	福祉課	計画	対策内容	施設のあり方の検討（例：民間譲渡等）																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	合意形成	合意形成	合意形成															
ひまわり教室	現状維持	子育て支援課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふれあいセンター	現状維持	高齢介護課	計画	対策内容		設備機能修繕	屋根及び電気設備修繕	-	外壁修繕	設備機能修繕	当面は、現状維持											
				計画額		2,000	11,000	-	64,045	1,265												
			実績	実績額		1,804																
				取組事項	-	修繕	工事	-	工事	工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子育てサポートセンター (賃借物件)	集約化	子育て支援課	計画	対策内容	役場南側用地に集約		集約施設移転・賃貸物件を返却															
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	機能整理	機能整理 ビジョン作成	-	移転・返却														
星の子クラブ・おひさまクラブ (学童保育)	現状維持	学び推進課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計画額（小計）					0	2,517	132,859	0	64,045	1,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
実績額（小計）					0	1,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3. 学校教育施設（小学校）

(単位：千円)

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項(上段) 実績事項(下段)		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
寒川小学校 (あおぞらクラブ＝学童・町民センター分室含む)	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容					体育館屋根修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施									
				計画額					13,000											
			実績	実績額																
				取組事項	-	-	-	-	工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一之宮小学校 (わんぱくクラブ＝学童・文化財学習センター含む)	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容		南棟外壁修繕			北棟防水修繕 体育館屋根修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施									
				計画額		35,000			37,000											
			実績	実績額		26,681														
				取組事項	-	工事	-	-	工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭小学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容			南棟外壁修繕		体育館屋根修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施									
				計画額			22,000		19,000											
			実績	実績額																
				取組事項	-	外壁修繕設計	工事	-	工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 学校教育施設（小・中学校）

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項〔上段〕 実績事項〔下段〕		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度		
小谷小学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容			教室棟外壁修繕				学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施											
				計画額		13,000																
			実績	実績額		(旭小に含む)																
				取組事項	－	外壁修繕設計	工事	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
南小学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容					体育館屋根修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施											
				計画額				19,000														
			実績	実績額																		
				取組事項	－	－	－	－	工事	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
各小学校プールろ過機		教育施設給食課	計画	対策内容					補修工事		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施											
				計画額				4,042														
			実績	実績額																		
				取組事項	－	－	－	－	工事	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
寒川中学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容						体育館屋根修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施										
				計画額						22,000												
			実績	実績額																		
				取組事項	－	－	－	－	工事	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
旭が丘中学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容			南棟外壁修繕		給排水管更新	技術棟屋根修繕 体育館屋根修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施										
				計画額			35,000		5,000	26,000												
			実績	実績額		2,178																
				取組事項	－	外壁修繕設計	工事	－	工事	工事	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
寒川東中学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容		北棟外壁修繕		南棟外壁修繕		体育館屋根修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施										
				計画額		35,000		35,000		28,000												
			実績	実績額		21,237																
				取組事項	－	工事	－	工事	－	工事	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計画額（小計）					0	70,000	70,000	35,000	97,042	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
実績額（小計）					0	54,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4. 文化スポーツ施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 （関係部署）		対策実施年度/ 対策費用	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
町民センター	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容	庁舎との複合化の検討（ホール必要性の検証）															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	検討	検討	検討	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
北部文化福祉会館 （北部公民館）	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容	機能移転に向けた検討															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	検討	検討	検討	検討	検討	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
南部文化福祉会館 （南部公民館）	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容	機能移転に向けた検討															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	検討	検討	検討	検討	検討	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
寒川総合図書館 （文書館含む）	現状維持	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容	将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う＝アンケート調査等															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
			計画	対策内容		空調機修繕 自動ドア修繕				屋根修繕										
				計画額		2,899				11,000										
			実績	実績額		3,405														
				取組事項	－	修繕	－	－	－	工事	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
寒川総合体育館	現状維持	スポーツ課	計画	対策内容		建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 体育器具修繕 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修繕				
				計画額		169,545				14,000	241,947				196,216					
			実績	実績額		33,210														
				取組事項	－	設計・修繕等	－	－	－	工事	工事	－	－	－	－	工事	－	－	－	－

4. 文化スポーツ施設

(単位：千円)

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項〔上段〕 実績事項〔下段〕		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度				
町営さむかわテニスコート (旧：さむかわ庭球場) (借用物件)	新築・維持	スポーツ課	計画	対策内容		改修	整備費 分割納付																	
				計画額			23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466							
			実績	実績額																				
				取組事項	－	工事	供用開始	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
田端スポーツ公園	現状維持	スポーツ課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																			
				計画額																				
			実績	実績額																				
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
計画額（小計）					0	172,444	23,466	23,466	23,466	48,466	265,413	23,466	23,466	23,466	23,466	219,682	0	0	0	0				
実績額（小計）					0	36,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

5. 行政・環境・消防施設

(単位：千円)

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)		対策実施年度/ 対策費用	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
寒川町役場	集約化 複合化	財産管理課	計画	対策内容	自家発電設備 更新	庁舎建替えの検討														
				計画額	35,950															
			実績	実績額	35,878															
				取組事項	工事	検討 ビジョン作成	検討													
寒川町美化センター	現状維持	環境課	計画	対策内容	機器類定期修繕				機器類特別修繕	機器類定期修繕					更新または長寿命化の検討					
				計画額	68,598	49,306	46,720	38,913	53,000	21,000	24,000	21,000	23,000	26,000						
			実績	実績額	57,716	40,442														
				取組事項	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	－	－	－	－	－	－
寒川広域リサイクルセンター	現状維持	環境課	計画	対策内容	修繕を含めた「長期包括運営責任業務委託」による施設運営（＝当面は現状維持）										長期包括責任業務委託による運営（第2期）					
				計画額											設備機能診断・次期長期包括運営の検討					
			実績	実績額																
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	検討	検討	検討	－	－	－	－	－
消防本部・消防署	新築	町民安全課	計画	対策内容	消防広域化（＝2拠点体制）後の跡地利活用の検討															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討					
田端分団車庫待機室 (第1)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一之宮消防車庫待機室 (第2)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大曲分団車庫待機室 (第3)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岡田消防車庫 (第4)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小谷消防車庫 (第5)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

5. 行政・環境・消防施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項〔上段〕 実績事項〔下段〕		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度		
小動消防車庫 (第6)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮山分団車庫待機室 (第7)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倉見消防車庫 (第8)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大蔵消防車庫待機室 (第9)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中瀬分団車庫待機室 (第10)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計画額(小計)					104,548	49,306	46,720	38,913	53,000	21,000	24,000	21,000	23,000	26,000	0	0	0	0	0	0		
実績額(小計)					93,594	40,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. リニューアル施設及び新規整備施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 （関係部署）	計画事項〔上段〕 実績事項〔下段〕		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
旭小学校区の新たな学童保育施設 （2019年設計・2020年建設）	新築・維持	学び推進課	計画	対策内容	供用開始															
				計画額																
			実績	実績額																
				取組事項	供用開始	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康福祉の集約施設 （借上料1,155百万円）	集約化 複合化	健康づくり課	計画	対策内容	供用開始借上料支払															
				計画額			77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
			実績	実績額																
				取組事項			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
町営プール （整備費用+事務費+利息 = 538百万円）	改築・維持	スポーツ課	計画	対策内容	整備費 分割納付															
				計画額	485	28,248	28,251	28,253	28,256	28,258	28,261	28,263	28,266	28,269	28,271	28,274	28,276	28,279	28,281	28,284
			実績	実績額	329	25,681														
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寒川学校給食センター （整備費用+事務費+利息 = 2,750百万円）	新築・維持	教育施設給食課	計画	対策内容	建物建設		供用開始 整備費分割納付													
				計画額			604,978	136,571	136,579	136,587	136,595	136,604	136,612	136,620	136,628	136,636	91,457	91,465	91,473	91,481
			実績	実績額																
				取組事項	工事	工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消防広域化に伴う分署の整備 （南部地域の新たな消防拠点）	新築	町民安全課	計画	対策内容	用地選定 鑑定評価・ 取得	建物設計	建物建設		供用開始											
				計画額	134,158	40,000	200,000	200,000												
			実績	実績額	0	0														
				取組事項	構想・計画	構想・計画	工事	工事	供用開始	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消防広域化に伴う出張所の整備 （北部地域の新たな消防拠点）	新築	町民安全課	計画	対策内容		用地選定 鑑定評価		用地選定E取得				建物設計	建物建設		供用開始					
				計画額							46,400	45,452		227,480						
			実績	実績額		2,212														
				取組事項	-	用地選定 鑑定評価	-	構想・計画	構想・計画	構想・計画	用地買収	設計	工事	工事	供用開始	-	-	-	-	-

6. リニューアル施設及び新規整備施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項〔上段〕 実績事項〔下段〕		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度		
学校再編に関する検討	集約化 複合化	教育政策課	計画	対策内容	検討期間		周知・準備期間															
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	構想・計画	構想・計画	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成
南部公民館の機能移転 (新たな消防拠点の近隣敷地)	集約化・検討	教育政策課	計画	対策内容	機能移転に向けた検討																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	検討	検討	検討	検討	検討	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
北部公民館の機能移転 (新たな消防拠点の近隣敷地)	集約化・検討	教育政策課	計画	対策内容	機能移転に向けた検討																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	検討	検討	検討	検討	検討	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(仮称) 健康福祉総合センター 建設予定地の活用	集約化・検討	健康づくり課	計画	対策内容	役場南側用地に集約施設を整備																	
				計画額																		
			実績	実績額																		
				取組事項	構想・計画	機能整理 ビジョン作成	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計画額（小計）					134,643	68,248	910,229	441,824	241,835	241,845	288,256	287,319	241,878	469,369	241,899	241,910	196,733	196,744	196,754	196,765		
実績額（小計）					329	27,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画額（合計）					239,191	362,515	1,183,274	539,203	479,388	388,576	577,669	331,785	288,344	518,835	265,365	461,592	196,733	196,744	196,754	196,765		
実績額（合計）					93,923	161,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 4 年度

施設名	担 当 課
健康管理センター	財産管理課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
健康管理センターアスベスト含有分析調査	517

公共施設再編計画における今後の対策
（仮称）健康福祉総合センター建設予定地の一部に、健康管理センター、子育てサポートセンターの集約施設を整備。県福祉事務所、社会福祉協議会、ボランティアセンター機能も集約。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
役場南側の土地に整備 予定の施設へ集約	解体工事														
															
517	122,000														

検討体制	
------	--

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
保健福祉の集約施設が白紙となり、解体工事は未定。健康管理センターの老朽化対策を含めた、さむかわ中央公園周辺のにぎわい交流創出ゾーンのビジョン確定後、次のアクションを検討していく。					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施 結果	未実施	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	健康福祉の集約施設が白紙となったため、未実施。
----------	-----	------------------------	-------------------------

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
地域集会所 全12か所	町民協働課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
地域集会所の方向性の検討	－

公共施設再編計画における今後の対策
今後、10年後を目途に各地域集会所の方向性の検討を行うこととし、「完全地域移管」、「一部地域移管（無償貸与）」、「学校への複合化」の中からの選択を中心に検討を行います。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
今後、10年程度を目途に各集会所の方向性を決定 手法は次の3通り ①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化																
																

検討体制	地域集会所運営委員会連絡協議会
------	-----------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化基本方針
------	------------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
他自治体に集会所運用状況等取り組みを調査・研究					0
各地域集会所に対し、利用者アンケートを実施					0
各地域集会所指定管理者に対し、寒川町公共施設再編計画における地域集会所の考え方について説明					0

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和4年4月～	地域集会所維持管理の、今後の動向に関する研究及び他自治体における認可地縁団体等の取り組み状況の調査・研究	0 0
令和4年10月	各地域集会所に対して、利用者アンケートを10月1日から同月31日までの1か月間実施	0 0
令和4年11月	地域集会所運営委員会連絡協議会にて、寒川町公共施設再編計画における地域集会所の考え方についての説明	0 0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	---------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
茅ヶ崎市消防署寒川分署	町民安全課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
南部地域の新たな消防拠点整備（建物設計）	－

公共施設再編計画における今後の対策
新たな消防拠点については、南部地域（分署）については2025年（令和7年）供用開始、北部地域（出張所）については2031年（令和13年）供用開始を目途に整備を目指す。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
用地 取得	建物 設計	建物 建設	建物 建設	供用 開始											
															
135,000	40,000	200,000	200,000												

検討体制	
------	--

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
①南部地域と並行して北部地域の用地候補地の検討を実施する。					0
②北部地域の候補地を絞り込み交涉及び必要な調査を開始する。					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和４年４月～11月	北部地域の用地候補地を選出し、比較検討により優先順位を定める。 比較検討により定めた優先順位を基に、用地交渉を実施する。	0
令和4年11～12月	用地交渉により候補地の絞り込みを行い、第一候補の用地を選出する。 （不動産鑑定手数料）	0 676
令和4年12月～翌3月	第一候補の用地の交渉を行いながら、購入に必要な手続きを行う。 （用地測量分筆等業務委託料）	0 1,536

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
令和３年度に南部地域の用地を購入し、令和４年度に建物の設計を行う予定であったが、南部地域の用地取得ができていないため。

実施 結果	未実施	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	北部地域の調整が進行したため、先行して北部地域の用地交渉を進めているため。
----------	-----	------------------------	---------------------------------------

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
子育てサポートセンター（賃借物件）	子育て支援課

（単位：千円）

再編計画工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
役場南側の土地に整備予定の施設へ集約	－

公共施設再編計画における今後の対策
（仮称）健康福祉総合センター建設予定地の一部に、健康管理センター、子育てサポートセンターの集約施設を整備。県福祉事務所、社会福祉協議会、ボランティアセンター機能も集約。

（単位：千円）

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
役場南側の土地に整備 予定の施設へ集約	集約施設へ移転後 賃貸物件を返却														
															

検討体制	
------	--

関連計画	
------	--

（単位：千円）

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
子育てサポートセンターを設置している賃借物件の賃貸人との調整	未実施	未実施	未実施	未実施	0
子育てサポートセンターの移転準備	未実施	未実施	未実施	未実施	0

（単位：千円）

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年6月～	学校適正化に向けた動きや、アフターコロナ・ウィズコロナを反映した公共施設のあり方の視点、消防広域化による分署出張所整備後の現行消防庁舎の活用方法の検討等の状況変化を受け、令和４年３月に集約施設の整備を白紙とした。一方で、令和3年3月策定の「寒川町総合計画2040」でさむかわ中央公園周辺を「にぎわい交流創出ゾーン」として位置付けたことを踏まえ、「にぎわい交流創出ゾーン」のビジョンを整理し、公民連携による公共施設のあり方を検討している。	0
		0
令和4年11月～令和5年1月	町民・町内関係団体への「にぎわい交流創出ゾーン」に関するアンケートやヒアリングを実施し、エリアビジョン案を作成	0 0
令和5年3月～	「にぎわい交流創出ゾーン」エリアビジョン案についてパブリックコメントを実施	0
		0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施 結果	一部未実施	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	集約施設の整備が白紙になったことに伴い、令和4年度の当初計画は実施することができなかったが、「にぎわい交流創出ゾーン」のビジョンを整理し、公民連携による公共施設のあり方を検討した。（令和5年度計画から取組事項を変更）
----------	-------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

再編計画工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
外壁面補修・アルミ製建具（引違い・すべり出し）等修繕	9,200

公共施設再編計画における今後の対策
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修 繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				140,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
財産管理課技士・担当者・指定管理者を交え修繕箇所の精査・検討					0
検討内容に基づき設計					0

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年4月～令和5年3月	財産管理課技師・担当者を交え修繕箇所の精査・検討・設計	9,200 0
令和5年1月～令和5年3月	財産管理課技師・担当者と発注に伴い必要となる工事予定日の調整を行うほか、指定管理者との工事予定日程の調整	—

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
令和4年度に実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断したことにより、工事期間を令和4年度実施ではなく令和5年度実施に変更したこと及び財産管理課技師により設計を行ったため計画額よりも減少した。

実施結果	未実施	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	令和4年度に実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断したことにより、令和4年度に設計を実施し、令和5年度に工事を実施としたため。
------	-----	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
アルミ製建具（固定式）更新	12,573

公共施設再編計画における今後の対策
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修 繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				140,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
財産管理課技士・担当者を交え修繕箇所の精査・検討					0
令和5年度工事実施に向けた設計を行う。					0

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年4月～令和5年3月	財産管理課技士・担当者を交え修繕箇所の精査・検討・設計	12,573 0
令和5年1月～令和5年3月	財産管理課技師・担当者が発注に伴い必要となる工事予定日の調整を行うほか、指定管理者との工事予定日程の調整を行った。	—

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
令和4年度に実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断したことにより、工事期間を令和4年度実施ではなく令和5年度実施に変更したこと及び財産管理課技師により設計を行ったため計画額よりも減少した。

実施 結果	未実施	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	令和4年度に実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断したことにより、令和4年度に設計を実施し、令和5年度に工事を実施としたため。
----------	-----	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
吸収式冷温発生機修繕	17,600

公共施設再編計画における今後の対策
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修 繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				140,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
総合体育館武道場・サブアリーナ空調設置工事設計委託及び吸収式冷温発生機修繕工事設計委託発注（武道場空調機新設工事設計委託分も含む）					武道場空調機新設工事に計上
総合体育館武道場・サブアリーナ空調設置工事設計委託及び吸収式冷温発生機修繕工事予定					武道場空調機新設工事に計上

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年～令和5年3月	総合体育館武道場・サブアリーナ空調設置工事設計委託及び吸収式冷温発生機修繕工事設計委託を発注・内容の確認を実施。	－
令和4年7月～12月	総合体育館武道場・サブアリーナ空調設置工事及び吸収式冷温発生機修繕工事の予定箇所のアスベスト調査委託を実施。	0 490
令和5年1月～令和5年3月	財産管理課技師・担当者と発注に伴い必要となる工事予定日の調整を行うほか、指定管理者との工事予定日程の調整を行った。	－

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
令和4年度に実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断したことにより、工事期間を令和4年度実施ではなく令和5年度実施に変更したことにより委託業者による設計のみを実施したため、計画額よりも減少した。

実施結果	一部実施	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	令和4年度に実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断したことにより、令和4年度に設計を実施し、令和5年度に工事を実施としたため。
------	------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
多目的室AV設備更新	10,000

公共施設再編計画における今後の対策
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修 繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				140,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
総合体育館プロジェクター及び音響設備購入契約諸手続き					2,002

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年10月	購入に向け入札を執行	10,000 1,573
令和4年11月	落札業者の株式会社東和エンジニアリングと物品供給契約書を締結	—
令和5年 2月	物品の納入完了	—

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
当初計画では多目的室の付随設備として現行と同等設備の据付工事を予定していたが、移動式のプロジェクター及び音響設備を導入したほうが、安価かつ他の施設での利用が可能となり利用者の利便性の向上が図れると考え、移動式の音響設備及びプロジェクターの購入に変更したことにより減となった

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
中央監視盤等更新	58,564

公共施設再編計画における今後の対策
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修 繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				140,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
令和4年2月よりリース契約開始					7,579

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年2月よりリース契約開始	令和9年1月までの賃貸借契約締結済み 決算額【R4.4～R5.3】	58,564 7,579

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
本来令和４年度に中央監視盤の更新工事を実施する予定であったが、令和3年度中に当該機器の故障が発生し、復旧をしたが早急に更新をする必要があり、内容検討を行ったところ更新工事ではなく、リース契約に変更したことによる減

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
高圧ケーブル更新工事	－

公共施設再編計画における今後の対策
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修 繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				140,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容		第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
高圧ケーブル更新工事前の事前調査及び東京電力の通信ケーブル撤去についての調整し、工事実施					

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年4月～9月	財産管理課技師・担当者を交え、現地調査を行い工事に必要な条件等の確認。 工事予定箇所にある電気使用量を計測・送信する通信ケーブル関係の撤去関係について、設置者の東京電力と調整。	
令和4年10月	財産管理課技師・担当者を交え、落札業者の株式会社オーカワと工事内容を現地確認含めて打ち合わせを実施。	0 3,520
令和4年12月～令和5年2月	高圧ケーブル更新工事を実施。完了検査を行う。	

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
当初は中央監視盤の更新と合わせて高圧ケーブルの更新を行う予定していたが、中央監視盤が令和3年度中に故障し、リース契約となったため単独の工事に内容が変更となったことにより、9月補正で予算計上し工事を実施した。

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
体育器具設備修繕	6,608

公共施設再編計画における今後の対策
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修 繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				140,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
移動式バスケットゴール購入					8,811
柔道用畳購入					3,506

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年10月	移動式バスケットゴール1対購入	6,608 7,810
令和4年9月	柔道用畳購入	0 2,750

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
当初の計画では移動式バスケットゴールの修繕のみを実施予定であったが、バスケットゴール修繕では利用者の安全性がどの程度確保できるか明言できないため、今後プロバスケットチームのホームタウンになることを考慮し、スポーツ振興くじ助成を活用した更新としたため。 また、柔道用の畳が長期間の使用により固くなっており、けがをする可能性が高いことから、畳の交換をする必要が発生したことによる増。

実施結果	実施（終了）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	--------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
武道場空調機新設工事	45,000

公共施設再編計画における今後の対策
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修 繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				140,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
総合体育館武道場・サブアリーナ空調設置工事設計委託及び吸収式冷温発生機修繕工事設計委託発注 （吸収式冷温発生機修繕設計委託分も含む）					8,278

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年～令和5年3月	総合体育館武道場・サブアリーナ空調設置工事設計委託及び吸収式冷温発生機修繕工事設計委託を発注	45,000 8,278
令和5年1月～令和5年3月	財産管理課技師・担当者と発注に伴い必要となる工事予定日の調整を行うほか、指定管理者との工事予定日程の調整を行った。	—

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
令和4年度に対象施設にサブアリーナ施設を加えて実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断したことにより、工事期間を令和4年度実施ではなく令和5年度実施に変更したことにより委託業者による設計のみを実施したため、計画額よりも減少した。

実施 結果	一部実施	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	令和4年度に実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断したことにより、令和4年度に設計を実施し、令和5年度に工事を実施としたため。
----------	------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
サウナ浴槽設備修繕工事	10,000

公共施設再編計画における今後の対策
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修 繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				140,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
サウナ浴槽の経年不良箇所を修繕する。					1,210

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年4月～8月	サウナ浴槽の経年不良箇所であったミキシングバルブ修繕を実施した。	10,000 1,210

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
当初計画時は不良個所以外の更新を考慮した工事を予定していたが、急ぎ修繕が必要な箇所のみに限定することで工事ではなく修繕での対応が可能となったことによる減

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
福祉活動センター	福祉課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
施設のあり方の検討	－

公共施設再編計画における今後の対策
センターでの活動事業については、民間事業者の進出が進んでいることから、民間への譲渡も視野に入れ、施設のあり方の検討を行う。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
施設のあり方の検討 （例：民間譲渡等）																
																

検討体制	
------	--

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
①福祉の拠点機能について考え方を整理し、民間への譲渡が可能かどうかを検討する。					0
②令和6年度からの指定管理者選定要件を検討する。					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年7月～8月	指定管理者による日本財団の助成金を活用した建て替えについて、申請に向けた最善策を検討した。	0
令和4年8月～令和5年3月	センター機能について考え方を整理し、民間譲渡に向けた課題を検討した。	0
令和5年1月～3月	令和5年度に実施予定の指定管理者選定に向け、期間等の要件を検討した。	0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施 結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	---------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
ふれあいセンター	高齢介護課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
設備機能修繕	2,000

公共施設再編計画における今後の対策
建物設備や外壁の修繕を行う。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	設備機能 修繕	屋根・電 気 設備修繕		外壁修繕	設備機能 修繕	当面は現状維持									
	◆	◆		◆	◆										
	2,000	11,000		65,000	2,000										

検討体制	高齢介護課及びシルバー人材センター
------	-------------------

関連計画	-
------	---

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
高圧設備修繕及び高圧設備交換修繕					1,804

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年6月～令和５年1月	現場確認、関東電気保安協会、東京電力及び施工業者と調整し10/15に設備修繕を実施し、交換修繕は1/15に完了した。	2,000 1,804

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
内容を精査し、必要部分を修繕

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
健康管理センター	健康づくり課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
役場南側の土地に整備予定の施設へ集約	－

公共施設再編計画における今後の対策
（仮称）健康福祉総合センター建設予定地の一部に、健康管理センター、子育てサポートセンターの集約施設を整備。県福祉事務所、社会福祉協議会、ボランティアセンター機能も集約。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
役場南側の土地に整備 予定の施設へ集約	解体工事														
															
	122,000														

検討体制	健康福祉部および学び育成部
------	---------------

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
令和3年度に保健福祉の集約施設建設計画が白紙化されたため、必要機能について再検討を行う。					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年4月～令和5年3月	健康福祉部および学び育成部の2部により今後の健康管理センター必要機能の整理。	0 0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施 結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	---------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
寒川町美化センター	環境課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
機器類定期修繕	49,306

公共施設再編計画における今後の対策
2030（令和12年度）までの修繕計画に基づく建物内機器類の修繕を実施し、2031年度（令和13年度）から、更新または長寿命化を検討。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
機器類定期修繕				機器類 特別修繕	機器類定期修繕					更新または長寿命化の検討					
															
69,000	50,000	47,000	39,000	53,000	21,000	24,000	21,000	23,000	26,000						

検討体制	寒川町と茅ヶ崎市とのし尿処理に関する事務の事務委託に関する連絡会議
------	-----------------------------------

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
施設維持管理のため計画的な整備工事等を実施する					46,142

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和4年4月～令和5年3月	財産管理課職員の支援を受け、施設維持管理のための整備工事等を計画的に実施	49,306 40,442

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
各種ポンプ設備等の一体的整備実施に伴う減及び社会情勢急変に伴う予定工事見直しによる減

実施結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
------	---------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
小・中学校	教育政策課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
学校教育施設の再編	—

公共施設再編計画における今後の対策
具体的な学校再編の手法については、2021年度以降に検討組織を設置し、ソフト面（教育面）、ハード面（物理面）、財政面等を踏まえ、おおよそ2年程度の間に結論を出す。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
再編手法の検討	再編手法の検討	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間	周知・準備期間
															

検討体制	寒川町立小・中学校適正化等検討委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画、学びプラン
------	---------------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
寒川町小・中学校適正化等に関する基本方針策定					0
（仮称）寒川町立小・中学校適正化等基本計画に向けた検討					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和4年4月～6月	基本方針策定に向けたパブリックコメントを実施し、令和4年6月に基本方針を策定した。	0 0
令和4年9月	学校適正化検討の経過及び基本方針について説明しと、町民との意見交換の場として地域懇談会（全2回）を実施した。	0 0
令和4年7月～令和5年3月	基本方針に基づき、寒川町立小・中学校の適正配置の考え方をさらに整理した（仮称）寒川町立小・中学校適正化等基本計画の策定に向けた検討を行った。	0 0
令和4年11月～12月	（仮称）寒川町立小・中学校適正化等基本計画をより実行性のある計画とするため、学校適正化等検討を行う一環として、地域住民との情報共有や意見交換の場として地域懇談会（全4回）を実施した。	0 0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	---------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
寒川総合図書館	教育政策課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討	－

公共施設再編計画における今後の対策
当面は改修の予定が無いものの、将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行うものとし、アンケート調査等を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う＝アンケート調査等																
																

検討体制	なし
------	----

関連計画	なし
------	----

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
なし					

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年2月21日	社会教育委員会議で「寒川町公共施設再編計画における文化スポーツ施設の進行管理について」を協議。図書館の「集客機能を兼ね備えた施設」とは単にカフェテリア等などで集客するのではなく、図書館に関する展示やイベントを行うことでも集客できるのではないかとの意見があった。	0 0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	---------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
北部・南部文化福祉会館	教育政策課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
機能移転に向けた検討	—

公共施設再編計画における今後の対策
町内南北に整備予定の新たな消防拠点の近隣への移転も視野に入れ、検討組織を立ち上げて検討することとし、当面は現状を維持する。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
機能移転も視野に入れた検討組織の設置・協議検討															
															

検討体制	なし
------	----

関連計画	なし
------	----

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
なし					

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年2月21日	社会教育委員会議で「寒川町公共施設再編計画における文化スポーツ施設の進行管理について」を協議。南北公民館は立地場所とアクセス方法（巡回バス・駐車場）、現在のような福祉分野との複合施設は部屋の構成が実際のニーズとアンマッチであること、利用率が低い調理実習室は地域活動や災害時に必要との意見があった。	0 0
		0 0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	---------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
旭が丘中学校	教育施設給食課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
外壁修繕工事に向けた詳細設計委託	0

公共施設再編計画における今後の対策
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
						学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施（4年後の見直し段階において、次期対策を反映）										
																

検討体制	寒川町立小・中学校適正化等検討委員会
------	--------------------

関連計画	公共施設等総合管理計画、寒川町立小・中学校適正化等基本方針
------	-------------------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
旭が丘中学校外壁修繕工事設計委託（その2）					2,178

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和4年11月1日 ～令和5年3月31日	外壁修繕工事設計業務	0 2,178

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
令和5年度工事を実施するための設計委託を補正予算で計上したため。

実施結果	実施（終了）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	--------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 4 年度

施設名	担 当 課
旭小学校、小谷小学校	教育施設給食課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
外壁修繕工事に向けた詳細設計委託	0

公共施設再編計画における今後の対策
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
						学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施（4年後の見直し段階において、次期対策を反映）										
																

検討体制	寒川町立小・中学校適正化等検討委員会
------	--------------------

関連計画	公共施設等総合管理計画、寒川町立小・中学校適正化等基本方針
------	-------------------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
旭小学校・小谷小学校外壁修繕工事設計委託（その 2）					4,180

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年11月1日 ～令和5年3月31日	外壁修繕工事設計業務	0 4,180

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
令和 5 年度工事を実施するための設計委託を補正予算で計上したため。

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
一之宮小学校	教育施設給食課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
外壁修繕工事	35,000

公共施設再編計画における今後の対策
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	外壁 (南棟) 修繕			防水(北棟) 屋根(体育 館)修繕		学校教育施設の再編(=「8校から6校への再編」)の検討結果を踏まえ、次期対策を実施 (4年後の見直し段階において、次期対策を反映)									
	◆			◆											
	35,000			37,000											

検討体制	寒川町立小・中学校適正化等検討委員会
------	--------------------

関連計画	公共施設等総合管理計画、寒川町立小・中学校適正化等基本方針
------	-------------------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
一之宮小学校外壁修繕工事					34,413

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和4年7月5日 ～令和5年1月31日	準備工、仮設工事、外壁補修工事、ネット張り工事、窓枠ネット加工工事、産廃処理工事	35,000 26,681

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
材料の再検討及び無足場工法の採用等による減額

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和4年度

施設名	担 当 課
寒川東中学校	教育施設給食課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
外壁修繕工事	35,000

公共施設再編計画における今後の対策
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
	外壁 (北棟) 修繕		外壁 (南棟) 修繕		屋根 (体育館) 修繕	学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施 （4年後の見直し段階において、次期対策を反映）										
	◆		◆		◆											
	35,000		35,000		28,000											

検討体制	寒川町立小・中学校適正化等検討委員会
------	--------------------

関連計画	公共施設等総合管理計画、寒川町立小・中学校適正化等基本方針
------	-------------------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
寒川東中学校外壁修繕工事					36,058

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和4年7月5日 ～令和5年1月31日	準備工、仮設工事、外壁補修工事、ネット張り工事、窓枠ネット加工工事、産廃処理工事	35,000 21,237

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
材料の再検討及び無足場工法の採用等による減額

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和４年度

施設名	担 当 課
寒川総合図書館	教育施設給食課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和4年度 計画額（対策費用）
空調機（１階・４階）修繕、自動ドア装置更新修繕	2,899

公共施設再編計画における今後の対策
機能維持のための修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	空調機 自動ドア 修繕				屋根修繕										
	◆				◆										
	3,000				11,000										

検討体制	
------	--

関連計画	公共施設等総合管理計画
------	-------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
寒川総合図書館 自動ドア装置更新修繕					1,272
寒川総合図書館 4 階送風機修繕					880
寒川総合図書館 1 階ファンコイル修繕					1,253

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年10月14日 ～令和5年3月31日	自動ドア装置更新修繕	1,169
		1,272
令和4年10月31日 ～令和5年3月31日	4 階送風機修繕	634
		880
令和4年11月18日 ～令和5年3月31日	1 階ファンコイル修繕	1,096
		1,253

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
計画時点と発注時点での物価上昇等に伴う増額

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--



寒川町公民連携推進セミナー ～公民連携で未来につなぐ「寒川」～

目的

民間ノウハウや技術を活用する多様な公民連携手法の導入を積極的に推進することで、寒川町における今後の公共施設の整備・運営及び公共サービスを、地域との連携により効率的かつ効果的に実施できるよう、地域における公民連携事業の意義や課題、方法について理解を深め、今後の地域プラットフォームの形成を目指したセミナーを開催します。

事業内容

回	日程	テーマ	プログラム
第1回	10月30日(月) 15:00～17:00	地域課題とPPPの意義	寒川町から現状紹介・PPPの意義 (地方自治体公民連携研究財団)
第2回	11月9日(木) 15:00～17:00	PPPの先進事例 ～実践した民間事業者 の視点から～	PPPのメリット・効果について ー地域主導型PFI事業の実践 (株式会社 加藤工務店(沼津市))
第3回	11月29日(水) 15:00～17:00	PPPの先進事例 ～実践した自治体の 視点から～	庁舎・公共施設の複合化PPP/PFI事例 (大分市公共施設マネジメント推進室)
第4回	12月13日(水) 15:00～17:00	PPP活用に向けた ワークショップ	PPPで未来につなぐ「寒川」 (地方自治体公民連携研究財団による ファシリテート)

※PPPとは、様々な行政と民間の連携のことを指します。業務委託や指定管理者制度、PFI事業、公有資産活用、公共空間活用、まちづくりなどが代表的なものです。

会場：寒川町役場 東分庁舎第1会議室（寒川町宮山165）

参加者：地元事業者等70名程度

**参加
無料**

申し込み方法

①氏名、②所属、③部署、④連絡先（固定電話、携帯電話、ファックス、住所）を、下記の連絡先、または、右記の二次元コードにて申込▶▶



【連絡先】寒川町財産管理課資産経営担当 〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165

TEL.0467-74-1111 FAX.0467-75-9907 E-mail keikaku@town.samukawa.kanagawa.jp



寒川町公共施設再編整備基金条例 の概要について

2023（令和5年）年11月10日

総務部 財産管理課

目 次

- 1 基金の設置目的
- 2 基金の積み立て目標額
- 3 基金の積み立て方針
- 4 基金新設時の積立額
- 5 基金の活用方針


1 基金の設置目的

基金の必要性

- ・ 公共施設等総合管理計画及び公共施設再編計画に基づき、公共施設の再編、整備、改修等を計画的かつ実行性を高めるための財源を確保するため、基金を設置すること。
- ・ 小・中学校の再編や老朽化が進行する施設機能の複合化、多機能化に伴う整備や改修等、将来を見据えた中では、多額の事業費を要することが見込まれるため、その財源を計画的に積み立てる必要があること。

2

基金の積み立て目標額



寒川町総合計画2040 実施計画（4年サイクル）

総合計画に基づく、直近4年間の施策の事務事業に関する実施計画

財政計画

過去の決算額や人口推計値などの諸条件を設定したうえで、今後の町の歳入歳出見込み額の推移を試算


寒川町公共施設再編計画（4年サイクル）

個別施設に対する今後の対策実施事項を年度別に示した、公共建築物に関する「寒川町公共施設等総合管理計画の実行プラン」

◆ 積み立て目標額

公共施設再編計画の工程表で示す4年ごとの対策実施事業を着実に実行できる額

(4年間で基金の財源【取り崩し(使用)】と【積み立て】をセットにした目標額)

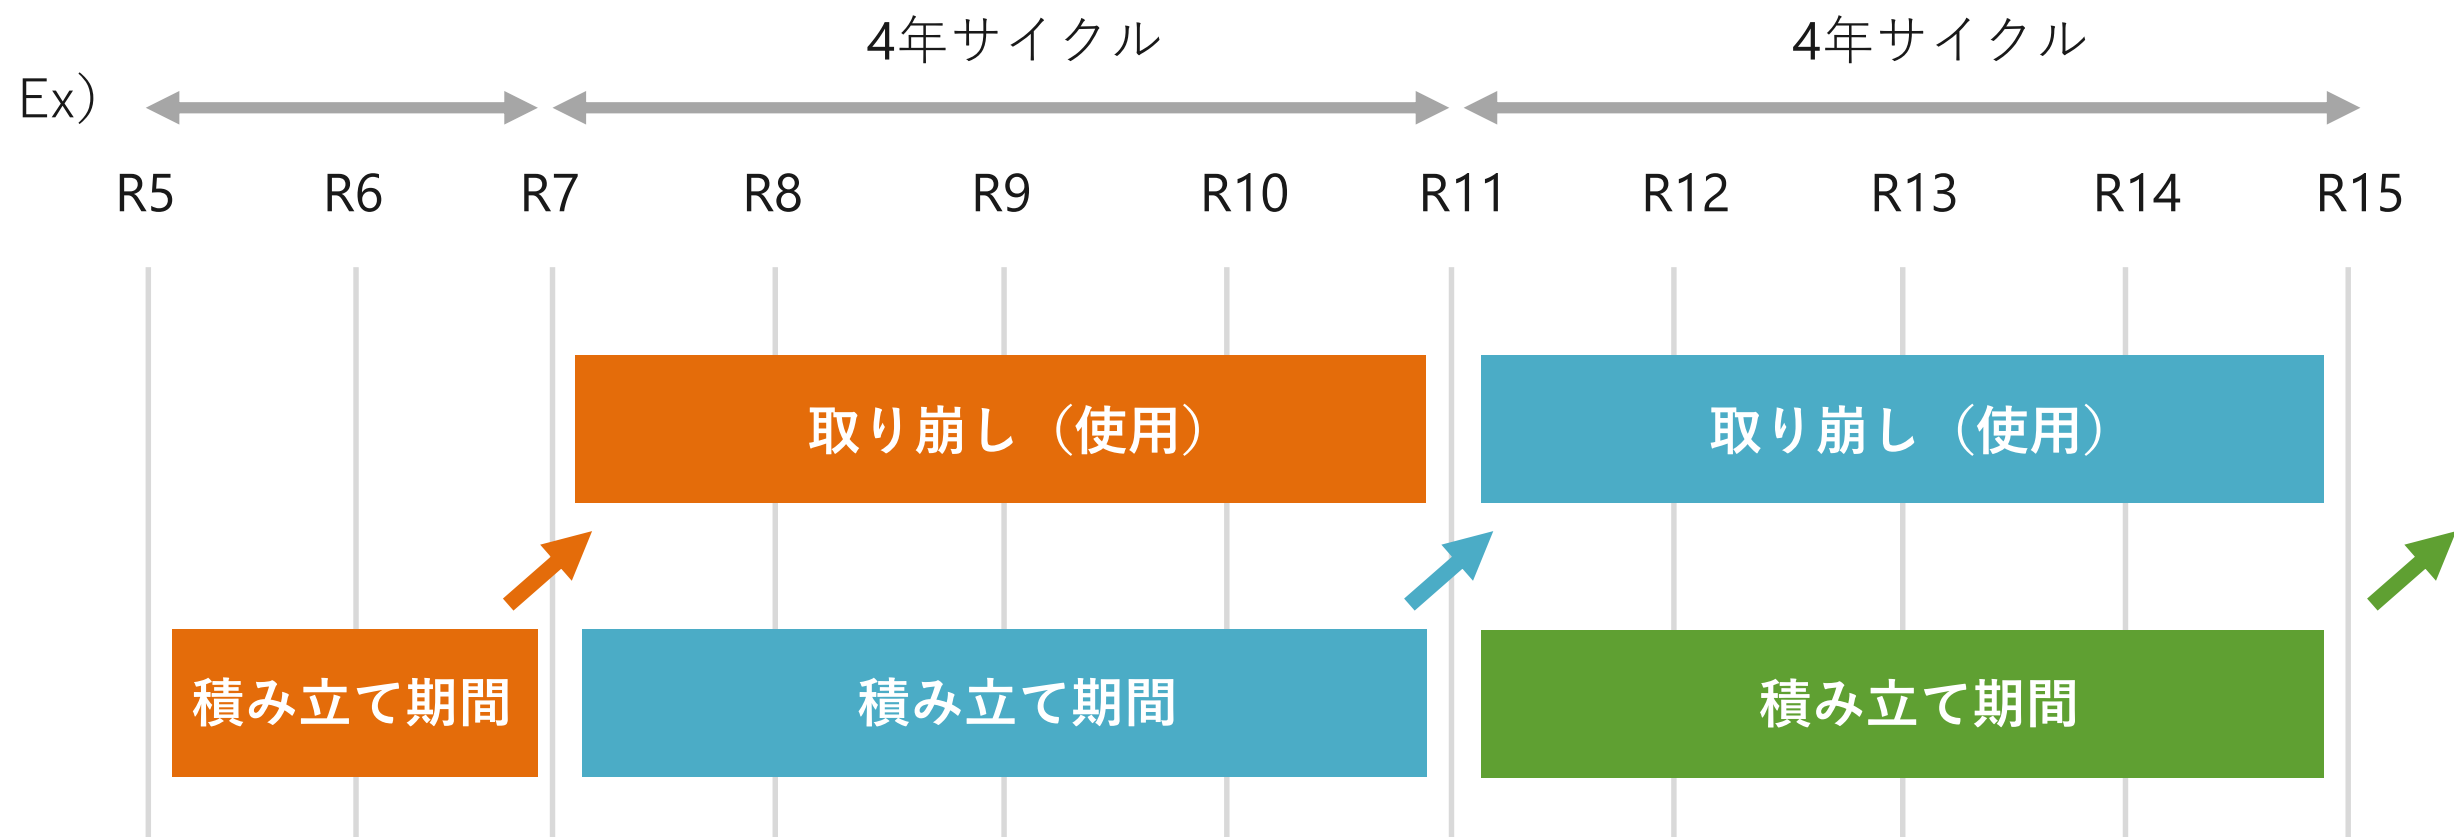

3

基金の積み立て方針

条例上は、『予算において定める額』とし、運用上は、毎年度の財政状況により、次に示すいずれかの額とする。

① 積み立ての原則

『公共施設再編計画の工程表で示す次期4年分の対策実施費用の財源内訳のうち、一般財源所要額』を目安に積み立てる




② 財政状況が厳しい場合には

『減価償却の一定割合』または、『実質収支のうち地方財政法で定める積立（1/2）を差し引いた残額の一定割合』のうち、いずれか低い額を積み立てる

4

基金新設時の積立額

公共施設再編計画工程表の年度別対策費用（一般財源）

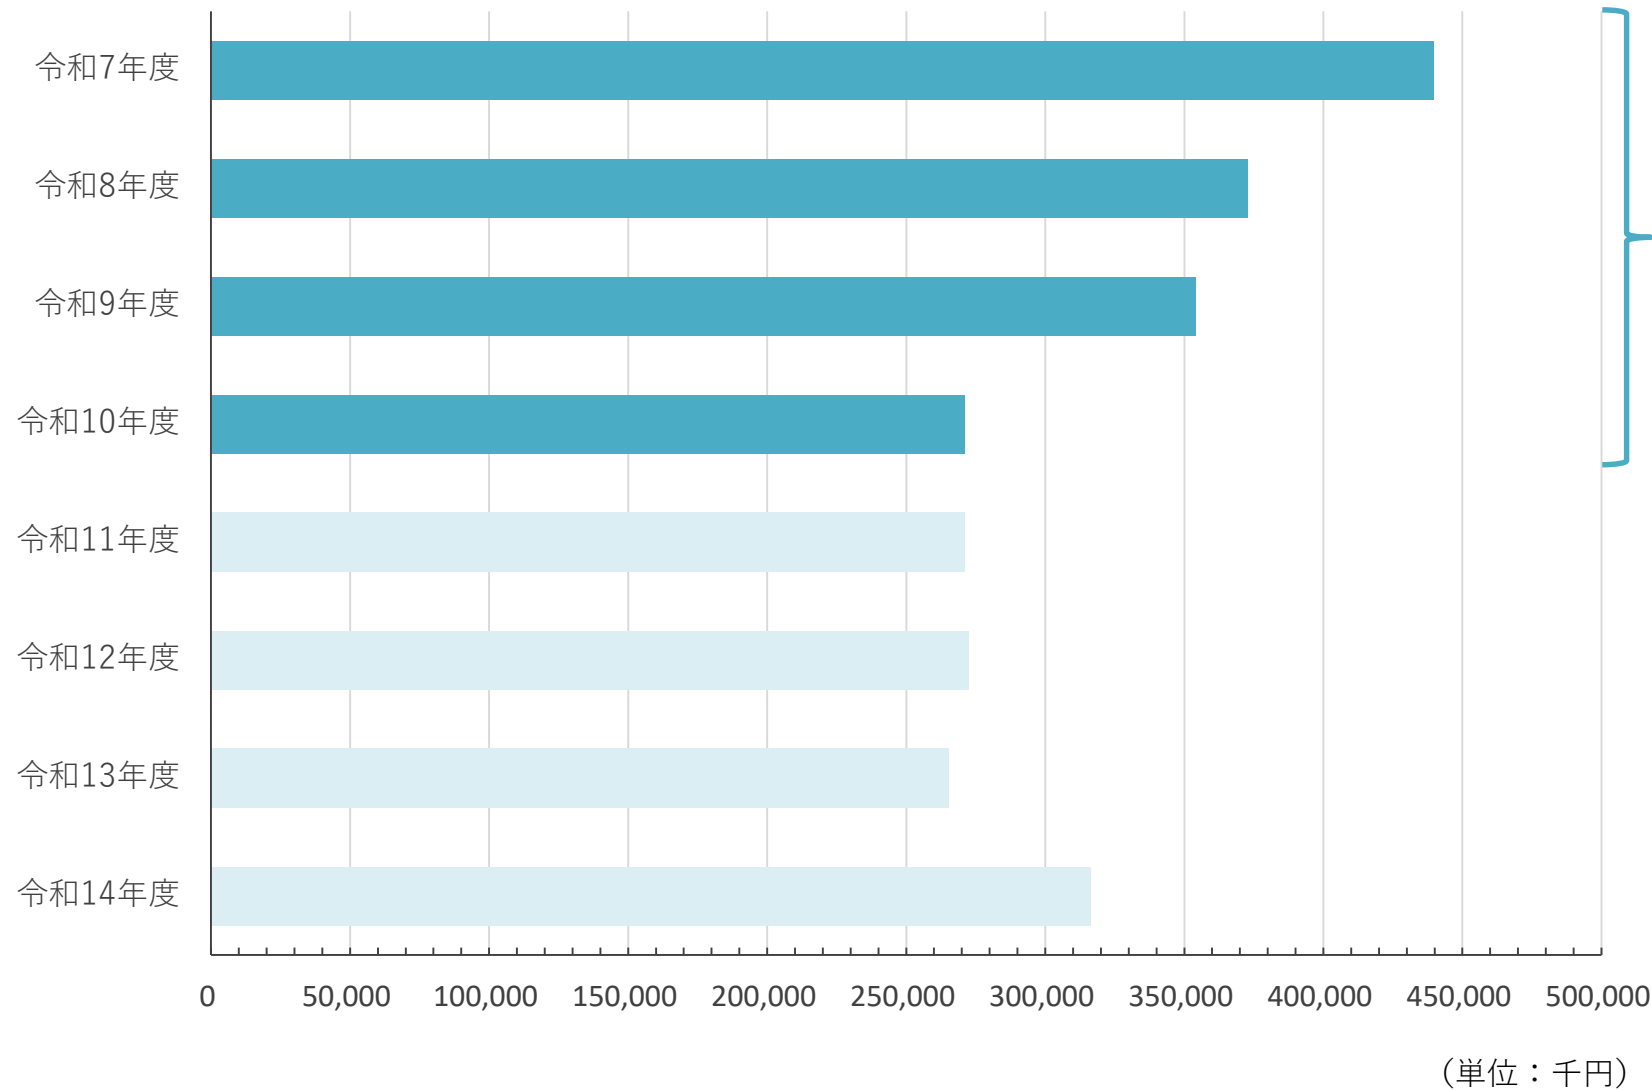

次期4年（R7～R10）の一般財源所要額
14億3,746万8,000円

積立目標額は、

公共施設再編計画の工程表で示す

次期4年分の対策実施費用額のうち
一般財源所要額を基金積み立ての目安額

とする。

5

基金の活用方針

○ 公共施設再編計画の工程表に示す個別施設の対策費用に活用

計画に基づく個別施設の再編、整備、改修等に要する対策費用に活用

Ex) 消防拠点整備、小・中学校再編に伴う整備、将来的な庁舎の建て替え など。



寒川町PFI等選定委員会条例の概要について

2023（令和5年）年11月10日

総務部 財産管理課

目次

- 01 PPP事業実施から終了までの事業スキーム
- 02 事業者選定委員会設置の位置付け
- 03 事業者選定委員会の業務フロー（所掌事務）
- 04 外部有識者（学識経験者等）の報酬額
- 05 委員会条例の制定スケジュール（案）
- 06 今後の方向性について

01 PPP事業実施から終了までの事業スキーム

事業発案 ～ 事業者選定

ステップ

寒川町のアクション

Step 1 事業発案

- ・ PPP/PFI事業の実施検討
- ・ PPP/PFI導入の庁内合意形成

Step 2 実施方針の策定 及び公表

- ・ 事業内容の具体化
- ・ スケジュールの設定

Step 3 特定事業の 選定・公表

- ・ 特定事業の選定・公表
- ・ 事業の詳細公表

Step 4 民間事業者の 募集・選定・公表

- ・ 募集要項の作成・公表
- ・ 提案書の受付
- ・ 審査委員会の運営・結果公表

契約締結 ～ 事業終了

ステップ

寒川町のアクション

Step 5 協定等の締結

- ・ 事業仮契約書の協議・締結
- ・ 事業契約書の協議・締結

Step 6 事業の実施

- ・ 事業実施中の監視など

Step 7 事業の終了

- ・ 事業（施設）の引渡しなど

◀ PFI等選定委員会

02 事業者選定委員会設置の位置付け

- **PPP/PFI実施の事業者選定に、『諮問機関（選定委員会）』を設置。**
 - **専門性・公平性・客観性を確保する必要性があることから、外部有識者（学識経験者）や施設等所管部局の職員で構成する組織を形成する。**
 - **PPP/PFI事業の事業種別・特性、政策・ニーズ状況等に合わせたメンバーで構成し、調査・審議することを見据え、事業ごとに『選定委員会』を設置する。**
 - **委員会として、判断、結論、方向性を示す『合議制の附属機関』を設置する場合には、条例を制定しなければならない。【地方自治法】**

- 『諮問機関』の構成員は、『非常勤職員』として取り扱う。
 - 外部有識者（学識経験者等）は、地方自治法により**非常勤職員とされているため「報酬」及び「費用弁償」を支給しなければならない。**
 - 非常勤職員の「報酬」及び「費用弁償」は、地方自治法により**「報酬」及び「費用弁償」の額は条例で定めなければならない。**
 - 非常勤職員は、地方公務員同様、事業者選定に当たっての**事業者の企業利益部分や事業募集・審査・選定に関する一切の事項に対しては、守秘義務を負います。**
※私的諮問機関は、原則、守秘義務を負いません（契約で課すことを除き）。

03 事業者選定委員会の業務フロー（所掌事務）



【構成員（一例） 15人以内で構成】

- ・学識経験者（大学教授・建築士・弁護士・会計士など）
- ・町職員（企画部長・総務部長・環境経済部長・施設所管部長・技術系職員など）
- ・PFI等により実施される事業の特性に応じ、町長が必要と認める者（施設機能に適した者）

【委員の任期】 委嘱・任命の日から一連過程の審議が終了する日まで。

【会議の非公開】 企業利益の漏えい防止・審査の中立性を確保するため、会議は非公開とする。

04 外部有識者（学識経験者等）の報酬額

■ 報酬額設定時における留意事項


- ・ PPP/PFI事業の事業者選定業務については、民間事業者からの提案書に記載された専門的事項を網羅的に評価する必要があること。
- ・ 選定には、施設整備面・運営面に加え、公共性・民間ノウハウの視点や金融、法律など多角的な要素について専門的知識を有すること。
- ・ 県内・外におけるPPP/PFI事業における外部有識者の報酬額との均衡を考慮した額とすること。

■ 近隣市町村の状況（PPP/PFI事業の諮問機関）

	寒川町	厚木市	藤沢市	平塚市	茅ヶ崎市
外部有識者 （学識経験者）	○	○	○	○	○
任期	事業終了までの間	2年	事業終了までの間	2年	事業終了までの間
法的根拠	条例	条例	規則	条例	条例
報酬額 （日額）	13,000円	委員長 8,800円 委員 7,800円	19,000円	11,300円	10,000円

05 委員会条例の制定スケジュール

05 委員会条例の制定スケジュール

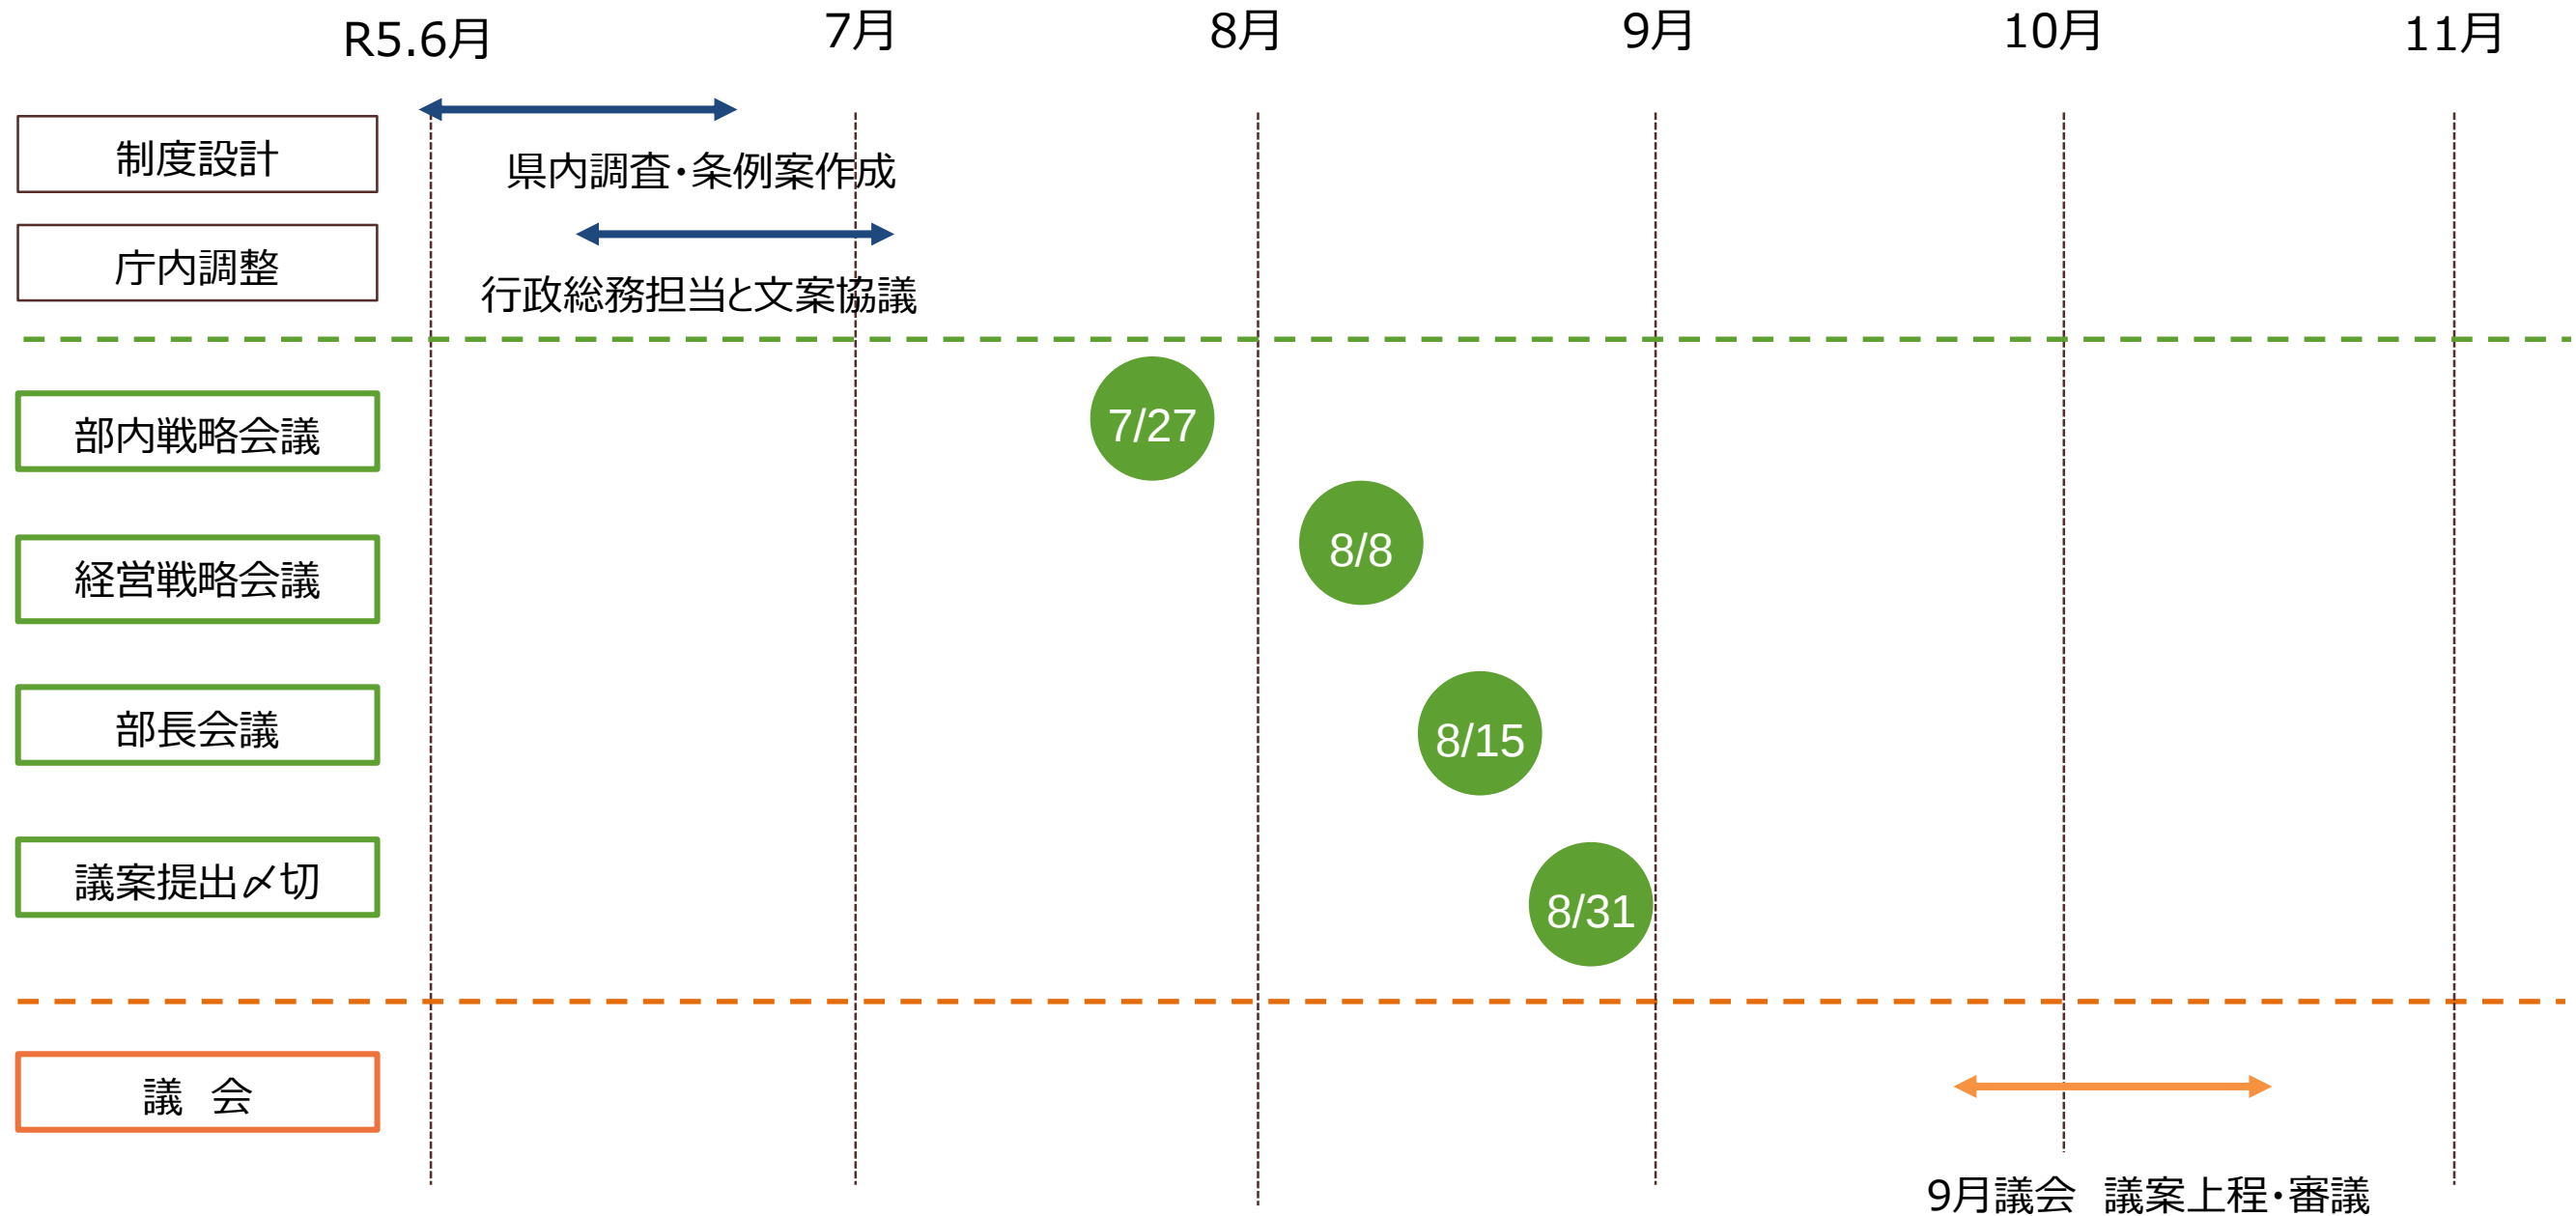

06 今後の方向性について

この取り組みは、PPP/PFI(公民連携)手法により、
効果的かつ効率的に『民間活力』を最大限に生かす『整備手法の一つ』を選択するために、
専門的知識を有する外部有識者を含む合議制の諮問機関を設置します。
近い将来に、施設整備を迎える消防広域化に伴う新たな消防拠点の施設整備が
寒川町のPPP/PFI手法『第一弾』として取り組みを進めることができるよう
一歩ずつ着実に体制整備を目指してまいります。
