



寒川町公共施設等総合管理計画 の進捗状況について

企画部 資産経営課

目次

01

公共施設再編計画について

02

2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

03

公共施設再編計画改定版（R7～）の基本方針

04

2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

05

公共施設再編計画の改定方針


01

公共施設再編計画について

計画の位置付け／計画の実施体制／計画のPDCAサイクル


1. 公共施設再編計画について

1-1. 寒川町公共施設再編計画の位置付け

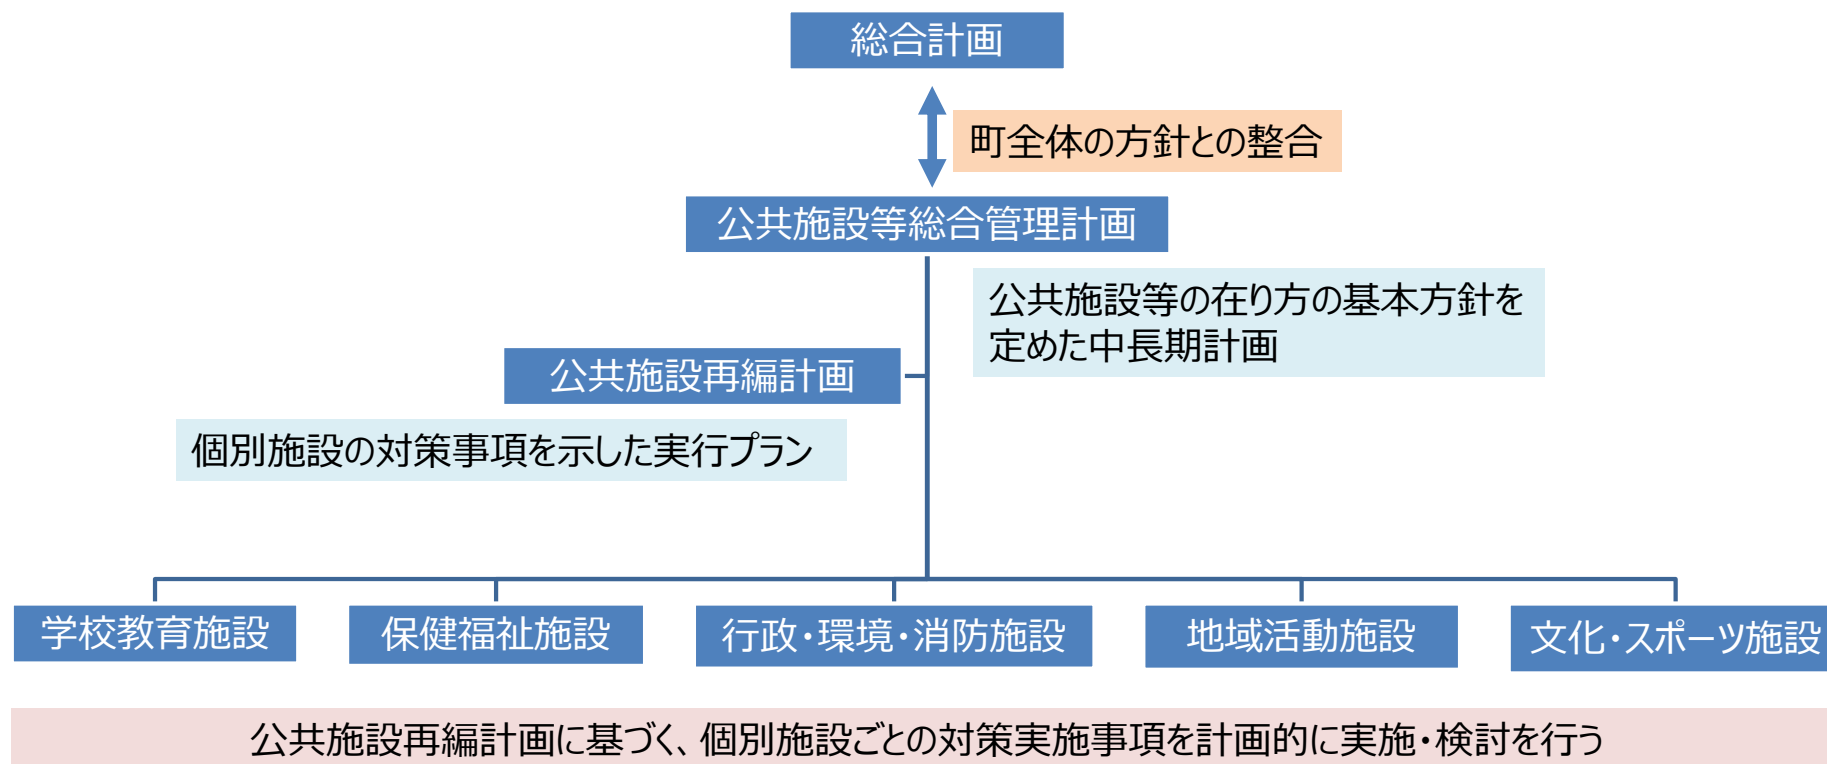


1. 公共施設再編計画について

1-2. 公共施設再編計画の実施体制

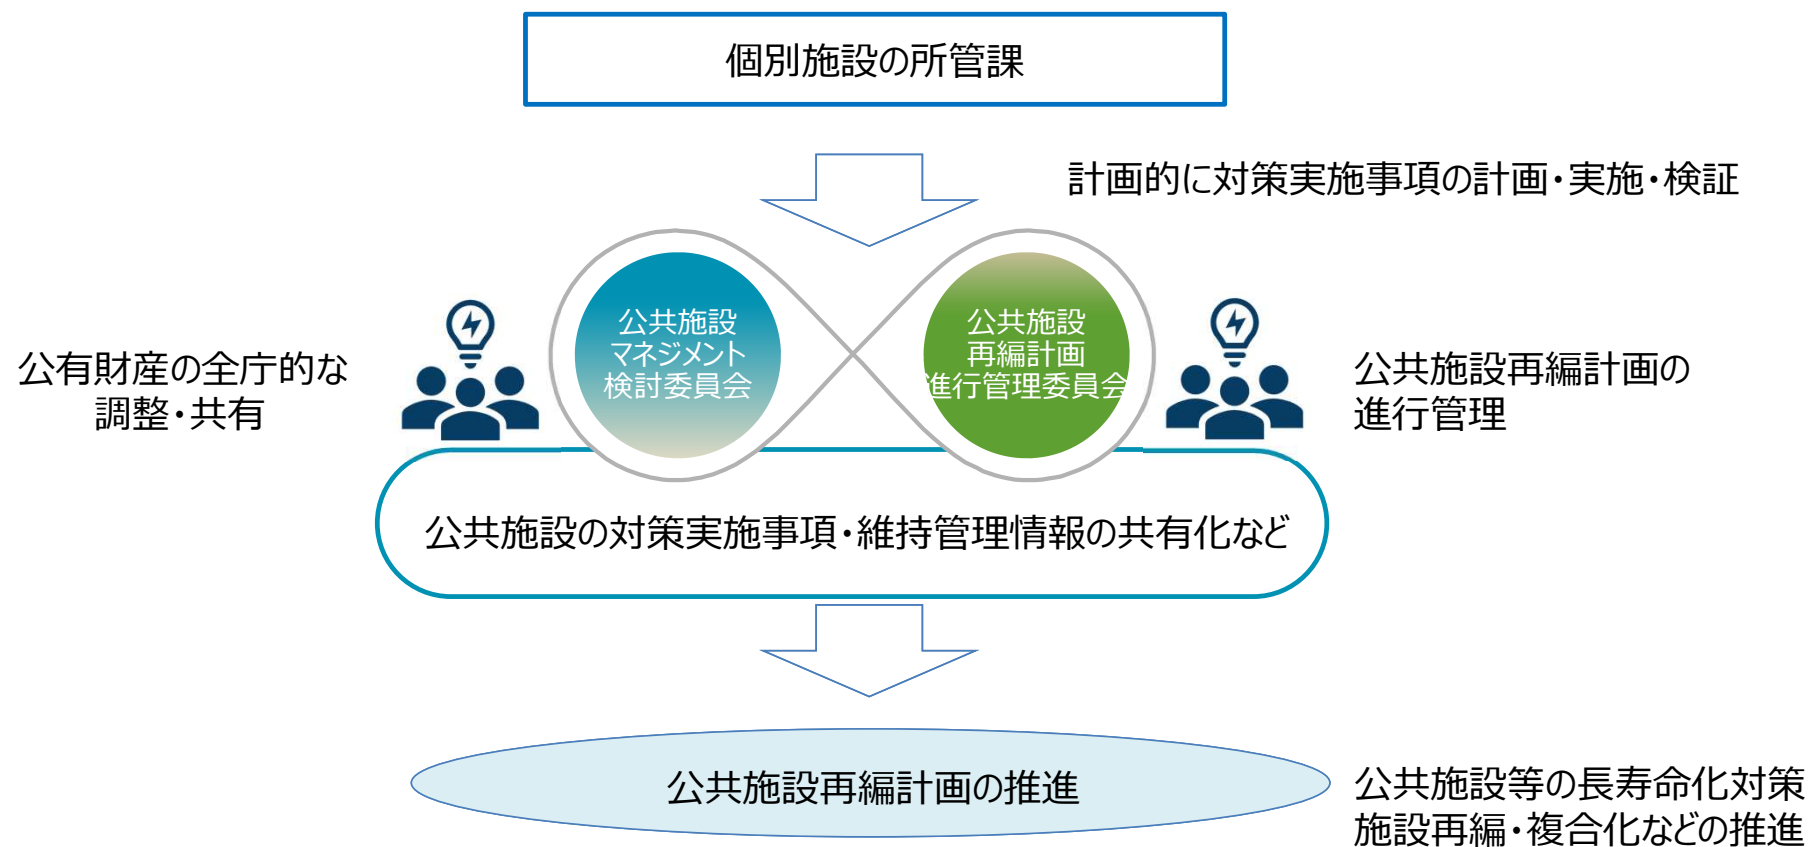

1. 公共施設再編計画について

1-3. 公共施設再編計画のPDCAサイクル

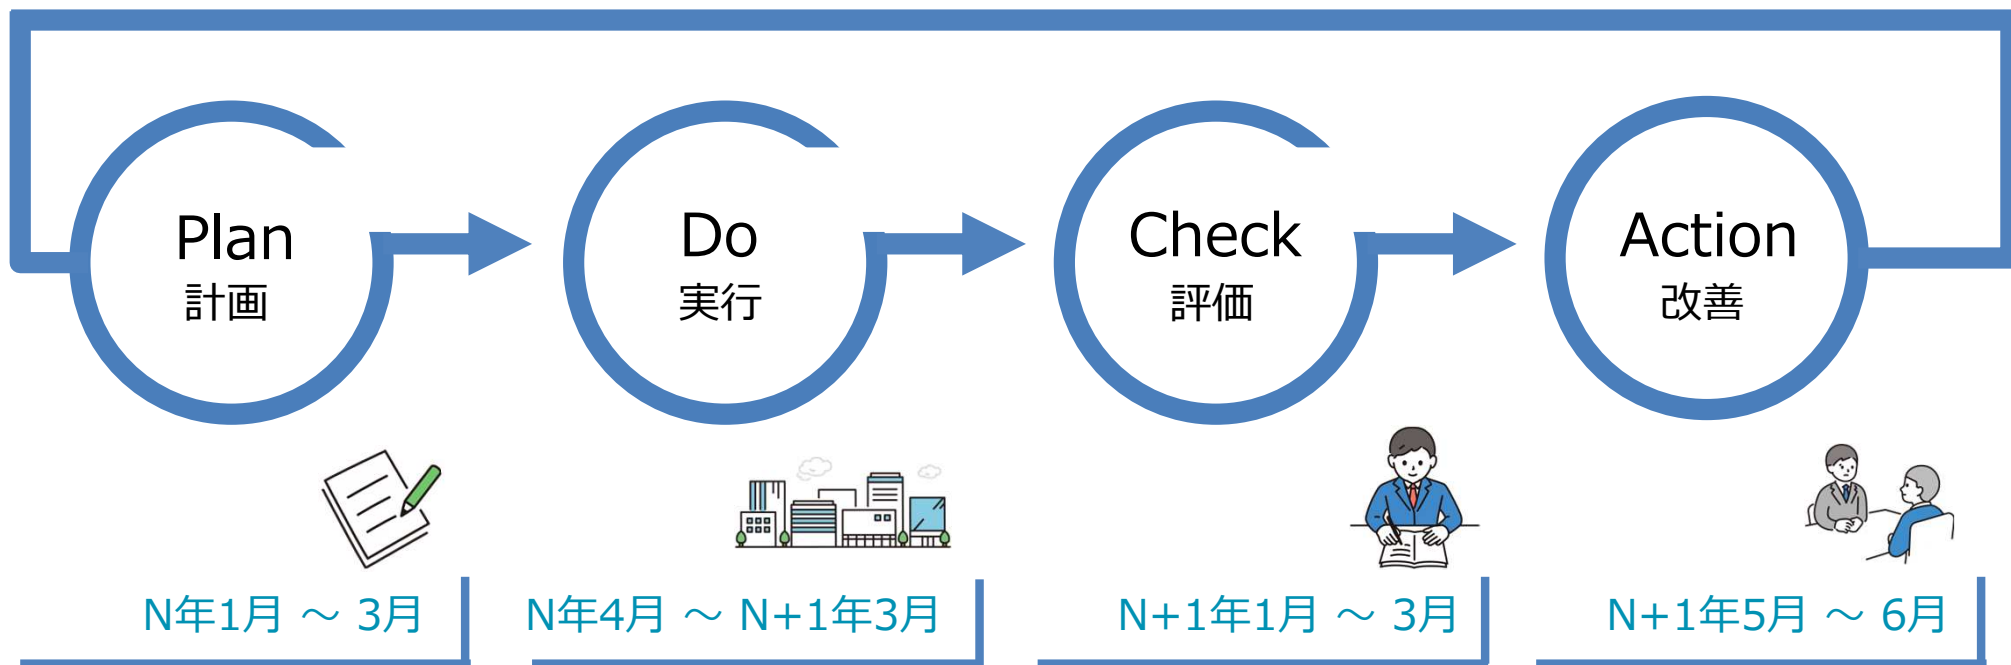

- ✓ 再編計画工程表をもとにした業務計画を作成

《進捗状況管理シート》を作成・提出（計画時）

- ✓ 計画にそって事業（業務）の協議・検討 / 実施

- ✓ 進捗状況の確認
- ✓ 計画に沿う内容かを評価

《進捗状況管理シート》を作成・提出（取組状況）

- ✓ 実施結果の振り返り・検証
- ✓ 計画への反映 / 目標の再検討

《進捗状況管理シート》を作成・提出（実績報告）

2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

健康管理センター／福祉活動センター／ふれあいセンター／
各小・中学校体育館屋根／一之宮小学校／旭が丘中学校／
各小・中学校体育館空調／各小・中学校執務室空調／
寒川総合体育館／役場庁舎／美化センター／北部地域の新たな消防拠点

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

公共施設再編計画 2025（令和7年）年度 対策実施スケジュール

	2025 4	5	6	7	8	9	10	11	12	2026 1	2	3
健康管理センター	代替施設の整備 ※R8繰越											
福祉活動センター	トイレ修繕											
ふれあいセンター	自動火災報知設備更新											

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

公共施設再編計画 2025（令和7年）年度 対策実施スケジュール

	2025 4	5	6	7	8	9	10	11	12	2026 1	2	3
各小学校体育館屋根				各小学校体育館屋根改修								
各中学校体育館屋根		各中学校体育館屋根改修工事詳細設計										
一之宮小学校				北棟防水修繕								
旭が丘中学校		技術棟屋根改修工事の詳細設計										
各小学校体育館空調										空調機設置の設計		
各中学校体育館空調										空調機設置の設計		
小学校執務室空調										空調機設置工事 ※R8繰越		
中学校執務室空調										空調機設置工事 ※R8繰越		

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

公共施設再編計画 2025（令和7年）年度 対策実施スケジュール

	2025 4	5	6	7	8	9	10	11	12	2026 1	2	3
寒川総合体育館	電気設備修繕・弓道場人工芝張替											
役場庁舎	LED化・全熱交換器系統空調機修繕工事設計・電話設備更新及びPHS化											
美化センター	定期修繕・DCSシステム更新・受変電設備工事設計											
北部地域消防拠点	宮山出張所建設工事・消耗品および備品の購入											

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

※ 各項目の進捗率については、12月末時点の状況です。

健康管理センター

契約金額 606,969,000 円 [進捗率 62 %]

■ 計画額との増減理由

[計画額] 0円

- ✓ 契約後の急激な物価・賃金の変動により請負金額が不
当になったため、インフレスライド条項に基づき契約金
額の増が発生。
- ✓ 契約変更前の金額: 598,950千円

工事概要

- ・設計施工一括発注方式(デザイン・ビルド方式)
による施工。
- ・設計業務はすでに終了。
- ・建築と工事監理業務については、出来形検査を
実施済。

福祉活動センター

契約金額 7,040,000 円 [進捗率 10 %]

■ 計画額との増減理由

[計画額] 7,722,000円

- ✓ 入札による減。

工事概要

- ・施設機能維持(ウォシュレット機能や洗面水栓の自動化)
の為にトイレ修繕工事。
- ・1月から解体撤去作業を開始予定。
- ・2月から設備や電気関係の工事を開始予定。
- ・3月中旬完成予定

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

※ 各項目の進捗率については、12月末時点の状況です。

ふれあいセンター

契約金額 2,310,000 円

〔進捗率 100 %〕

■ 計画額との増減理由

〔計画額〕 2,651,000 円

- ✓ 入札による減。

工事概要

- ・機器の耐用年数に応じて、自動火災報知設備の更新工事を実施。
- ・11月に更新工事を実施し、12月時点で工事完了。

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

※ 各項目の進捗率については、12月末時点の状況です。

各小学校体育館屋根	契約金額 94,903,600 円 [進捗率 100 %]
<p>[計画額] 80,124,000 円</p> <p>■ 計画額との増減理由</p> <p>✓ 一部学校において、工事の設計で数量に違算があることが分かり、契約変更を行ったため。</p>	<p>実施事項概要</p> <p>・町内小学校体育館(寒川小学校、一之宮小学校、旭小学校、小谷小学校、南小学校)屋上防水および劣化部分の改修工事および監理を実施。</p>

一之宮小学校	契約金額 38,060,000 円 [進捗率 100 %]
<p>[計画額] 39,985,000 円</p> <p>■ 計画額との増減理由</p> <p>✓ 入札による減額。</p>	<p>実施事項概要</p> <p>・校舎北棟屋上の防水工事(塗布防水)を実施。</p>

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

※ 各項目の進捗率については、12月末時点の状況です。

各中学校体育館屋根	契約金額	4,598,000 円	〔進捗率 100 %〕
〔計画額〕 6,622,000 円	実施事項概要		
■ 計画額との増減理由 ✓ 入札による減。	・令和8年度に予定する、町内中学校体育館（寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校）改修工事のための詳細設計を実施。		

旭が丘中学校	契約金額	1,628,000 円	〔進捗率 100 %〕
〔計画額〕 2,134,000 円	実施事項概要		
■ 計画額との増減理由 ✓ 入札による減。	・令和8年度に予定する、技術棟屋根の改修工事のための詳細設計を実施。		

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

※ 各項目の進捗率については、12月末時点の状況です。

各小・中学校体育館空調

契約金額 一 円

〔進捗率 0 %〕

〔計画額〕 0 円

■ 計画額との増減理由

- ✓ 10月補正により実施が決まったため。

実施事項概要

- ・令和8年度の設置に向けて、各小・中学校の体育館へ空調機を設置するための設計を委託。

各小・中学校執務室空調

契約金額 一 円

〔進捗率 0 %〕

〔計画額〕 0 円

■ 計画額との増減理由

- ✓ 12月補正により実施が決まったため。

実施事項概要


- ・小学校（寒川小学校、一之宮小学校、南小学校）および中学校3校の執務室へ、空調設備を導入するための工事を実施。
- ・令和8年度へ繰り越し工事を実施。

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

※ 各項目の進捗率については、12月末時点の状況です。

総合体育館 (電気設備修繕)		契約金額	4,565,000 円	〔進捗率 30 %〕
〔計画額〕 8,745,000 円		実施事項概要		
■ 計画額との増減理由 ✓ 工事に必要な費用を積み上げて計画額を算出していたが、入札により契約金額が減額したため。		・2月に電気設備修繕工事(直流電源装置(蓄電池)の交換)を実施予定。		

総合体育館 (弓道場人工芝張替)		契約金額	9,185,000 円	〔進捗率 100 %〕
〔計画額〕 10,754,000 円		実施事項概要		
■ 計画額との増減理由 ✓ 入札による減。		・11月に人工芝張替工事を実施。		



2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

■ 2025（令和7年）年度 寒川総合体育館の機器類更新リース 一覧〔再編計画事業〕



中央監視システム

施設内における各設備の自動化、故障の監視・記録など施設管理を実施するための各種機能を搭載したシステム

〔リース期間〕 R3年度から5年間リース
〔契約金額〕 37,890,600 円
〔R7年度支払額〕 6,315,100 円





吸収式冷温水発生機

館内を空調（冷暖房）管理する際に使用する「水」を冷媒とした環境にやさしい空調システム

機器1	〔リース期間〕	R6.3.1～R11.2.28（5年間リース）
	〔契約金額〕	81,318,600 円
	〔R7年度支払額〕	16,263,720 円
機器2	〔リース期間〕	R7.3.1～R12.2.28（5年間リース）
	〔契約金額〕	100,914,000 円
	〔R7年度支払額〕	20,182,800 円

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

※ 各項目の進捗率については、12月末時点の状況です。

美化センター（機器類定期修繕）	契約金額 50,295,630 円	〔平均進捗率 68 % 〕
■ 計画額との増減理由 〔計画額〕 53,262,000 円 ✓ 契約前にあらためて見積もりを徴したところ、計画額よりも安価に契約できたため。	修繕工事概要 ・スクリーンプンプ整備（12月以降順次工事中） ・汚泥脱水機等整備（2月上旬工事予定） ・脱気槽補修工事（2月中旬完了予定） ・PAS用A種接地修繕（完了）	
美化センター（DCSシステム更新）	契約金額 38,500,000 円	〔進捗率 50 % 〕
■ 計画額との増減理由 〔計画額〕 49,907,000 円 ✓ 契約前にあらためて見積もりを徴したところ、計画額よりも安価に契約できたため。	修繕工事概要 ・し尿処理施設運転制御システムであるDCSシステムの更新を実施。 ・1月以降順次工事を実施し、2月に完成予定。	
美化センター（受変電設備工事設計）	契約金額 6,869,500 円	〔進捗率 100 % 〕
■ 計画額との増減理由 〔計画額〕 7,671,000 円 ✓ 入札による減。	修繕工事概要 ・令和8年度に予定する、受変電設備工事の設計業務を委託。 ・11月末に完成	

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

※ 各項目の進捗率については、12月末時点の状況です。

役場庁舎（LED化工事）

契約金額 12,221,000 円

〔平均進捗率 65.17 %〕

■ 計画額との増減理由

〔計画額〕 12,925,000 円

✓ 入札による減。

工事概要

・蛍光灯が製造及び輸出禁止となるため、LED未整備箇所のLED化を実施。（執務スペース内はLED化済みのため、誘導灯や非常灯及び通路等の照明のみ）1月末工事完了予定。

役場庁舎（空調機修繕工事設計）

契約金額 0 円

■ 計画額との増減理由

〔計画額〕 9,493,000 円

✓ 職員による設計が可能と分かり、設計委託が不要となったため。

工事概要

・実施なし。

役場庁舎（電話設備工事）

契約金額 45,783,000 円

〔進捗率 30 %〕

■ 計画額との増減理由

〔計画額〕 5,211,000 円

✓ 電話保守点検業務を委託する業者との契約により、設計委託を省略し、令和7年度に工事を実施。
✓ 令和8年の工事契約は不要。（計画額48,034千円）

工事概要

・電話交換機の更新に併せて内線電話機をコードレスのPHSに変更するとともに、通話録音機能を導入。
・健康管理センター代替施設の完成に合わせて利用開始。

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

※ 各項目の進捗率については、12月末時点の状況です。

宮山出張所（北部地域の 新たな消防拠点）

契約金額

498,306,900 円

■ 計画額との増減理由

〔計画額〕 434,377,000 円

- ✓ 契約後の急激な物価・賃金の変動により請負金額が不適當になったため、インフレスライド条項に基づき契約金額の増が発生。
- ✓ 契約変更前の金額：482,900千円



実施事業概要

- ・令和6年4月に本契約を締結。
- ・令和7年4月に変更契約を締結。
- ・1月末に完了検査を実施し、3月までに建物引き渡し予定。

2. 2025（令和7年）年度 対策実施の取組み状況について

■ 2025（令和7年）年度 各公共施設の施設整備費に係る償還 一覧

寒川町営プール

（R3.7 供用開始）



整備償還費

〔R7年度分〕

25,690,738円

（R3年度より20年間償還）

寒川町営 さむかわテニスコート

（R5.5 供用開始）



整備償還費

〔R7年度分〕

23,689,105円

（R5年度より10年間償還）

寒川学校給食センター

（R5.8 供用開始）



整備償還費

〔R7年度分〕

81,498,019円

（R5年度より20年間償還）

公共施設再編計画改定版（R7～）の基本方針

2025年（令和7年）から2036年（令和18年）までの12年計画

3 . 公共施設再編計画改定版（R7～）の基本方針

本計画における12年間（2025（令和7年）から2036（令和18年））の基本方針

- 1 消防広域化による2カ所の消防拠点整備
- 2 公民館移転に向けての検討
- 3 学校教育施設の再編
- 4 学校教育施設の当面の対応
- 5 地域集会所の方向性の検討
- 6 にぎわい交流創出ゾーンの検討
（将来に向けた役場庁舎の建替えの検討）
（健康・福祉拠点の整備）
- 7 定期的な推計値の見直しによる本方針の検証を継続

3 . 公共施設再編計画改定版（R7～）の基本方針

～ 今後の取組みについて ～

1 消防広域化による2カ所の消防拠点整備

- ・北部地域の消防拠点（出張所）は、2026年1月完成予定。
- ・南部地域の消防拠点（分署）は、2031年（R13）供用開始に向け、用地の取得を行う。

2 公民館移転に向けての検討

- ・北部、南部公民館については、南北両地域に整備予定の消防拠点の近隣や、学校再編の状況を踏まえて、移転することを視野に検討を進める。

3 学校教育施設の再編

- ・財政シミュレーションなどから検証を行った結果、「学校適正化B案」を進める。
- ・校舎建替えは、学校単一機能ではなく、複合化・多機能化した施設とする。
- ・複合化や多機能化を進めるため、庁内横断的なチームや、町民の意見を取り入れながら検討を進める。

4 学校教育施設の当面の対応

- ・学校再編の整備（建替）が行われるまでの間、現行の機能維持のため、施設の維持に必要な修繕を実施する。

出典：寒川町公共施設再編計画改定版

3 . 公共施設再編計画改定版（R7～）の基本方針

～ 今後の取組みについて ～

5 地域集会所の方向性の検討

・「完全地域移管」「一部地域移管（＝無償貸与）」「学校教育施設への複合化」の中から、2030年までに今後の方針を選択する。

6 にぎわい交流創出ゾーンの検討

（将来に向けた役場庁舎の建替えの検討）

- ・建物内設備機器類をはじめとする機能の維持を目的とした修繕を実施。
- ・将来的な庁舎の建替えの検討を行う。

（健康・福祉拠点の整備の検討）

- ・にぎわい交流創出ゾーンの描く公共施設集積エリアにおける位置づけについて、庁内横断的なチームや、町民の意見を取り入れながら検討を進める。

7 定期的な推計値の見直しによる本方針の検証を継続

- ・「学校適正化B案」は現時点の情報をもとに、最適な学校配置の検討を行ったものである。
- ・社会情勢の変動などにより、人口推計や財政推計の見直しの必要が生じた場合は、この計画の方針の検証を継続する。

出典：寒川町公共施設再編計画改定版

2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

福祉活動センター / ふれあいセンター /

小谷・南・寒川東中学校 / 旭が丘中学校 / 各中学校体育館屋根 / 小中学校体育館・執務室空調機

南部・北部公民館 / 総合図書館 / 総合体育館 /

役場庁舎 / 美化センター / 新たな消防拠点（南部・北部）

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

公共施設再編計画 2026（令和8年）年度 対策実施 予定スケジュール

	2026										2027		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
福祉活動センター	照明修繕												
ふれあいセンター	業者選定		関係機関との調整					昇降機修繕実施					
小谷・南小学校 寒川東中学校	照明器具のLED化												
旭が丘中学校	技術棟屋根改修												

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

公共施設再編計画 2026（令和8年）年度 対策実施 予定スケジュール

	2026										2027			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
各中学校体育館 屋根				体育館屋根改修工事										
小・中学校体育館 空調機	設置工事 実施時期未定													
小・中学校執務室 空調機	設置工事 実施時期未定													
南部・北部公民館				防水修繕設計										
総合図書館				屋根修繕設計										

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

公共施設再編計画 2026（令和8年）年度 対策実施 予定スケジュール

	2026										2027			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
総合体育館	建築設備是正および電気設備工事の設計													
役場庁舎 (全熱交換器修繕)	業者選定(入札)		工事施工											
役場庁舎 (電話設備更新)	R7に前倒しで実施のため、R8は実施なし													
役場庁舎 (三角地整備)	業者選定(入札)		設計書作成					業者選定(入札)		工事施工※R9繰越				
美化センター	定期修繕・受変電設備工事													
消防拠点(北部)	R7.3に供用開始のため、R8は実施なし													
消防拠点(南部)	用地選定及び決定													

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

福祉活動センター

計画額 2,805,000 円

[※ 再編計画上の計画額であり、
予算額ではありません]

✓ 照明の修繕(LED化など)を行う。

【スケジュール】 実施時期未定

ふれあいセンター

計画額 1,496,000 円

[※ 再編計画上の計画額であり、
予算額ではありません]

- ✓ 昇降機の修繕を行う。
- ✓ 自動ドアの修繕については、指定管理者による整備を予定。

【スケジュール】 第3四半期から第4四半期で実施予定

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

校舎内照明器具LED化

計画額 以下に記載

〔※ 再編計画上の計画額であり、
予算額ではありません〕

✓ 機能維持のための対策として、校舎内照明のLED化を行う。

- ◆小谷小学校 …………… 10,000千円
- ◆南小学校 …………… 20,000千円
- ◆寒川東中学校 …………… 20,000千円

【スケジュール】 第2四半期から第3四半期に実施予定

旭が丘中学校

計画額 8,800,000 円

〔※ 再編計画上の計画額であり、
予算額ではありません〕

✓ R7に実施した設計をもとに、技術棟屋根の改修工事を行う。

【スケジュール】 第2四半期から第3四半期に実施予定

各中学校体育館 屋根修繕

計画額 以下に記載 円

〔※ 再編計画上の計画額であり、
予算額ではありません〕

✓ R7に実施した設計をもとに、各中学校体育館の屋根の改修を行う。

- ◆寒川中学校 …… 22,000千円 ◆3校分の工事監理
- ◆旭が丘中学校 … 18,000千円 …………… 6,800千円
- ◆寒川東中学校 … 28,000千円

【スケジュール】 第2四半期から第3四半期に実施予定

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

小・中学校体育館空調機

計画額 0 円

〔※ 再編計画上の計画額であり、
予算額ではありません〕

- ✓ 記録的な猛暑への対応として、各学校の体育館へ空調機を設置する。
- ✓ R7に設計を実施。R8設置工事を予定。

【スケジュール】

未定

小・中学校執務室空調機

計画額 0 円

〔※ 再編計画上の計画額であり、
予算額ではありません〕

- ✓ 記録的な猛暑への対応として、各学校の執務室へ空調機を設置する
- ✓ R7に工事を開始し、令和8年度に繰り越して工事を行う。
- ✓ 小学校（寒川小・一之宮小・南小）、中学校：全校

【スケジュール】

未定

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

南部・北部公民館

計画額 4,000,000 円

〔※ 再編計画上の計画額であり、
予算額ではありません〕

- ✓ 施設機能維持のため、防水修繕を行う。

【スケジュール】

第2四半期から第3四半期に実施予定

総合図書館

計画額 42,211,000 円

〔※ 再編計画上の計画額であり、
予算額ではありません〕

- ✓ 施設機能維持のため、屋根修繕に向けた設計を行う。
- ✓ 中央監視システム更新工事は、実施時期を見直して実施する。

【スケジュール】

第2四半期から第3四半期に実施予定

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

総合体育館

計画額 以下に記載

〔※再編計画上の計画額であり、予算額ではありません〕

- ✓ 施設維持管理のため計画的な整備工事を行う。

【スケジュール】

【建築設備是正および電気設備工事設計】

第2四半期までに各種手続きや関係団体との調整を終え、第3四半期中に修繕の設計を完了する。

◆建築設備是正・電気設備工事設計・メインアリーナ移動式観覧席修繕設計・・・35,883千円

【以下はR8実施なし】

◆体育館器具類更新・・・ 17,500千円

→R4に前倒しで実施済(移動式バスケットゴール・武道場の畳)


◆アリーナ天井耐震工事検討・・・ 16,300千円

→今後のPFI手法(RO方式)の検討によって、実施の方向性が決まるため、R8実施はなし。

◆パンプトラック修繕・・・ 1,265千円

→指定管理者側からの申出に基づき、指定管理者において修繕を実施するため。

■ 2026（令和8年）年度 寒川総合体育館の機器類更新リース 一覧〔再編計画事業〕

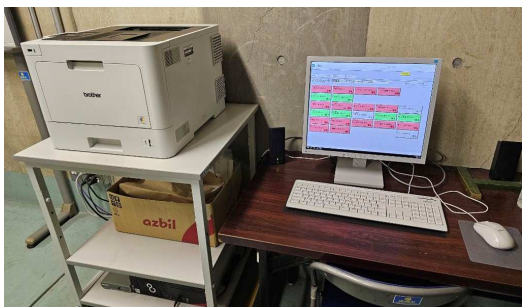

中央監視システム

施設内における各設備の自動化、故障の監視・記録など施設管理を実施するための各種機能を搭載したシステム

〔リース期間〕 R3年度から5年間リース
〔契約金額〕 37,890,600 円
〔R8年度計画額〕 6,315,100 円



吸収式冷温水発生機および2次ポンプ

館内を空調（冷暖房）管理する際に使用する「水」を冷媒とした環境にやさしい空調システム

機器1	〔リース期間〕	R6.3.1～R11.2.28（5年間リース）
	〔契約金額〕	81,318,600 円
	〔R8年度計画額〕	16,263,720 千円
機器2	〔リース期間〕	R7.3.1～R12.2.28（5年間リース）
	〔契約金額〕	100,914,000 円
	〔R8年度計画額〕	20,182,800 円
ポンプ	〔リース期間〕	R8.1.1～R12.12.31（5年間リース）
	〔R8年度計画額〕	5,554,560 円

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

寒川町役場

計画額 以下に記載

〔※再編計画上の計画額であり、予算額ではありません〕

- ✓ 施設機能維持のため、計画的な整備工事を行う。
- ✓ R7に職員で実施した設計をもとに全熱交換器系統空調機修繕工事を行う。
- ✓ 電話設備更新工事については、令和7年度に先行して工事を実施したためR8は実施なし。
- ✓ 健康管理センター代替施設南側の三角地の整備を行う。

◆全熱交換器系統空調機修繕 …… 36,293千円

◆電話設備更新工事 …………… 0円

※R7実施済のため。計画額:48,034千円

◆健康管理センター代替施設南側三角地整備 …… 0円

※再編計画の内容が固まってから土地を取得したため、再編計画への金額の位置づけなし。

※R8に設計、R8～R9にかけて整備工事を実施。

【スケジュール】

【全熱交換器修繕】 第1四半期に業者を選定、第2四半期～第4四半期に工事施工

【三角地整備】 第1四半期に業者を選定、第1四半期(途中)から第3位四半期に設計書を作成

第3四半期(途中)から第4四半期に施工業者を選定、第4四半期(途中)から工事施工

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

美化センター

計画額 122,575,000 円

[※再編計画上の計画額であり、予算額ではありません]

✓ 施設維持管理のため計画的な整備工事を行う。

修繕工事概要

【定期修繕】

設備機器等修繕料

DCSシステム等点検整備工事

スクリープポンプ等整備工事／脱臭装置整備工事

トラックスケール等整備工事／

【受変電設備工事・監理業務】

◆定期修繕	46,587千円
◆受変電設備工事	72,863千円
◆受変電設備工事監理	3,125千円

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

茅ヶ崎市消防署 寒川分署

計画額 150,000,000 円

〔※ 再編計画上の計画額であり、
予算額ではありません〕

- ✓ 用地取得に向けた検討を行う。

【スケジュール】

令和13年の供用開始を目途に施設の整備を進める必要があるため、南部地域の消防拠点（寒川分署）の用地を取得する。

【再編計画上の今後のスケジュール】

R9: 建物設計

R10-R11: 建設工事／消耗品・備品の購入

R12: 供用開始

4. 2026（令和8年）年度 対策実施の計画概要について

■ 2026（令和8年）年度 各公共施設の施設整備費に係る償還 一覧

寒川町営プール

（R3.7 供用開始）



整備償還費

〔R8年度分〕

25,694,168円

（R3年度より20年間償還）

寒川町営 さむかわテニスコート

（R5.5 供用開始）



整備償還費

〔R8年度分〕

23,693,354円

（R5年度より10年間償還）

寒川学校給食センター

（R5.8 供用開始）



整備償還費

〔R8年度分〕

81,512,374円

（R5年度より20年間償還）

公共施設再編計画の改定方針


計画改定スケジュール / 令和11年度改定に向けて、アクションすべき事項

5. 公共施設再編計画の改定方針

■ 計画改定スケジュール

① これまでのアクション


② 次期（令和11年度）改定までのアクション

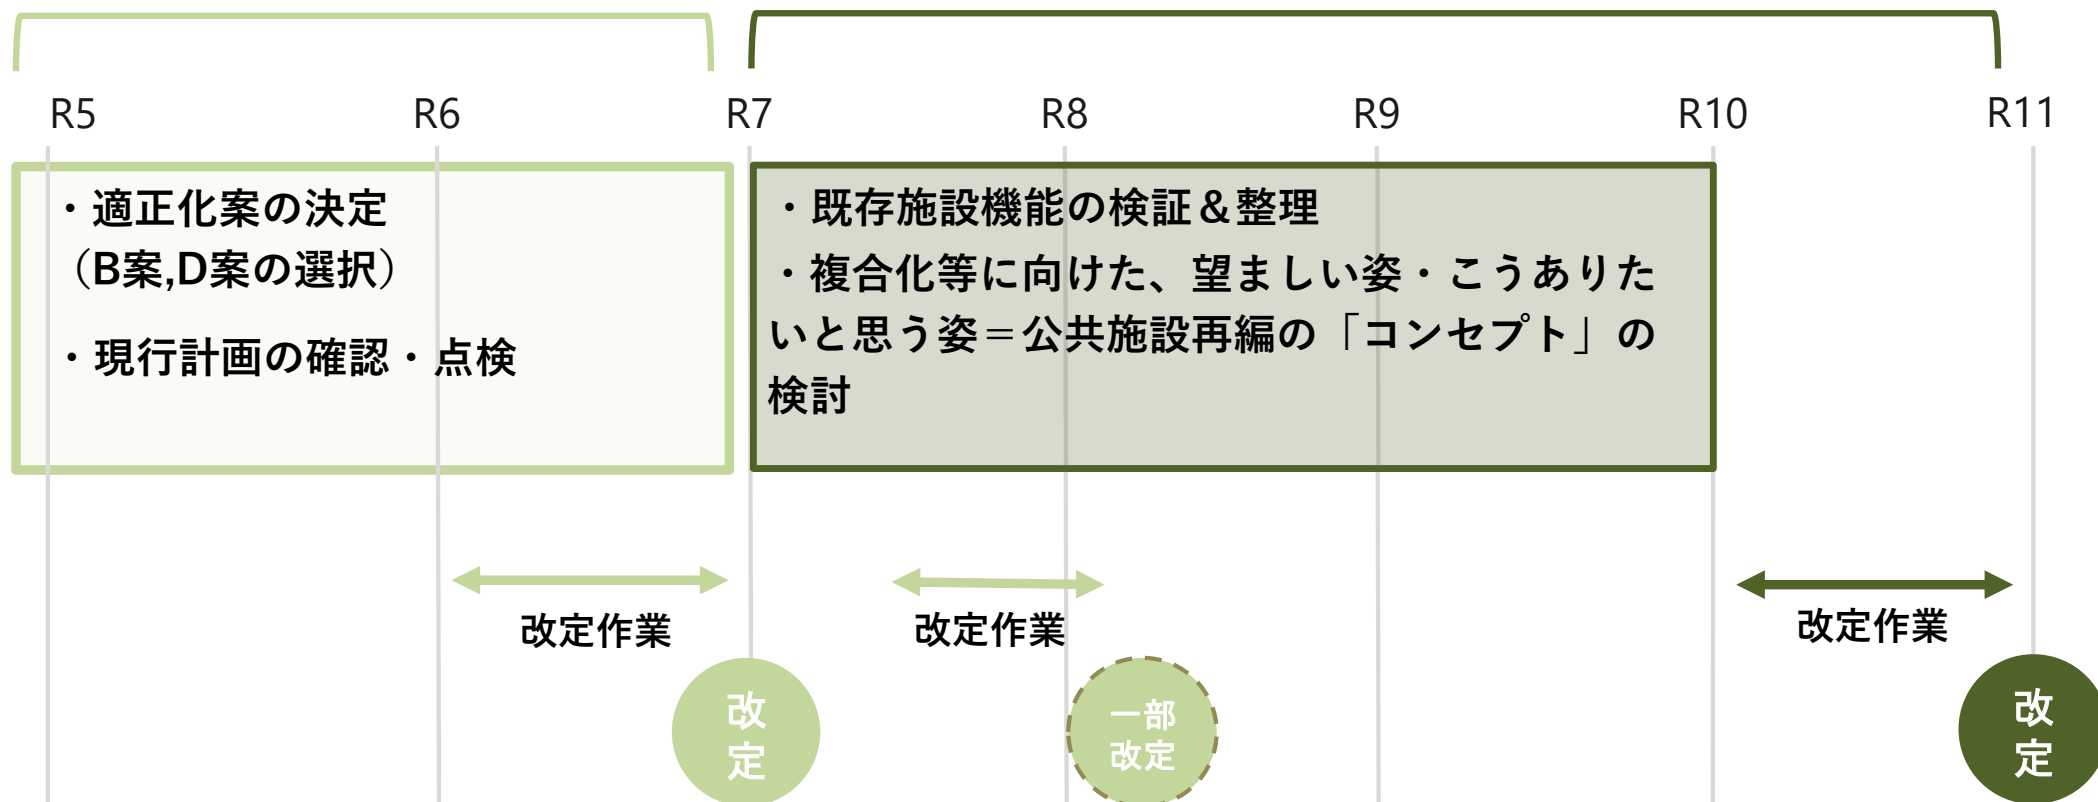

※SSP整備費・学校のエアコン設置費用を反映して、新たな財政シミュレーションの実施。

5. 公共施設再編計画の改定方針

■ 令和11年度改定に向けて、アクションすべき事項

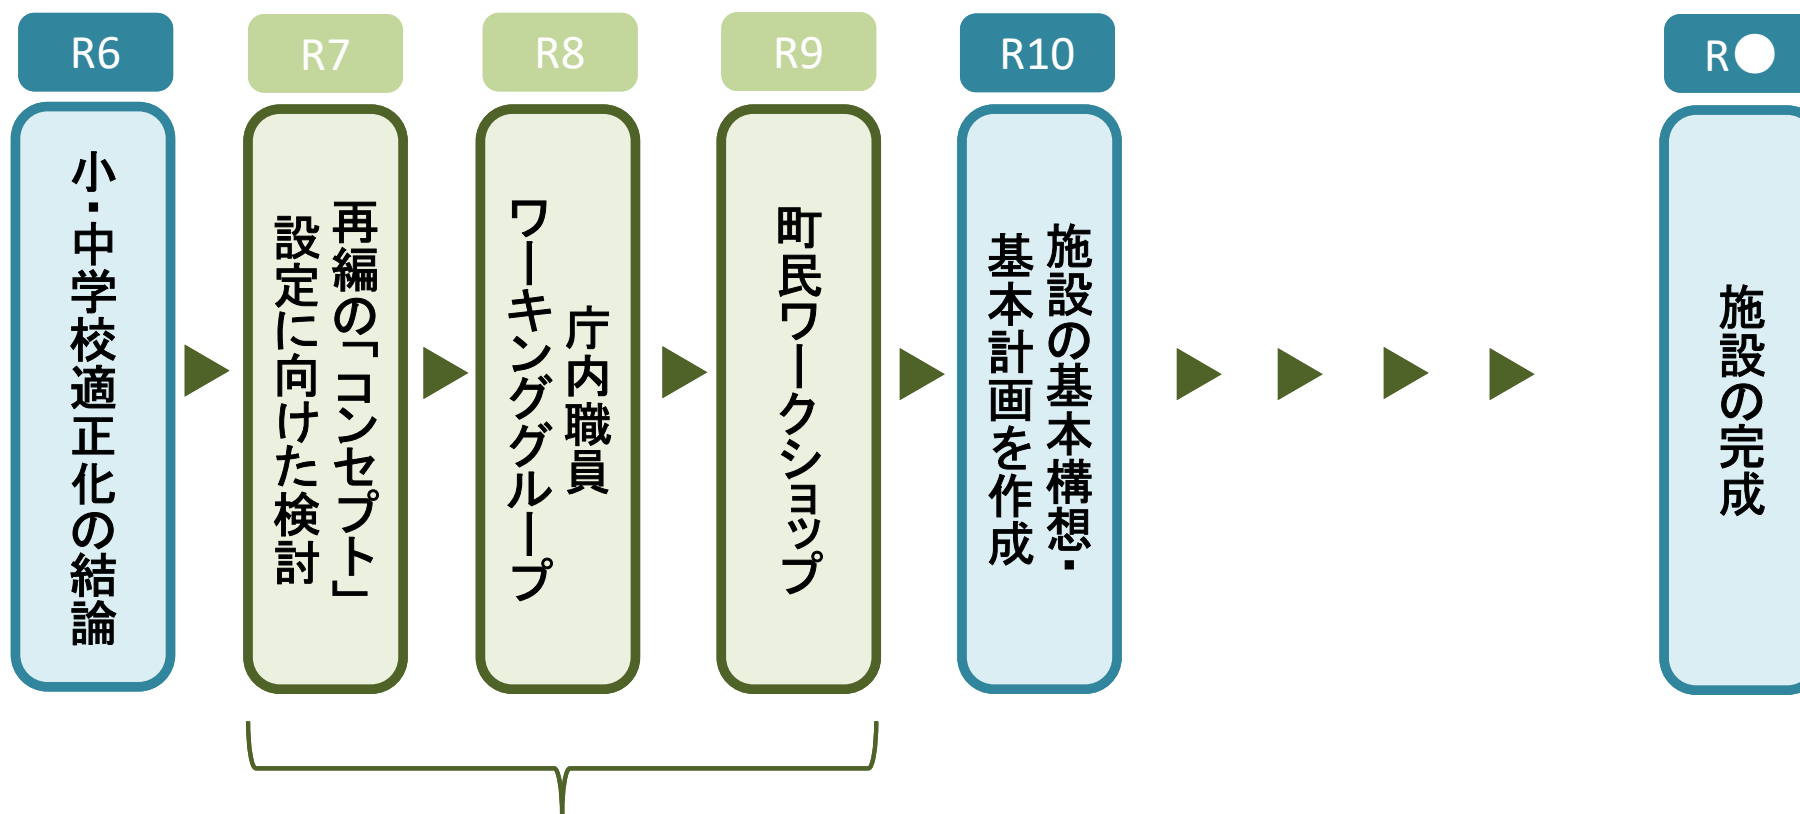

公共施設再編の「コンセプト」を検討 ➡ 公共施設再編計画へ反映

5. 公共施設再編計画の改定方針

庁内職員ワーキンググループ(案) ※令和8年度実施予定

- ◎参加者は施設複合化等に関連する各課の職員
- ◎合計5回／各2～3時間
- ◎建替える学校(6校)ごとのグループを編成
- ◎議論の場にAIを導入して、対話を通して議論を深める

町民ワークショップ(案) ※令和9年度実施予定

- ◎参加者は各エリアに住む住民
- ◎合計2回／各3時間程度
- ◎南・中・北の3エリアに分かれて実施
- ◎議論の場にAIを導入して、対話を通して議論を深める

公共施設再編の
「コンセプト」を考える
