

産後ケア施設改修費等支援補助事業の進捗状況について

1. 産後ケア施設改修費等支援事業補助金の申請状況について

- ・令和7年 6月 町へ補助金交付申請（事業者） 申請件数：1件
事業者：助産院 mamana. house
- ・令和7年 6月 事業者へ交付決定（町） 交付決定額：23,905,000円
- ・令和7年 6月 町へ事業着手届（事業者）
- ・令和7年 7月 国へ母子保健衛生費国庫補助金交付申請（町）
- ・令和7年 9月 町へ変更等承認申請（追加工事が発生したため）（事業者）
- ・令和7年 9月 事業者へ変更等承認通知（町）
- ・令和7年12月 国から交付決定通知受理
- ・令和7年12月 国へ母子保健衛生費国庫補助金変更交付申請（町）
- ・令和8年 1月 町へ変更等承認申請（追加工事が発生したため）（事業者）
*国補助、町補助ともに、総事業費の変更はあるものの、当初の交付申請の段階で基準額の上限であったため、補助額は変更なし。

2. 設置場所・設置形態

設置場所：寒川町一之宮8丁目1577-2

設置形態：建物は2階建木造住宅で、主に2階を産後ケアとして使用予定。

産後ケア事業としては、4部屋（デイと宿泊合わせて）の利用を予定している。

3. 町の予算措置

令和7年度2号補正予算

歳出 負担金、補助及び交付金 産後ケア施設改修費等支援事業補助金

町基準額 31,874,000円に対して補助率 3/4

23,905,000円

歳入 母子保健衛生費国庫補助金を活用

町補助額 23,905,000円に対して国庫補助率 2/3

15,936,000円（国庫補助額）

※国からの交付決定を受け、令和8年3月（令和7年度8号）補正予算において
財源更正

4. 工事の進捗状況について

助産院 mamana. house 新築工事

契約年月 令和7年6月

着工年月 令和7年6月

完成年月 令和8年2月26日

開所年月 令和8年4月（予定）

11月10日時点



2月6日時点



2月26日時点



ダイニング 右：南側窓



洗面脱衣室 左：風呂場へのドア



産後ケア用 洋室1



産後ケア用 洋室2

5. 今後の予定

- | | |
|--------|---|
| 令和8年3月 | 町へ補助金実績報告（事業者） |
| 3月 | 町から補助金を交付するにあたっての建物完了確認（町）
事業者へ額確定通知及び交付手続き（町） |
| 4月 | 助産院 mamana. house （移転後）事業開始 |
| 4月 | 国へ補助金実績報告（町） |

3月23日時点



外 観




ダイニング 右：南側窓



洗面脱衣室 左：風呂場へのドア



産後ケア用 洋室1

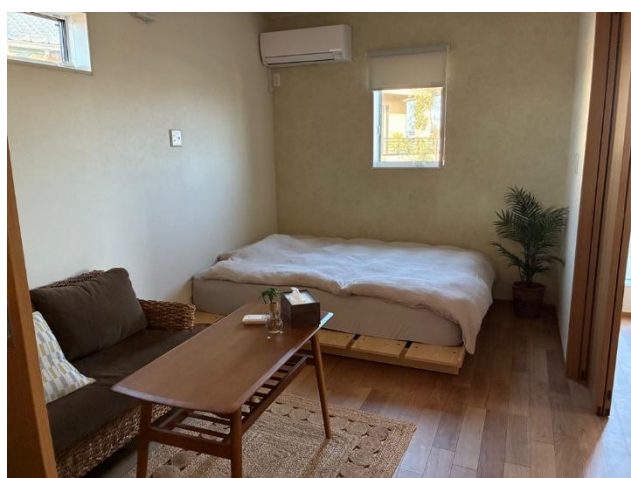

産後ケア用 洋室2
