



寒川町雨水管理総合計画

(令和 8 年度改訂版)

(素案)

令和 8 年 5 月



目 次

1. 目的	1
2. 基礎調査	2
2.1. 地形・地盤高・土地利用状況	2
2.2. 浸水実績及び降雨観測データ	5
2.3. 下水道計画及び雨水整備状況	7
2.4. 放流先河川の状況	9
3. 検討対象区域の設定	10
4. 浸水要因分析と地域ごとの課題整理	11
4.1. 地域（ブロック）分割	11
4.2. 浸水リスクの想定	12
5. 地域ごとの雨水対策目標の検討	16
5.1. 評価指標の設定と評価	16
5.2. 整備目標および対策目標の設定	28
6. 段階的対策方針・計画の検討	30
6.1. 段階的対策方針の設定	30
6.2. 段階的対策計画の検討	33
6.3. 財政計画	38
7. 雨水管理総合計画マップ作成	39
7.1. 雨水管理総合計画マップへの掲載情報の選定	39
7.2. 雨水管理総合計画マップの作成	39

1. 目的

本町では、令和3年度に下水道による浸水対策を実施すべき区域、目標とする整備水準、当面・中期・長期の施設整備の方針等の基本的な事項を定める「雨水管理総合計画」を策定した。しかし、令和3年度に増補改訂された「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）」では、気候変動により将来の降雨量が増加することを考慮し、整備が完了した区域も含めて降雨量の増大に対応できるよう、事前防災の考え方に基づいた整備の必要性が追記されている。そのため、本町においても計画降雨の妥当性を確認する必要がある。また、「雨水管理総合計画」の策定から約5年が経過し、当面の対策が概ね完了して中長期の対策に移行する時期であるが、当初計画から社会情勢や河川 道路整備等、その他事業の進捗状況が変化しているため、中長期対策の妥当性を確認する必要がある。

したがって、気候変動による影響、雨水管理総合計画の進捗状況、時間経過に伴う社会情勢の変化等を確認し、雨水管理総合計画の見直しを行うものである。

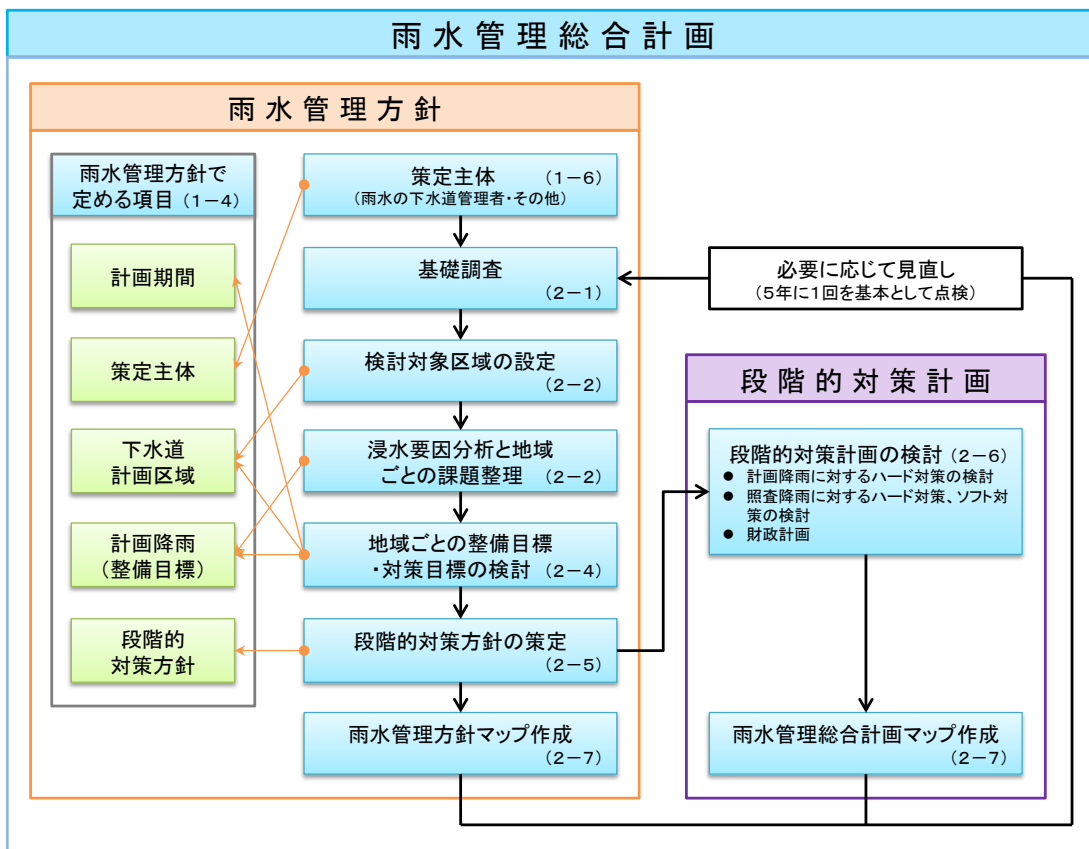


図 1.1 雨水管理総合計画の検討フロー

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）」（令和3年11月、国土交通省）

2.1. 地形・地盤高・土地利用状況

寒川町は、東経 139 度 23 分 4 秒、北緯 35 度 22 分 23 秒に位置しており、首都圏から 50km 圏内にある。

[illegible]

図 2.1 寒川町の地形

(2) 地盤高

標高は約 5～27m、おおむね平坦な地形で、東部は相模野台地の南西部に位置し、そのほかは相模川、小出川及び目久尻川によって形成された沖積低地となっている。台地部分は宅地と畑が大部分を占め、山林はわずかしかない。沖積低地は、水田の割合が多いものの、昭和 30 年代以降の埋め立てにより宅地化された地域もかなりある。

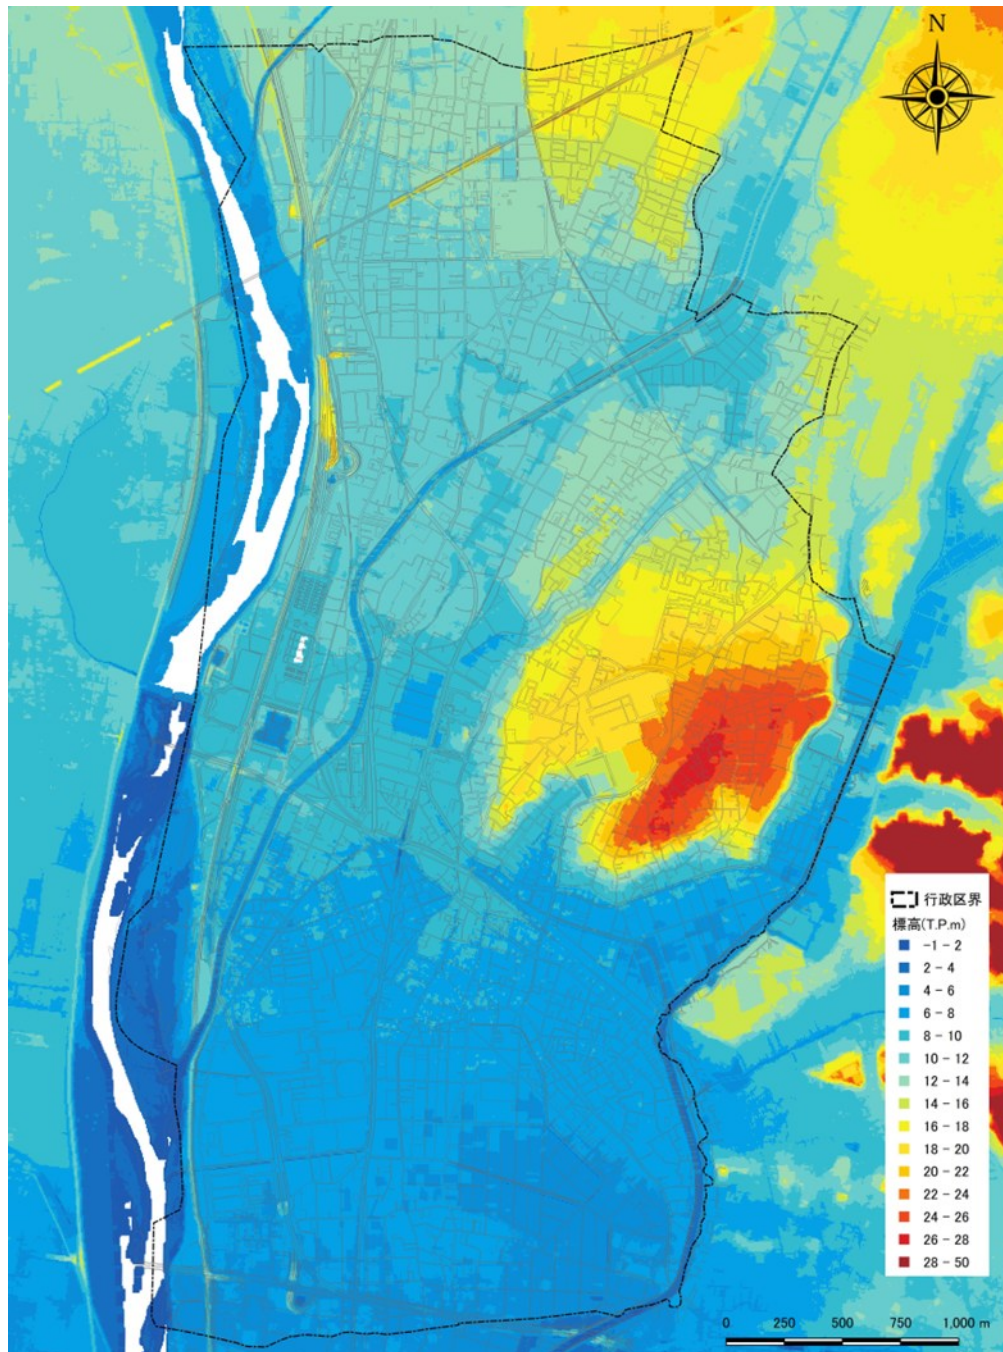


図 2.2 寒川町の地盤高 (5m メッシュ標高)

出典：「基盤地図情報数値標高モデル 5m メッシュ (2024 年 4 月更新)」(国土地理院)

(3) 土地利用

寒川町は、全域が都市計画区域となっており、全体面積 1,342ha のうち約 54%にあたる 723ha が市街化区域（昭和 49 年都市計画決定）、残りの約 46%にあたる 619ha が市街化調整区域となっている。地目別土地利用割合は、住居系が約 24%、工業系が約 13%、商業系が約 3%、道路・鉄道が約 13%である。また、農地のうち約 48%が農業振興地域である。

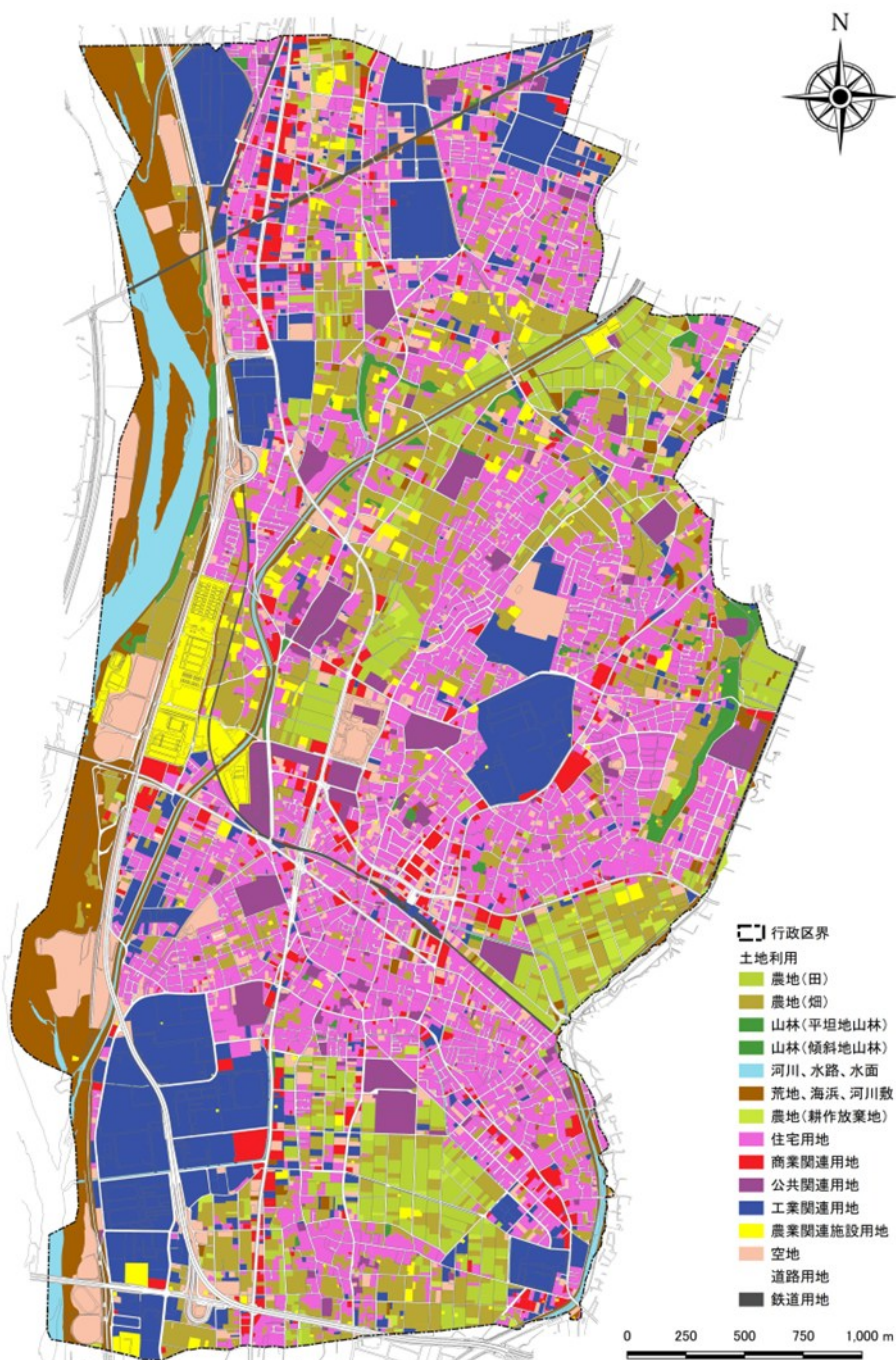


図 2.3 寒川町の土地利用現況：2021 年（令和 3 年）

出典：「令和 2 年度神奈川県都市計画基礎調査(R3) 土地利用現況図」

2.2. 浸水実績及び降雨観測データ

寒川町内における最近 12 年間（2013 年（平成 25 年）～2024 年（令和 6 年））の浸水実績をみると、2014 年（平成 26 年）10 月 6 日における台風 18 号において浸水被害が最も大きく、床上浸水 18 棟、床下浸水 88 棟が確認されている。この時の降雨量は、気象庁の近傍観測所である平塚観測所における 1 時間最大で 72.0mm/h が記録されている。寒川町の現行の雨水計画における 5 年確率降雨強度の 1 時間最大が 50mm/h であることから、降雨強度が下水道施設の排水能力を超えていたことが浸水要因の一つと考えられる。また、台風性特有の長雨かつ総雨量が多いことが起因し、地表面への溢水が増大し、浸水被害が大きくなったとも考えられる。

表 2.1 最近 11 年間（2013 年（平成 25 年）～2024 年（令和 6 年））の浸水被害実績

番号	発生年月日				発生箇所	被害建物棟数				被害建物の延床面積(m2)		備考
	年	月	日			床下	床上			床下	床上	
1	2013	(平成25)	9	15	倉見	11	0	36	3	1,053	0	床上浸水: 0.01m～0.5m未満
					一之宮	4	0			348	0	
					中瀬	20	0			1,592	0	
					岡田	1	0			772	0	
					岡田	0	1			0	95	
					大曲	0	2			0	741	
2	2014	(平成26)	10	6	中瀬	1	0	88	18	344	0	床上浸水: 0.5m～1m未満
					一之宮	1	0			169	0	
					宮山	1	0			90	0	
					倉見	1	1			163	130	
					大曲	6	4			765	1,012	
					岡田	71	8			7,896	746	
					小谷	5	4			482	405	
					小動	2	1			245	92	
3	2016	(平成28)	8	22	中瀬	1	1	0	0	130	0	浸水箇所図なし
4	2018	(平成30)	3	9	倉見	4	4	0	0	200	0	
6	2021	(令和3)	7	3	大蔵	5	5	1	1	-	-	
6	2021	(令和3)	9	18	宮山、倉見、小動	1	1	0	0	-	-	

表 2.2 最近 11 年間（2013 年～2023 年）の浸水被害実績と降雨状況

番号	発生年月日				被害建物棟数		降雨状況(平塚)			
	年	月	日		床下	床上	総雨量 (mm)	継続時間 (分)	10分最大 (mm)	60分最大 (mm)
1	2013	(平成25)	9	15	36	3	172.5	430	13.0	52.5
2	2014	(平成26)	10	6	88	18	353.5	1,810	15.5	70.5
3	2016	(平成28)	8	22	1	0	135.0	690	9.0	37.5
4	2018	(平成30)	3	9	4	0	181.5	1,220	11.0	52.0
5	2021	(令和3)	7	3	5	1	284.5	2,650	10.5	34.5
6	2021	(令和3)	9	18	1	0	152.0	1,750	14.0	44.0

最近 12 年間(平成 25 年～令和 6 年)の浸水被害実績

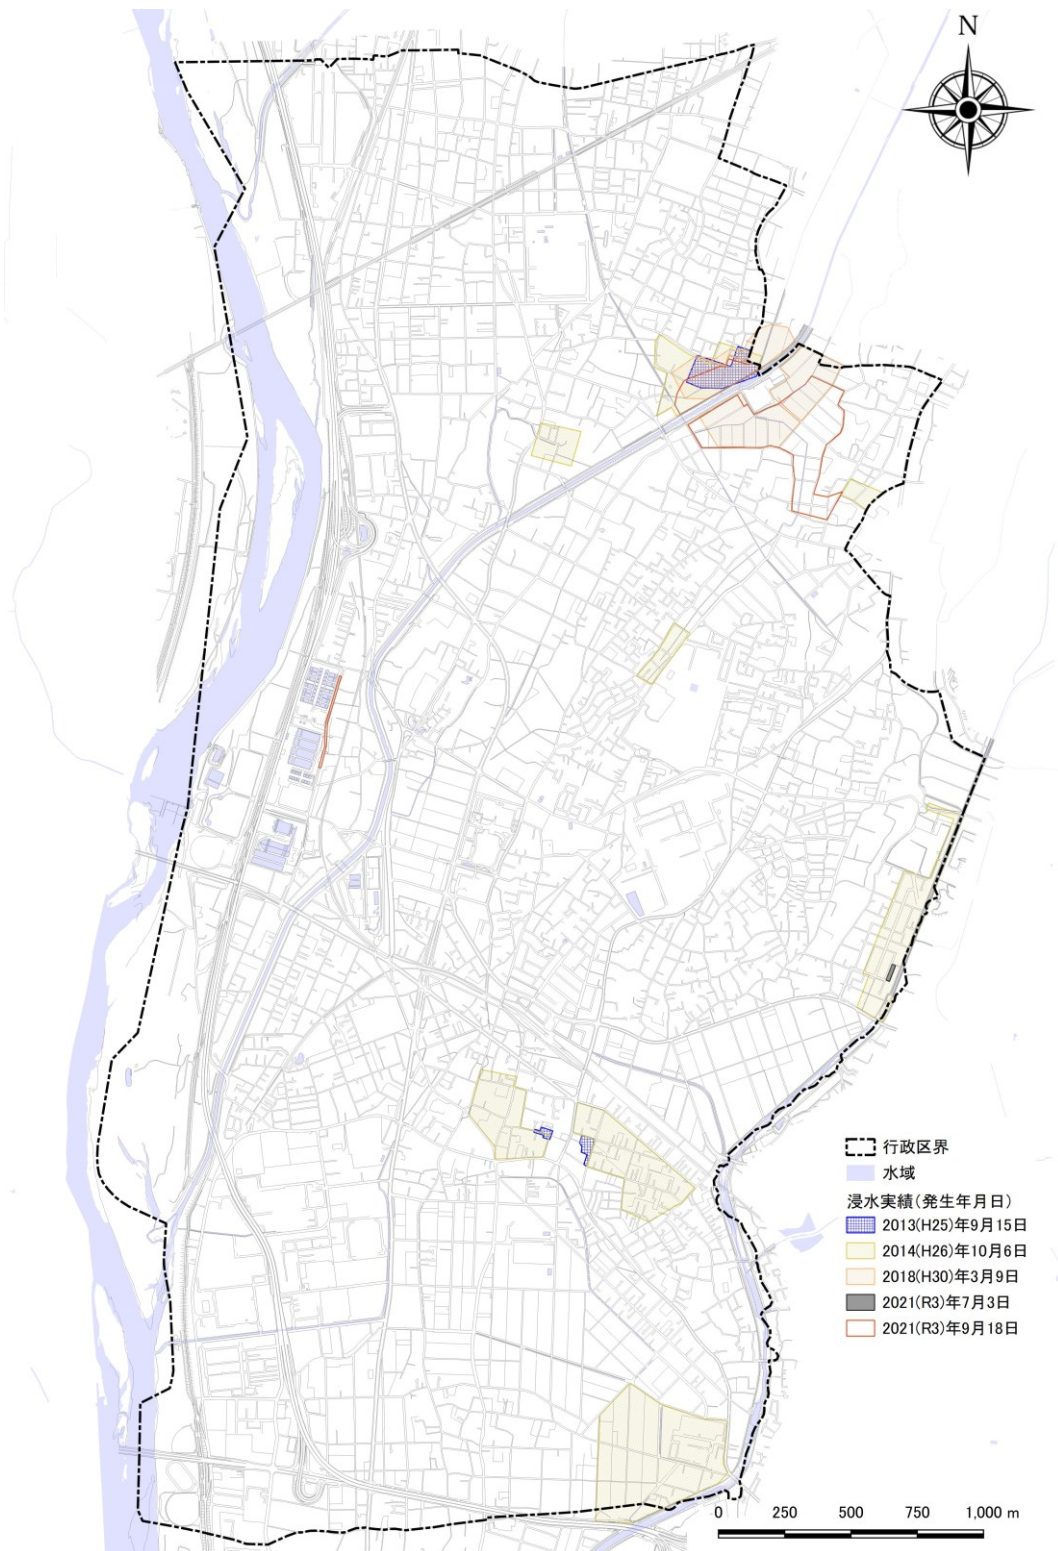


図 2.4 最近 11 年間 (2013 年 (平成 25 年) ～2024 年 (令和 6 年)) の浸水被害実績

2.3. 下水道計画及び雨水整備状況

(1) 計画概要及び雨水整備状況

寒川町の公共下水道は、1969年（昭和44年）に事業認可を受けた相模川流域下水道事業に整合させ、1974年（昭和49年）にほぼ寒川町全体の1,187.5haを全体計画とし、市街化区域698haを都市計画決定した。

それ以降町民の快適な生活環境の実現と、公共用水域の水質保全を図るため、下水道整備を積極的に進め、事業認可区域の拡大を行い、市街化区域における面整備を進めてきた。近年は、人口減少や高齢化による地域社会の構造変革など、下水道を取り巻く環境が大きく変化していることから、長期的な視点で将来を見据え、整備すべき区域の再検討を進め、2011年度（平成23年度）に上位計画の相模川流域下水道全体計画の見直しに伴い、寒川町の全体計画区域を1,130haから923haへ縮小している。

また、市街地の雨水排除のために、8本の都市下水路を都市計画決定し整備を進め、1993年度（平成5年度）には都市下水路を公共下水道の雨水幹線として編入し、その後も幹線管渠の整備を進め、概ね整備が終了したため、現在は浸水箇所解消のため枝線管渠整備を進めている。

(2) 確率降雨強度公式

本町には長期間（20～30年間）にわたる自記降雨記録計による降雨記録がないため、土木学会発行の「下水道雨水流出量に関する研究報告書」により確率時間降雨量分布図及び特性係数分布図をもとに、特性係数法によって確率降雨強度式を算出している。

なお、算出に正確を期するため、本町中心部より約8km北方に位置する神奈川県厚木土木事務所における、1956年（昭和31年）より1975年（昭和50年）に至る約20年間の降雨記録に基づく確率降雨強度式を算出し、比較検討を行った結果、両者の差は僅少であるものの前者がやや大きいため、本計画では、計画上の安全を考慮して、「下水道雨水流出量に関する研究報告書」に基づく式を採用している。

表 2.3 確率降雨強度の比較

区分	式型	10	20	30	40	50	60	80	100
土木学会報告書に基づく方法	$I_5 = \frac{4500}{t+30}$	112.5	90.0	75.0	64.3	56.3	50.0	40.9	30.3
厚木土木事務所の降雨記録に基づく方法	$I_5 = \frac{4320}{t+30}$	108.0	86.4	72.0	61.7	54.0	48.0	39.3	28.8

出典：「相模川流域関連寒川公共下水道事業計画 変更協議書」（令和5年度、寒川町）

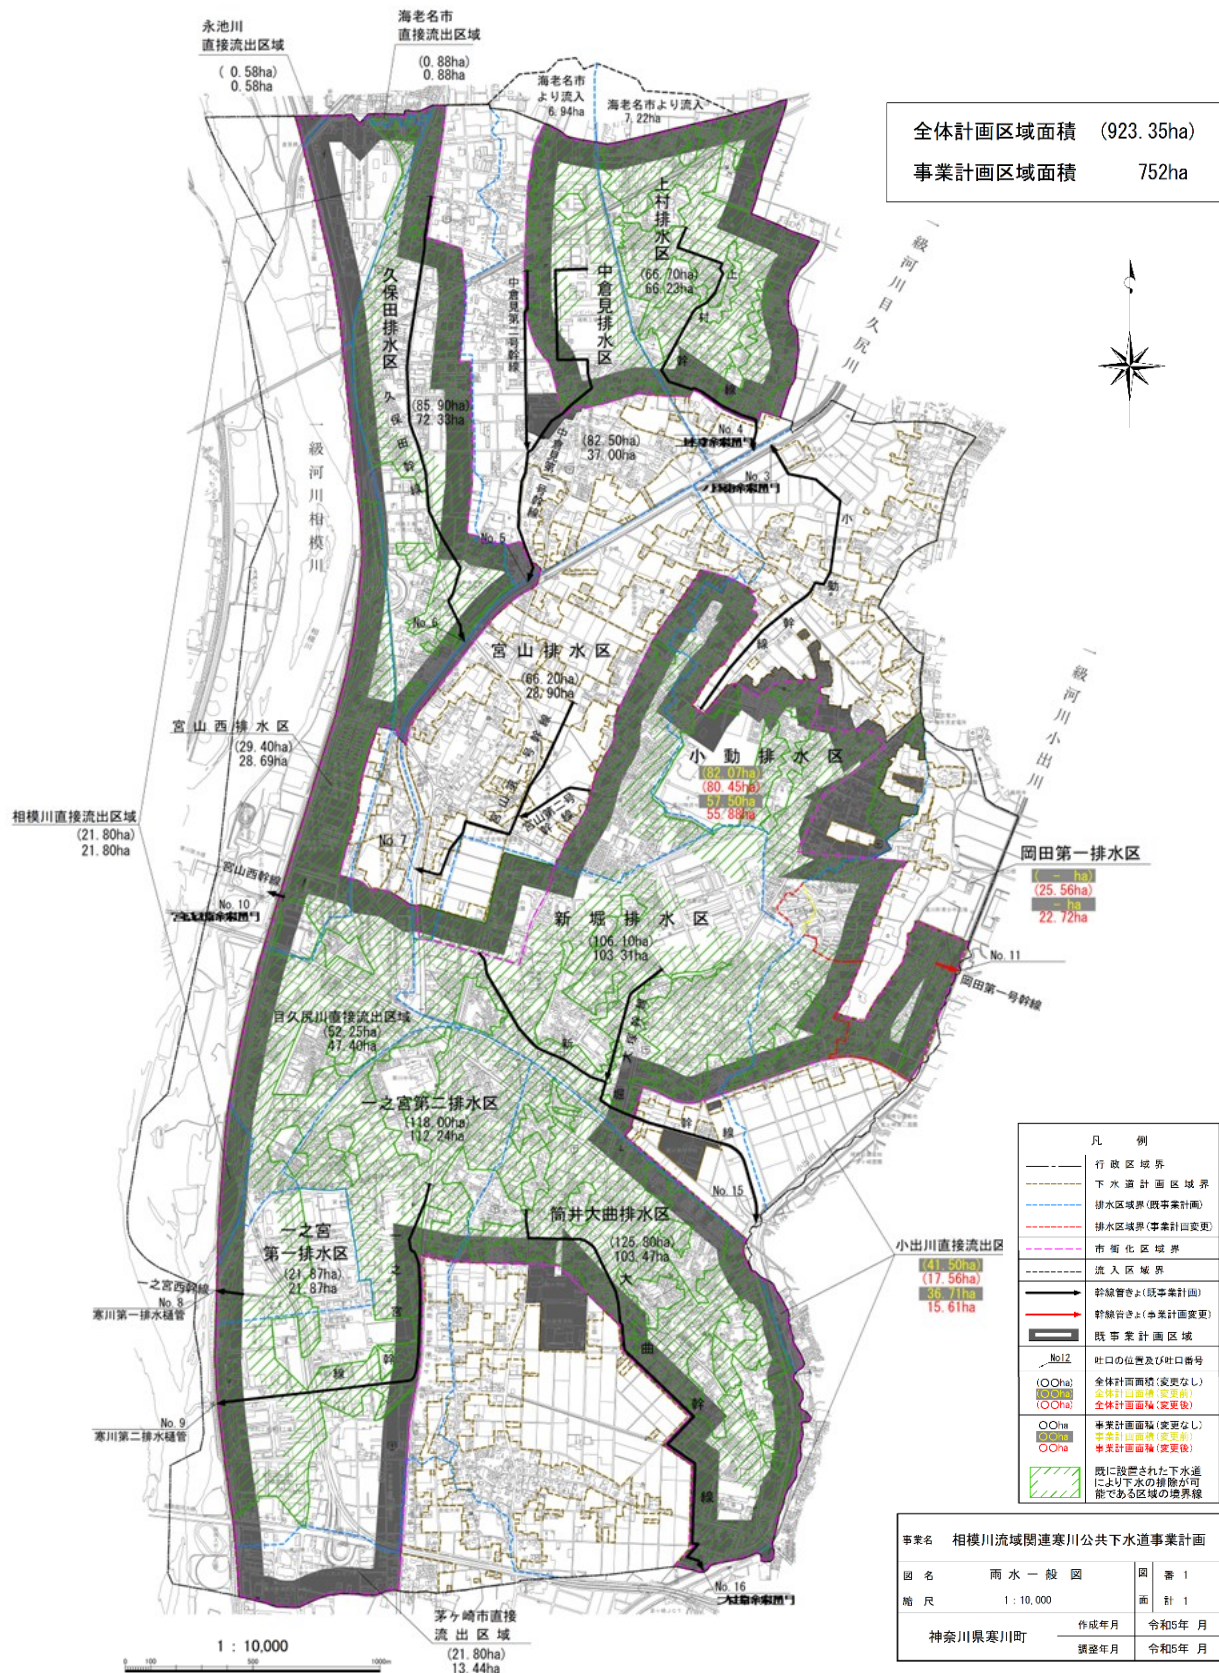


図 2.5 寒川町公共下水道一般図（雨水）

出典：「相模川流域関連寒川公共下水道事業計画 変更協議書」（令和5年度、寒川町）

2. 4. 放流先河川の状況

吐口は全 28 箇所、放流先の河川は、相模川（国管理）、目久尻川（県管理）、小出川（県管理）、永池川（県管理）の 4 河川で全て一級河川である。

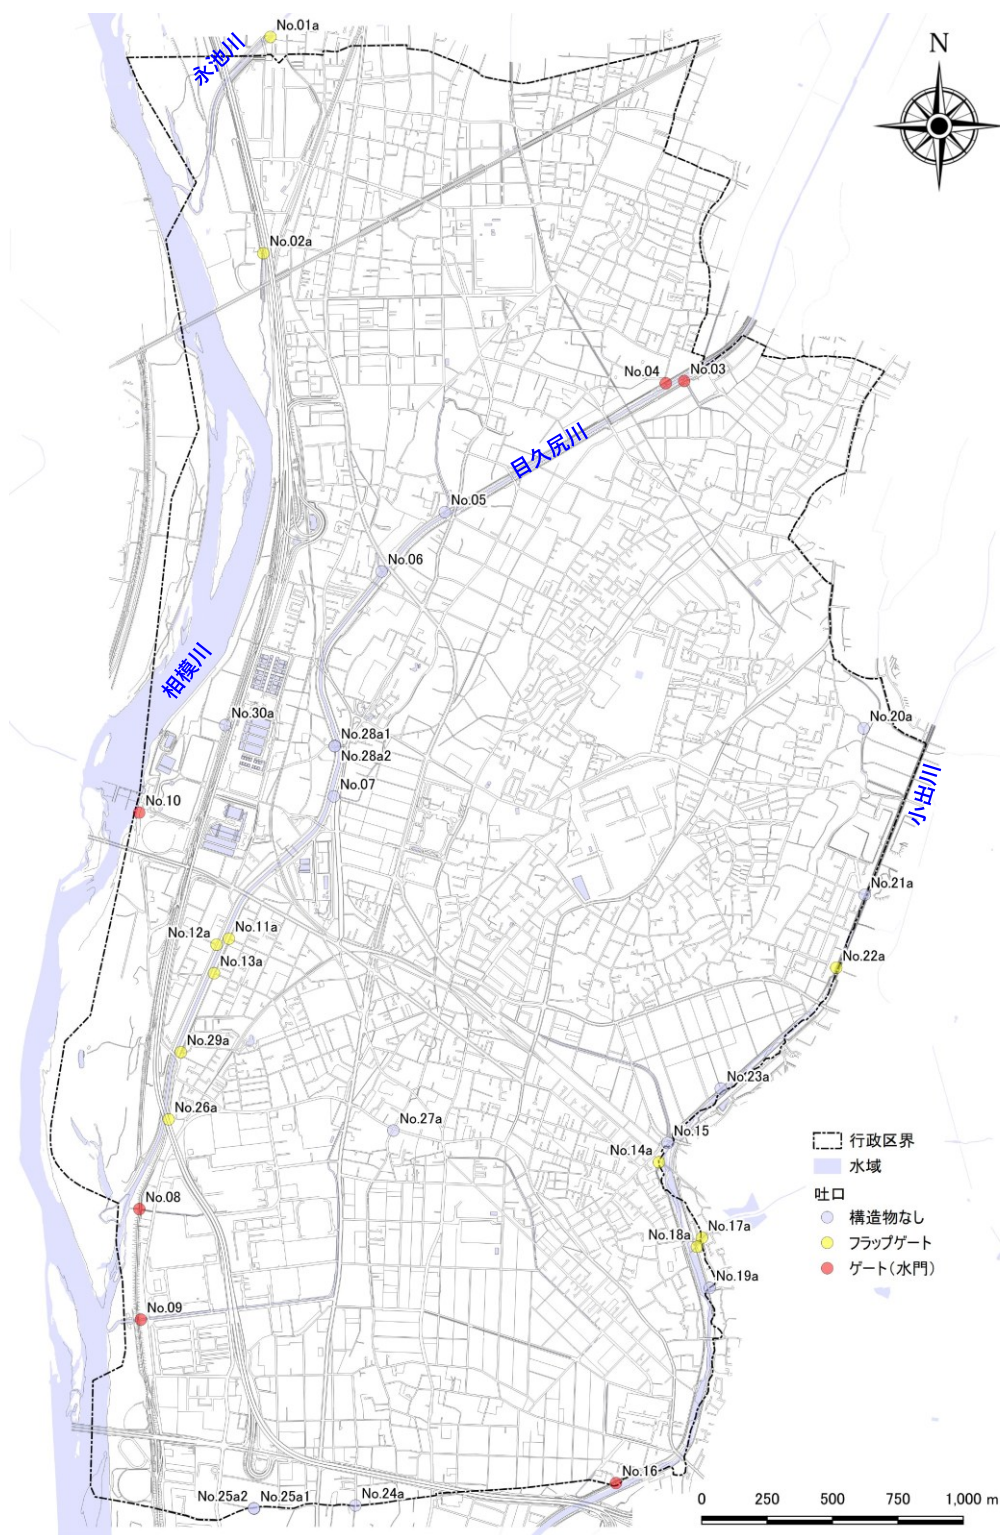


図 2. 6 放流先河川および吐口位置図

3. 検討対象区域の設定

検討対象区域は、下水道計画区域（923ha：市街化区域＋市街化調整区域）を基本とする。ただし、実際には排水区域内において下水道計画区域外からも雨水が流入することから、リスク評価の検討対象区域は、下水道計画区域外を含む、全排水区域とする。

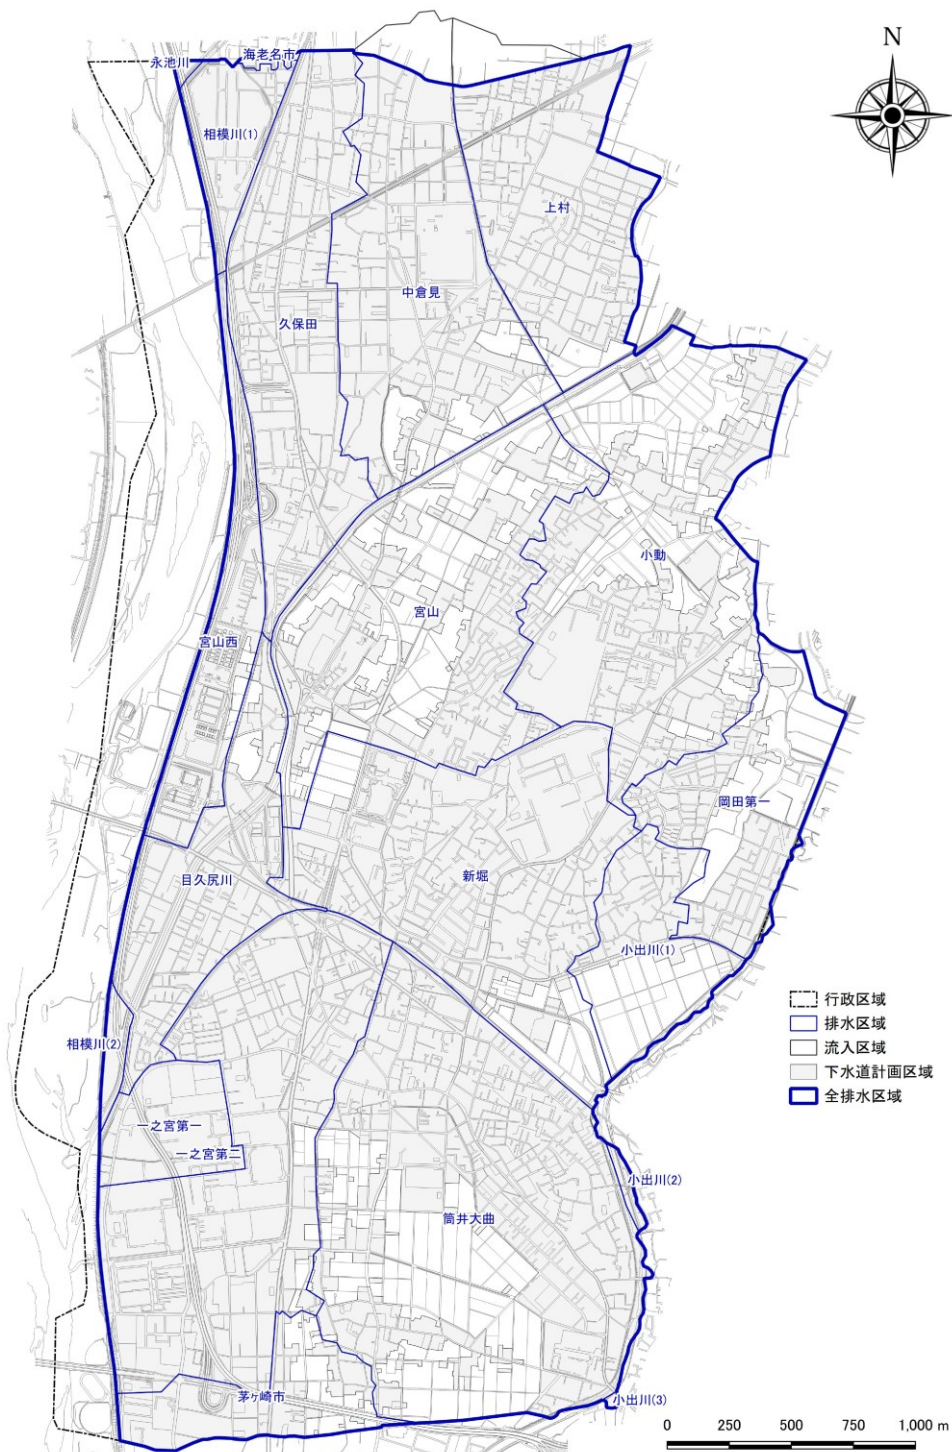


図 3.1 排水区域および用途地域

4. 浸水要因分析と地域ごとの課題整理

4.1. 地域（ブロック）分割

対象とする区域を既定の排水区（下水道計画区域外含む）に基づき、ブロックを分割する。浸水リスクを適切に評価するため、排水区の面積が比較的大きい場合には、さらにエリアを分割した。



図 4.1 ブロック分割

4.2. 浸水リスクの想定

(1) 浸水シミュレーションモデルの構築

現況の排水系統、土地利用を基本として、浸水シミュレーションモデルを構築する。モデルは過年度のモデルを活用し、令和6年度までに施工済み、または施工予定の水路を追加したものとする。



図 4.2 管路網図（流出解析モデルの対象施設）

(2) 浸水シミュレーション

現有施設能力の確認を目的として、計画降雨および既往最大降雨における浸水状況を流出解析モデルで再現し、浸水の要因を分析した。

計画降雨時の管きよの流下能力に対する流出量の割合を図 4.3 に、既往最大降雨時の管きよの流下能力に対する流出量の割合を図 4.4 に示す。

図中の「管きよの流下能力に対する流出量の割合」は、1.0 以下だと管きよの能力があり、1.0 よりも大きいと能力がなしと判断される。その結果、公共下水道として整備した雨水幹線部は能力的に余裕があるものの、公共下水道が未整備の側溝排除区域では、軒並みに流下能力が不足することが明らかとなった。

表 4.1 シミュレーションの条件設定

目的	降雨規模	降雨波形	河川水位	備考
現有施設能力の確認	50mm/h	中央集中型 (24 時間)	なし	計画降雨 (5 年確率)
現有施設能力の確認	72mm/h	平塚地点 (2014 年(平成 26 年) 10 月 6 日)	実績	既往最大 (寒川町)

【計画降雨】

- 下水道の雨水幹線は概ね流下能力あり。
- 下水道の雨水施設が未整備となるエリアでは流下能力不足により、溢水が生じていること、大部分が床下浸水レベル（浸水深＜0.3m）であることから、管路の面整備による対策が効果的と考えられる。
- 具体的には、既事業計画の枝線管路の整備が想定される。

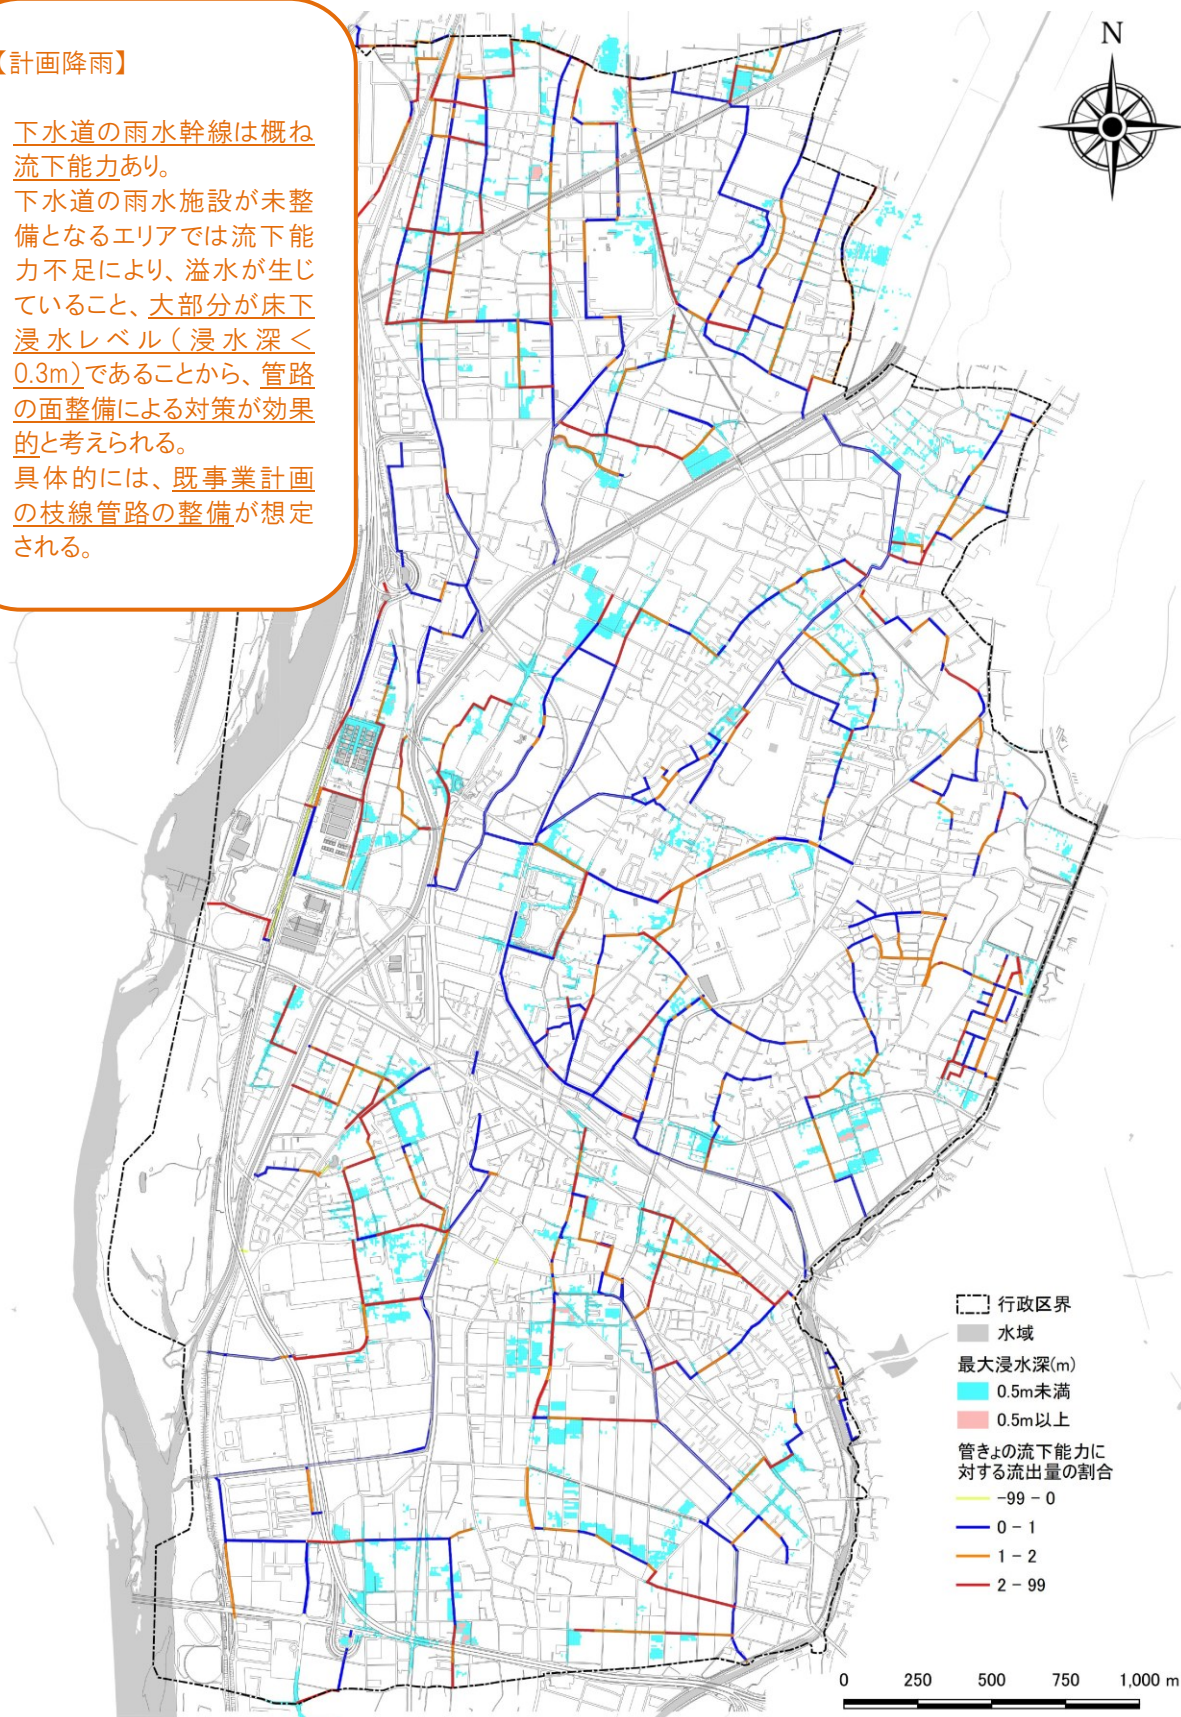


図 4.3 計画降雨時の管きよの流下能力に対する流出量の割合と最大浸水深

【既往最大降雨】

- 計画降雨と比較して、床上浸水レベル(浸水深 $\geq 0.5\text{m}$)の範囲が増大する。
- 先ずは、床上浸水を解消となる対策が重要と考えられる。

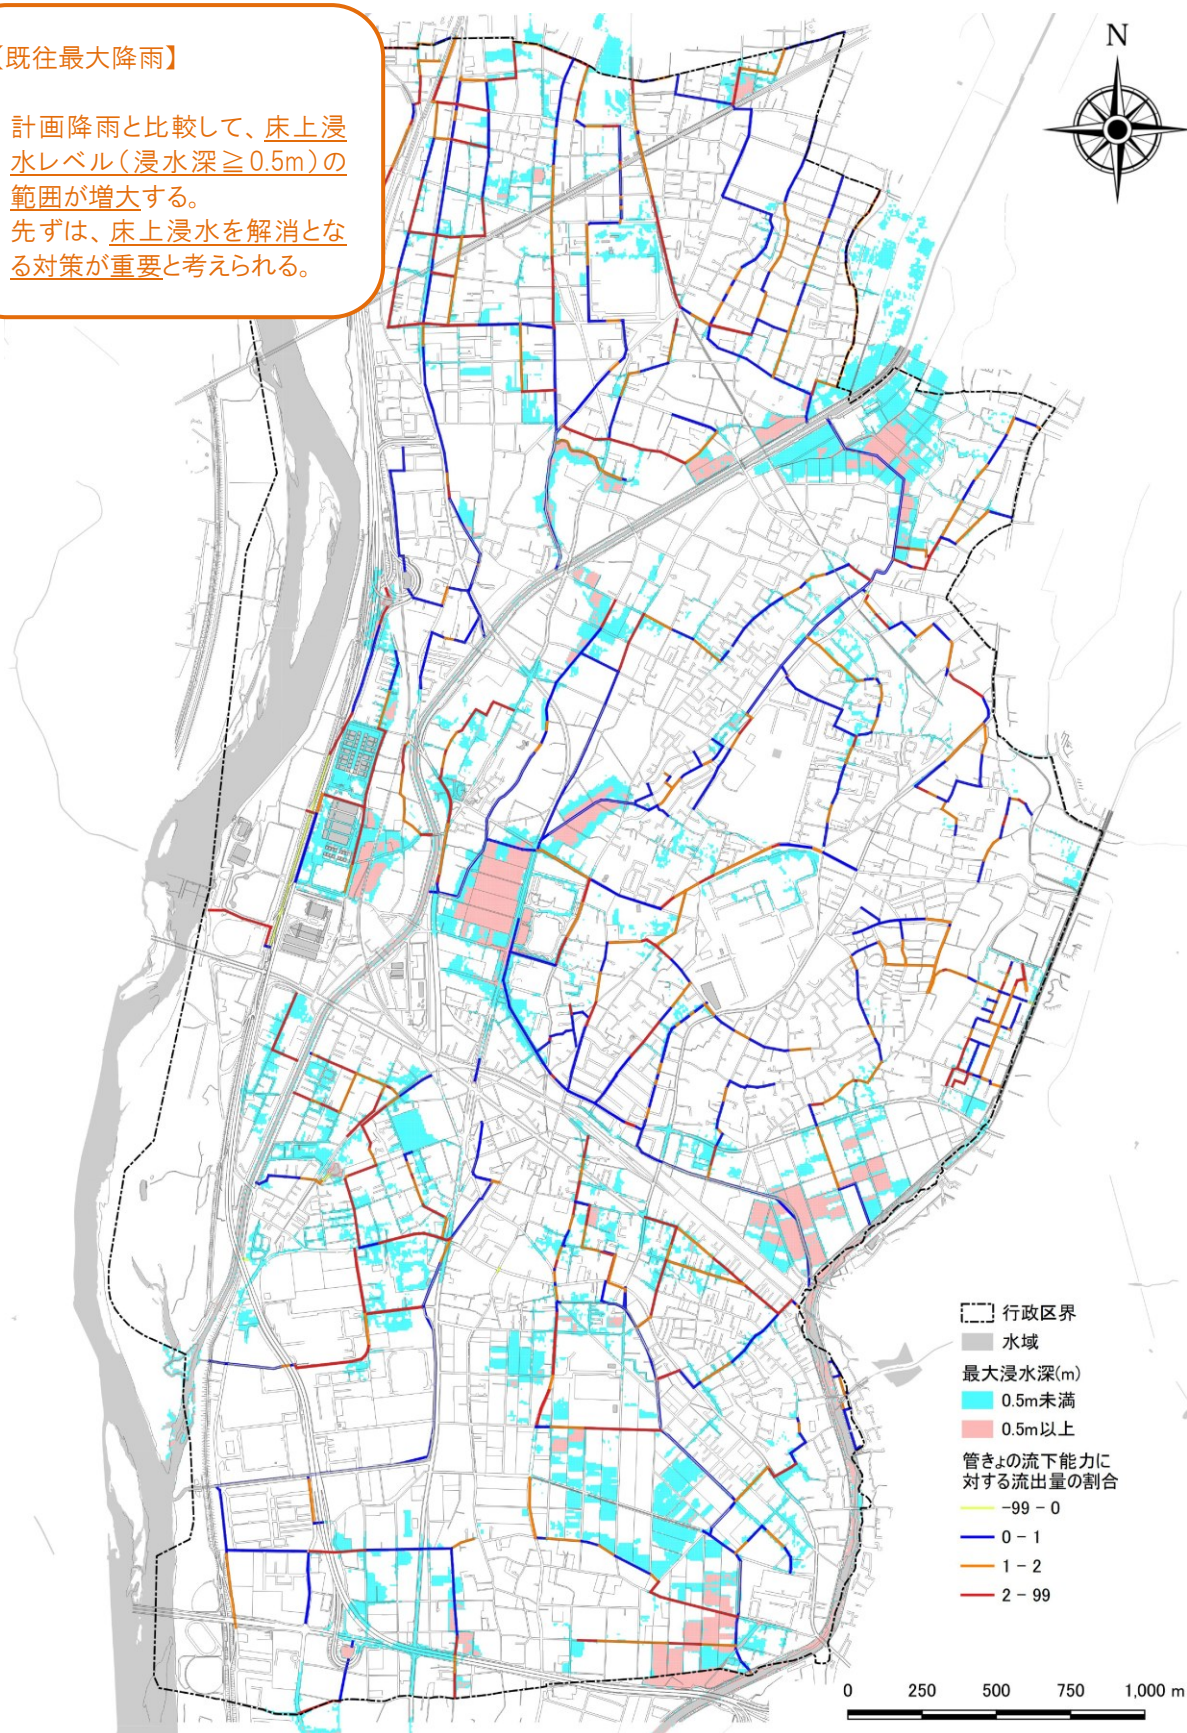


図 4.4 既往最大降雨時の管きよの流下能力に対する流出量の割合と最大浸水深

5. 地域ごとの雨水対策目標の検討

整備目標および対策目標は、浸水リスクや都市機能の集積状況等の評価に応じて細やかに設定する。その際、計画降雨や計画雨水量の設定には気候変動の影響を考慮する。浸水対策を実施すべき区域の設定に際しては、浸水被害の発生状況、浸水リスク、資産・人口の集積状況を考慮する。また、雨水対策を優先的に実施すべき区域を重点化すべきであり、重点対策地区と一般地区等の区域分けについても考慮し、浸水リスクに応じた整備目標を設定する。

5.1. 評価指標の設定と評価

雨水対策目標を定めるための評価指標を設定する。評価指標は、災害（降雨）の規模、土地の浸水のしやすさ、脆弱性を総合的に考慮して浸水リスクを評価できる指標を設定する（例えば、既往最大降雨、浸水量、年平均被害額等）。

評価手法の例としては、「AHP（階層分析法）による方法」や「浸水被害額を計測する方法」を導入した手法があるが、本調査では、客観的、定量的に評価が可能な「浸水被害額を計測する方法」とする。

表 5.1 浸水リスクに係る要素

項目	定義	要素(評価指標)
「Hazards」 (災害の規模) [ハザード]	降雨の規模を示す因子	<u>○降雨の規模</u> - 数百年に一度の大雨 - 数十年に一度の大雨 - 数年に一度の大雨 等
「Exposure」 (土地の浸水しやすさ) [エクスポージャー]	地形や排水施設等の整備状況をふまえた、その土地の浸水のしやすさに関する因子	<u>○地形的な条件</u> - 地形(丘・谷・窪地)と - 標高 等 <u>○雨水排水施設整備状況</u> - 下水道管渠、ポンプ場の排水能力 - 河川の排水能力 - 浸水実績箇所数 等
「Vulnerability」 (脆弱性) [バルネラビリティ]	浸水が発生することに伴う被害の影響度合いに関する因子	<u>○土地利用形態</u> - 都市機能の集積状況 - 資産集積度 等 <u>○建物・施設の脆弱性</u> - 高床化等の実施の有無 - 止水板などの浸水防止 等 <u>○適切な避難行動</u> - 災害時要配慮者数(または施設数) - 防災関連施設 等

出典：「第3回 都市浸水対策に関する検討会」（平成31年3月1日、国土交通省）

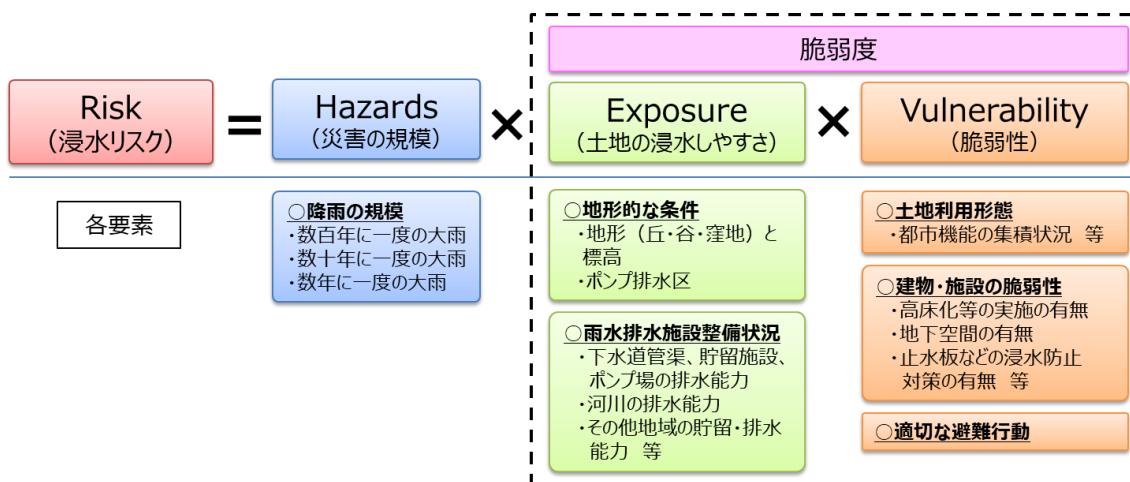


図 5.1 浸水リスクの考え方

出典：「第3回 都市浸水対策に関する検討会」（平成31年3月1日、国土交通省）

表 5.2 AHP（階層分析法）と浸水被害額を計測する方法の対比

	AHP(階層分析法)	浸水被害額を計測する方法
概要	○各指標の重要度に関する評価指標について、一対比較アンケートを全ての項目について行い、地方公共団体独自の重み係数を設定する。	○浸水深別の浸水面積と資産分布特性等により被害額を設定する。
メリット	○主観的価値基準（人それぞれが感覚的にもっている基準）によって最も高い評価の代替案を選択できる。 ○評価基準が複数あり、互いに共通の尺度がない問題を解決できる。	○客観的基準によって優先順位を選択できる。 ○「下水道事業における費用効果分析マニュアル、国土交通省水管理・国土保全局下水道部、平成28年12月」に具体的手順や基礎数値が提示されており、AHPに比べて簡易な方法である。
デメリット	○階層構造をどう作るのが重要であり、結果がそれに左右されるといった、設計者のバイアス（恣意性）が入る恐れがある。 ○指標の設定数によっては一対比較の作業量が膨大となり、意思決定者の負担となる場合がある。	○住民の意見や経験を反映したプロセスとなっていない。 ○被害額に換算できない指標（緊急輸送路の有無 等）を数値化できない。

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）」（平成29年7月、国土交通省）

(1) 評価指標の設定

評価指標は各項目に応じて、下表のように設定する。

表 5.3 評価指標

項目	要素(例)	指標(採用)
「Hazards」 (災害の規模)	○降雨の規模 - 数百年に一度の大雨 - 数十年に一度の大雨 - 数年に一度の大雨 等	「30 年に一度の大雨」 ※ 雨水管理総合計画の策定が目的のため、既往最大降雨を採用。
「Exposure」 (土地の浸水しやすさ)	○地形的な条件 - 地形(丘・谷・窪地)と - 標高 等 ○雨水排水施設整備状況 - 下水道管渠、ポンプ場の排水能力 - 河川の排水能力 - 浸水実績箇所数 等	現況施設における既往最大降雨時の「 <u>浸水量</u> 」 ※ 浸水量は、地形的条件、施設整備状況を反映した結果のため。
「Vulnerability」 (脆弱性)	○土地利用形態 - 都市機能の集積状況 - 資産集積度 等 ○建物・施設の脆弱性 - 高床化等の実施の有無 - 止水板などの浸水防止 等 ○適切な避難行動 - 災害時要配慮者数(または施設数) - 防災関連施設 等	現況施設における「 <u>1 年平均被害額</u> 」(被害の起こりやすさ) ※ 浸水被害額は、都市機能の集積状況や資産集積度を反映した結果のため。

(2) 条件の設定

年平均被害額を算定するには、下水道の計画期間や管きよの耐用年数から、30 年～50 年確率の降雨確率年を扱うことになるため、10 分間および 60 分間降雨の情報を 50 年以上有する観測地点が望ましい。

平塚、辻堂、海老名の統計期間は 10 年間程度であり、1/30 年、1/50 年確率の降雨強度式を推定するには不適と考えられる。統計期間が 50 年間以上有する観測地点で、寒川町近傍となると横浜地方気象台となることから、浸水リスクの推定にあたり、降雨の確率年は横浜地方気象台の降雨情報を用いて設定する。

具体的には、現状における安全度を被害ゼロ（確率年 1.01 年で被害ゼロと仮定）とし、最近 50 年間の雨量情報から推定される降雨確率年で 2.75 年、20.3 年、50 年を設定する。

なお、河川水位は降雨規模に応じて、実績ベースや HWL 相当を設定する。流出係数は現況ベースとする。

表 5.4 浸水リスク推定にあたっての条件設定

降雨 No.	対象降雨			河川 水位	流出 係数	備考
	降雨規模	降雨波形	確率年 (横浜)			
0	40.4mm/h	—	1.01 年	—	—	浸水被害実績では 37.5mm/h で床下 1 件
1	50.0mm/h	中央集中型 (24 時間)	2.75 年	なし	現況	計画降雨 (5 年確率)
2	72.0mm/h	平塚地点 2014 年 10 月 6 日 の一部波形引き伸ばし	20.30 年	実績	現況	既往最大 (寒川町)
3	82.3mm/h	平塚地点 2014 年 10 月 6 日 の波形引き伸ばし	50.00 年	HWL 相当	現況	

また、床上浸水と床下浸水の判断は、浸水深 50cm 以上を床上浸水とし、50cm 未満を床下浸水とする。なお、浸水深 5cm 以上から浸水と判断する。

(3) 浸水状況の推定

降雨 No.1、2、3 の 3 ケースについて、25m×25m メッシュ別に最大浸水深を推定し、床上・床下浸水の浸水状況および浸水量を整理する。

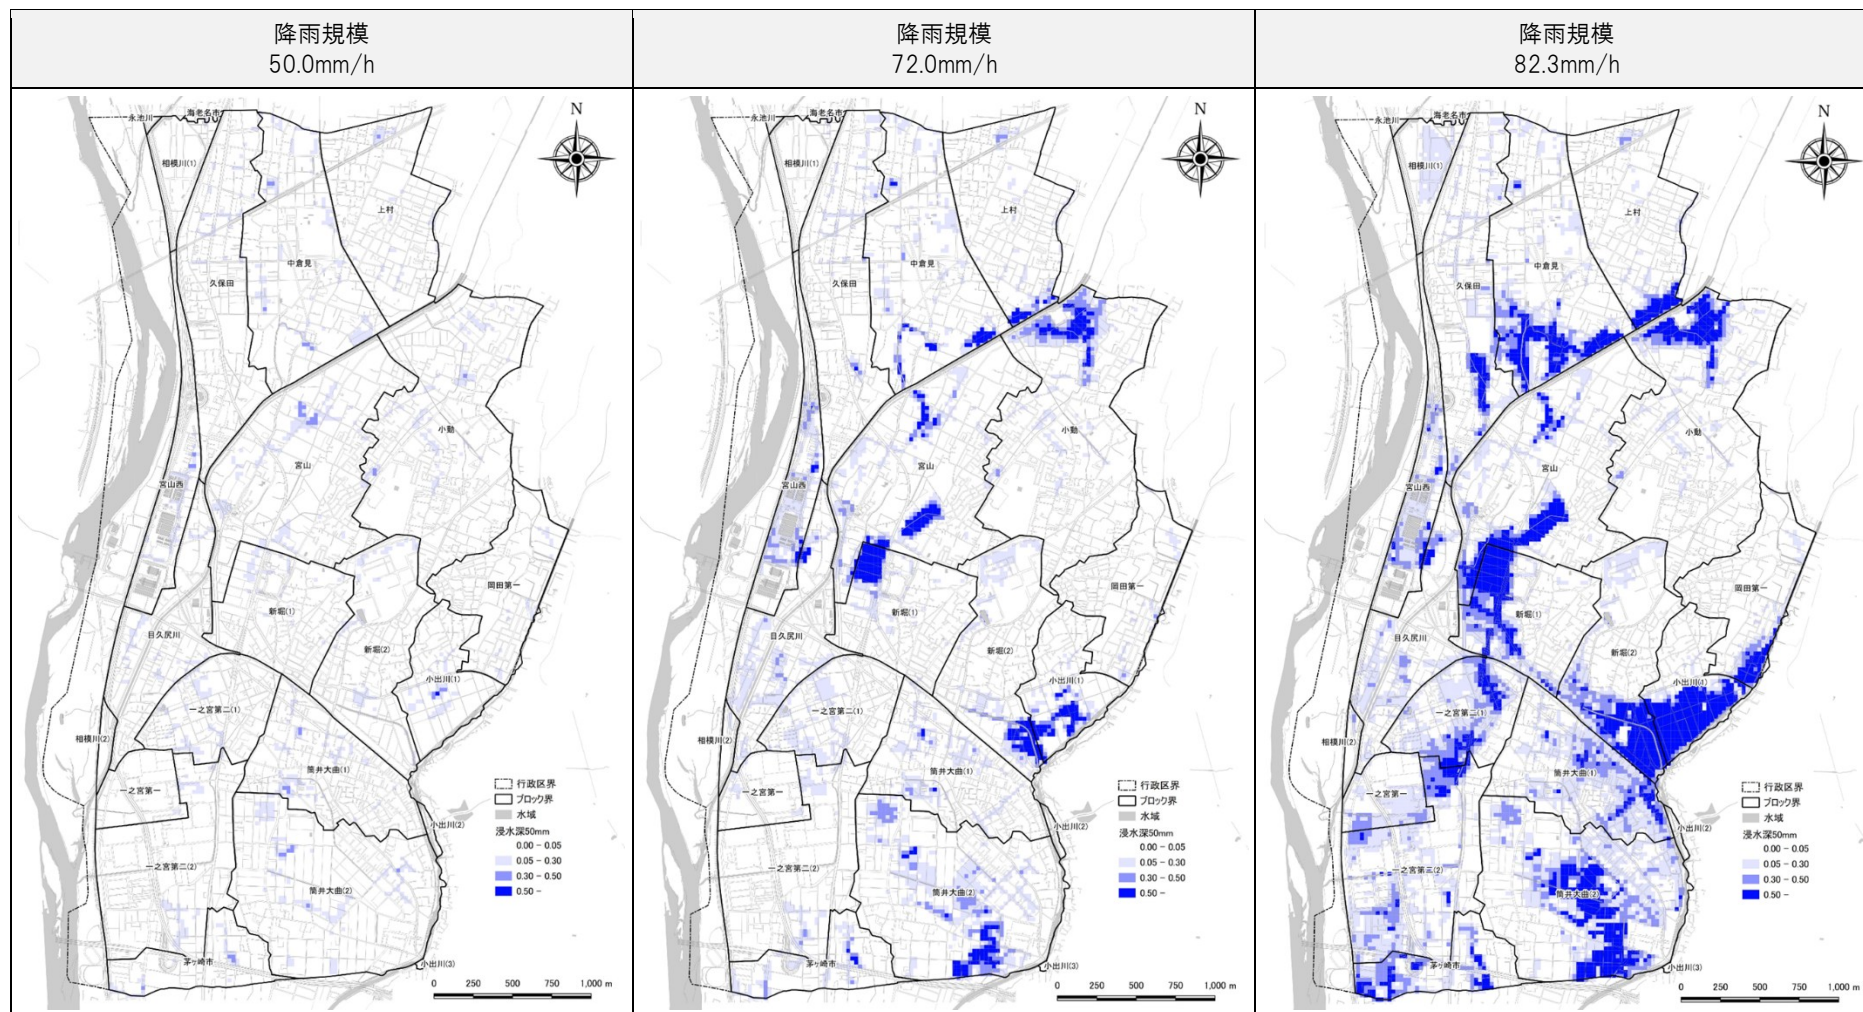


図 5.2 浸水シミュレーションモデルによる 25m メッシュ単位の最大浸水深

(4) 被害額の推定

浸水が発生することに伴う被害の影響度合いに関する因子を把握するため、地域（ブロック）ごとの年平均被害額を算定する。

年平均被害額の算定にあたっては、「下水道事業における費用効果分析マニュアル」（令和5年9月、国土交通省）の手法を用いる。

① 算定項目と基礎数量の設定

被害額の算定にあたっては、国等の公的機関から入手可能な床面積、住居数、世帯数、人口、事業所数等の情報から設定できる項目を選定した（次頁参照）。また、空間的な集計単位は25m×25mメッシュとした。

表 5.5 被害額の算定項目と算定方法

項 目			算 定 式
直接被害	家屋被害		浸水床面積×家屋1m2当たり評価額×被害率
	家庭用品被害		浸水世帯数×1世帯当たり家庭用品評価額×被害率
	事業所被害		浸水事業所従業者数×従業者1人当たり償却資産評価額及び在庫資産評価額×被害率
	自動車被害		浸水自動車数×1台当たり評価額×被害率
	公共土木施設等被害		一般資産被害額×公共土木施設等被害の一般資産被害額に対する比率
	人身被害		—
	農漁家被害		浸水農漁家世帯数×1世帯当たり償却資産評価額及び在庫資産評価額×被害率
	農作物資産被害		浸水水田・畑面積×平年収量×農作物価格
間接被害	稼動被害	家計	—
		事業所	浸水事業所従業者数×営業停止・停滞日数×付加価値額
		公共・公益サービス	—
	応急対策費用	家計	浸水世帯数×労働対価評価額×清掃日数
		事業所	浸水事業所数×代替活動等支出負担単価
		国・地方公共団体	浸水面積×単位面積当たりの公的費用
	交通途絶被害	自動車	時間損失＋距離損失
		鉄道	鉄道停止本数×鉄道1本当たりの車両数×鉄道1車両当たり平均乗車人数×鉄道停止時間×時間価値原単位
	ライフライン切断による波及被害		—
	営業停止波及被害		—
	精神的被害	資産被害に伴う	浸水世帯数×1世帯当たり精神被害評価額または、 浸水地区人口×1人当たり精神被害評価額
		稼動被害に伴う	浸水時間走行台数×浸水時間×精神的損失原単位
		人身被害に伴う	—
		事後的被害に伴う	—
波及被害に伴う		—	
リスクプレミアム		—	

 ： 今回対象とした算定項目

表 5.6 基礎情報の出典

基礎情報	入手先	出力項目	備考
床面積	基盤地図情報 縮尺レベル 2500 (2024 年)	建物面積 建物数	建築物
事業所数	政府統計の総合窓口 (e-Stat) 統計 GIS 経済センサス-基礎調査 (2014 年)	事業所数	4 次メッシュ (500m)
世帯数・人口	政府統計の総合窓口 (e-Stat) 統計 GIS 国勢調査 (2020 年)	世帯総数 人口総数	5 次メッシュ (250m)
事業所数 従業者数	2023 統計さむかわデータベース、寒川町 統計値は令和 3 年 6 月 1 日現在 寒川 HP 確認日：令和 7 年 9 月 18 日	事業所数 従業者数	産業大分類別

② 資産額および被害額の推定

「下水道事業における費用効果分析マニュアル」の方法に準じて、項目ごと、ブロックごとに資産額を推定し、床上・床下ごとの 1ha あたりの被害額を推定した。

なお、「2023 統計さむかわデータベース、寒川町」における最新の基準日が令和 3 年 6 月 1 日のため、資産額の推定にあたっては令和 5 年を基準年とした。

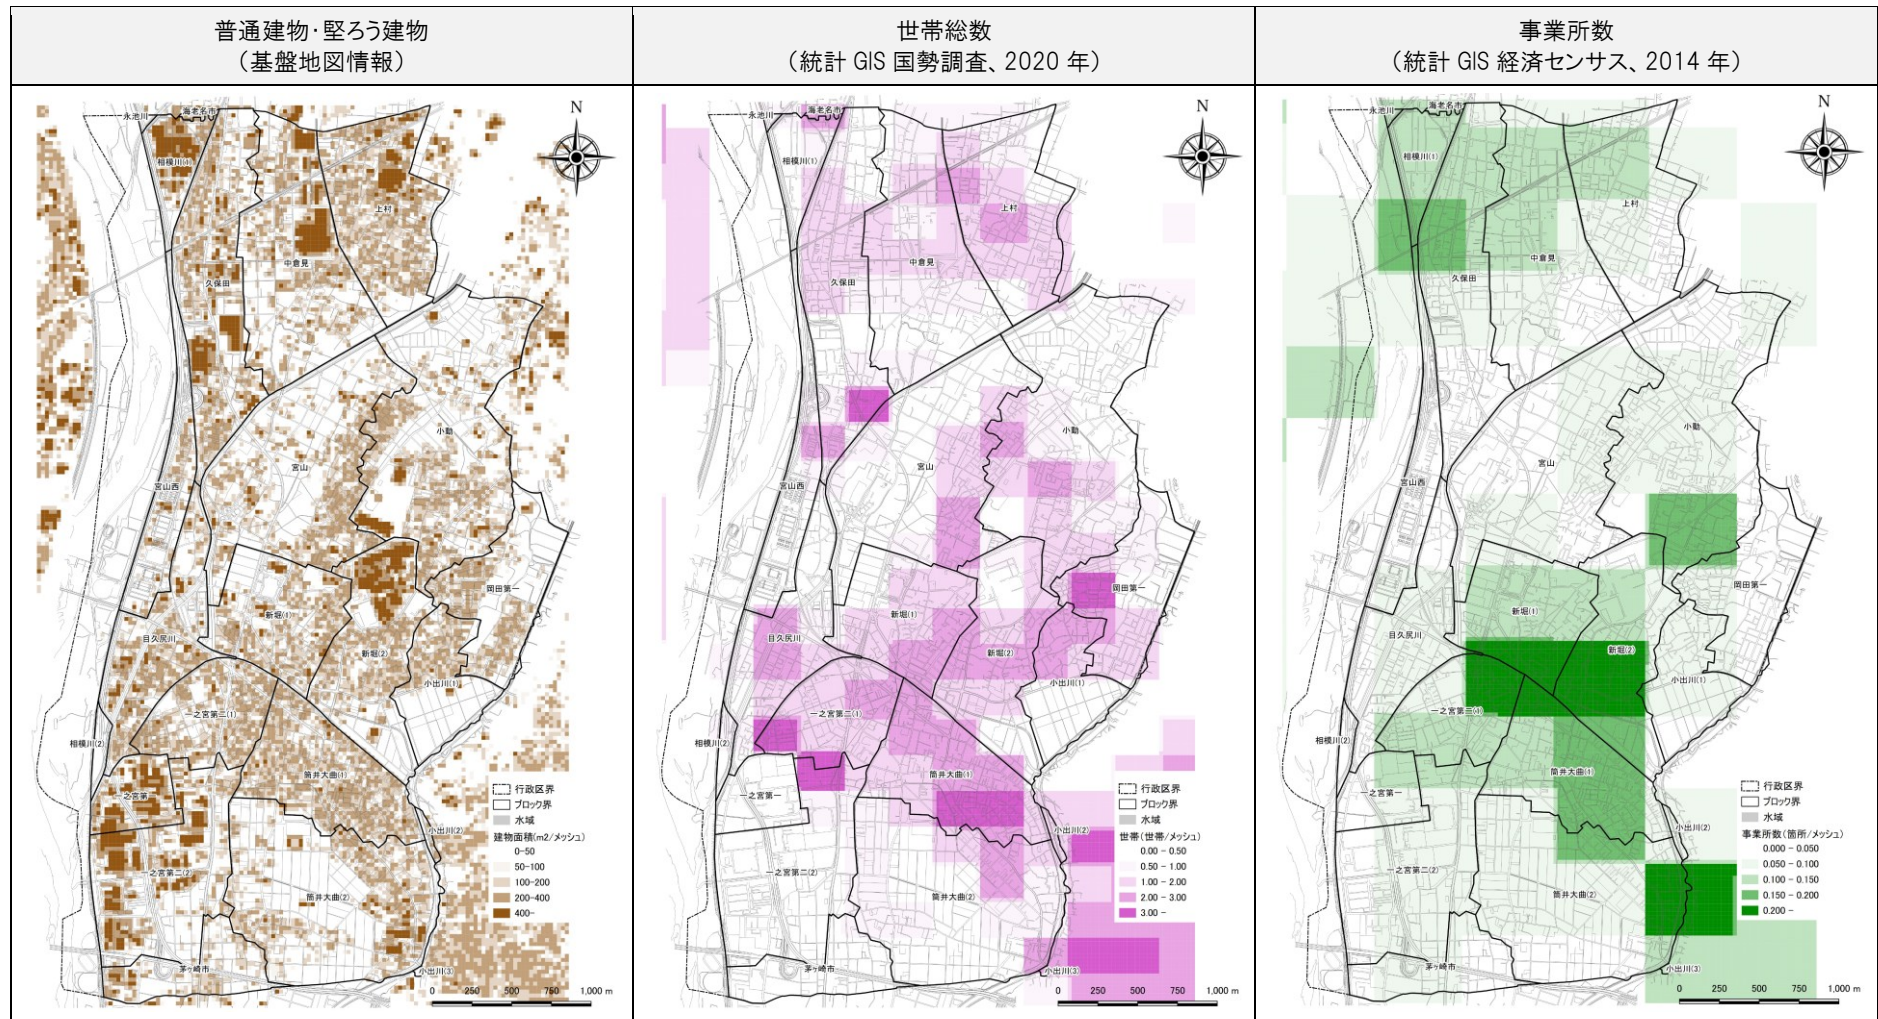


図 5.3 25m メッシュ単位の基礎情報

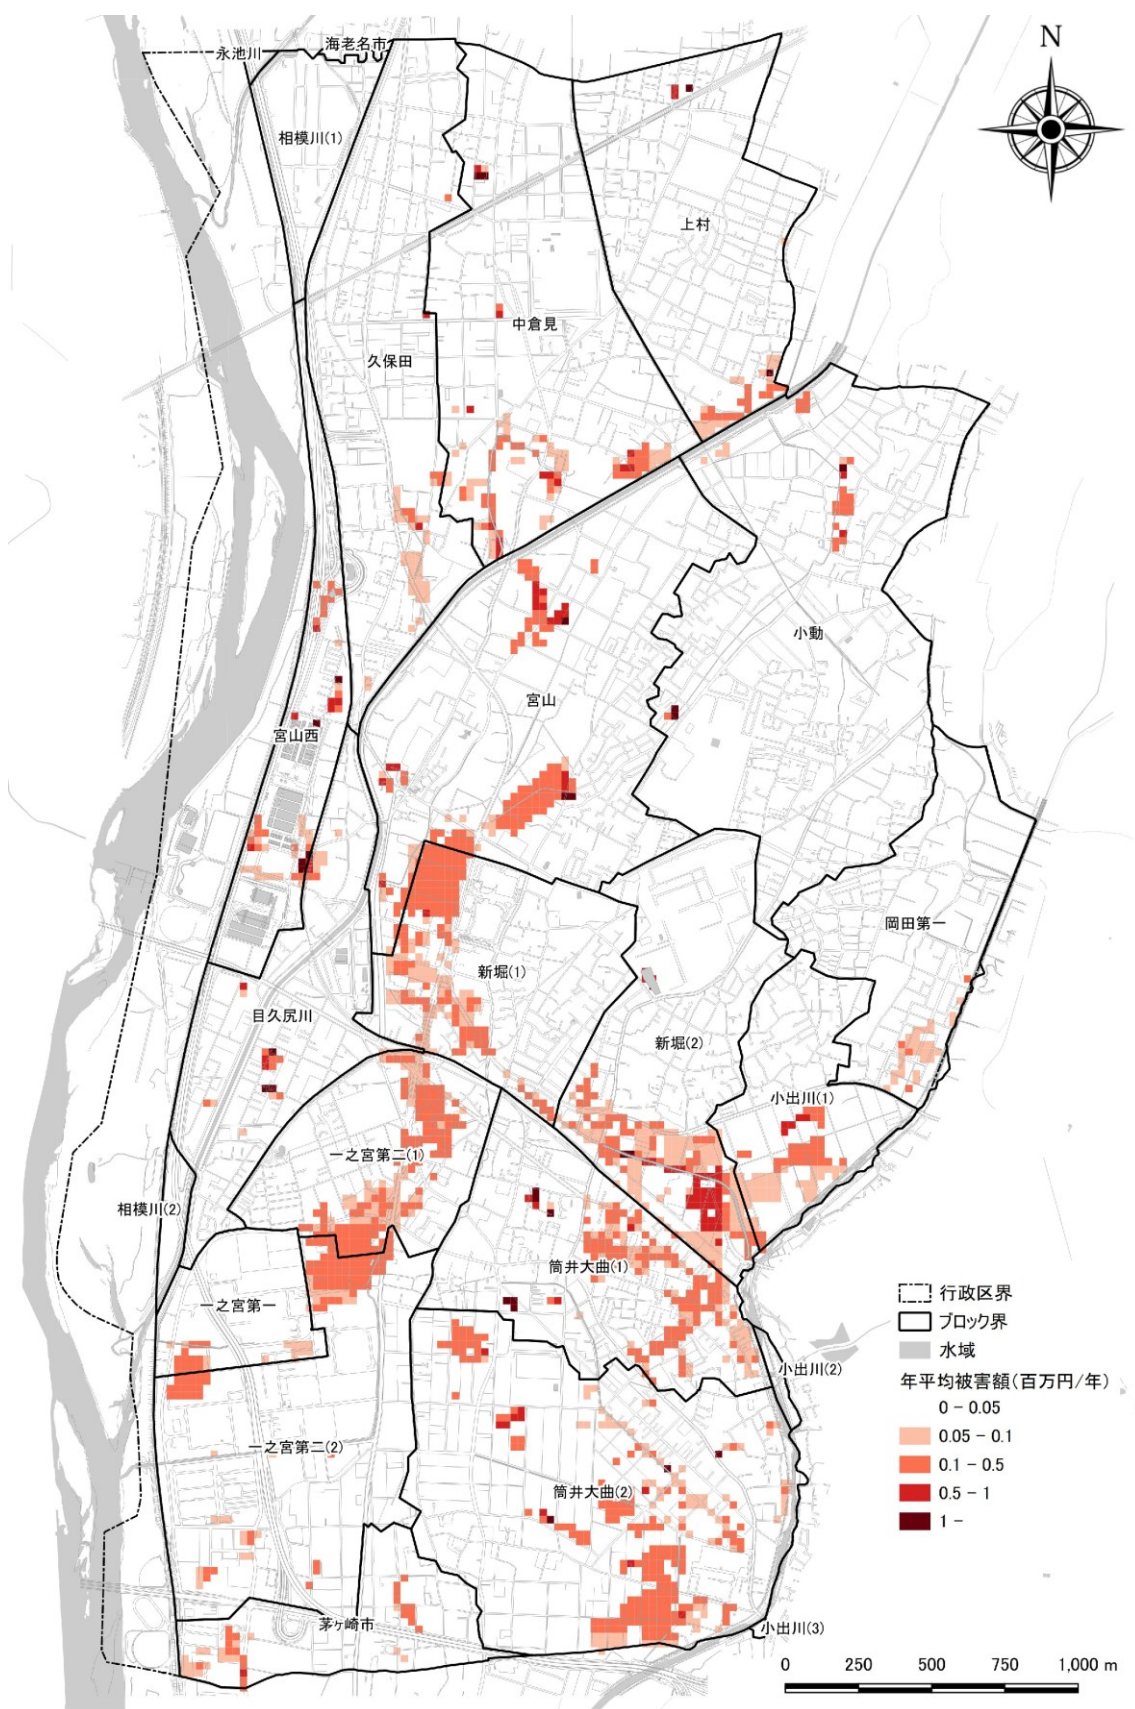


図 5.4 年平均被害額：25m×25m メッシュ

(5) リスク評価

ブロック単位でリスクを評価する。このため、各メッシュの年平均被害額と浸水想定量をブロックごとに足し合わせ、年平均被害額と浸水想定量の関係から、浸水リスクマトリクスを作成する。この時に、ブロックのサイズによる影響を避けるため、加算した年平均被害額と浸水想定量をブロック面積で除した 1ha あたりの値とする。

リスクマトリクスの横軸及び縦軸については、各項目（年平均被害額、浸水想定量）の最大値を参考に 3 分割し、各ブロックの優先度を決定する。

既往最大降雨（降雨規模：時間最大雨量 72mm/h）時における 25m メッシュ単位の年平均被害額と最大浸水深、また年平均被害額と浸水想定量（最大浸水深時の浸水量）を基準化し、掛け合わせたものを示す。

これら情報を用いて、ブロック単位で年平均被害額と浸水想定量を各々加算し、ブロックのサイズによる影響を避けるため、加算した年平均被害額と浸水想定量をブロックの面積で除した 1ha あたりの値としたものを図 5.6 に示す。

相対的に浸水想定量が多いが、被害額が小さいブロックや、浸水想定量は少ないが、被害額が大きいブロック、双方ともに大きいブロックなど、各々のブロックで特徴が表れているが、相対的には最優先して整備するブロックが表れていない。

照査降雨に対する減災対策を進める際には、「新堀」、「宮山西」、「筒井大曲」、「小出川直接流出」から優先的に整備すると効率的と考えられる。

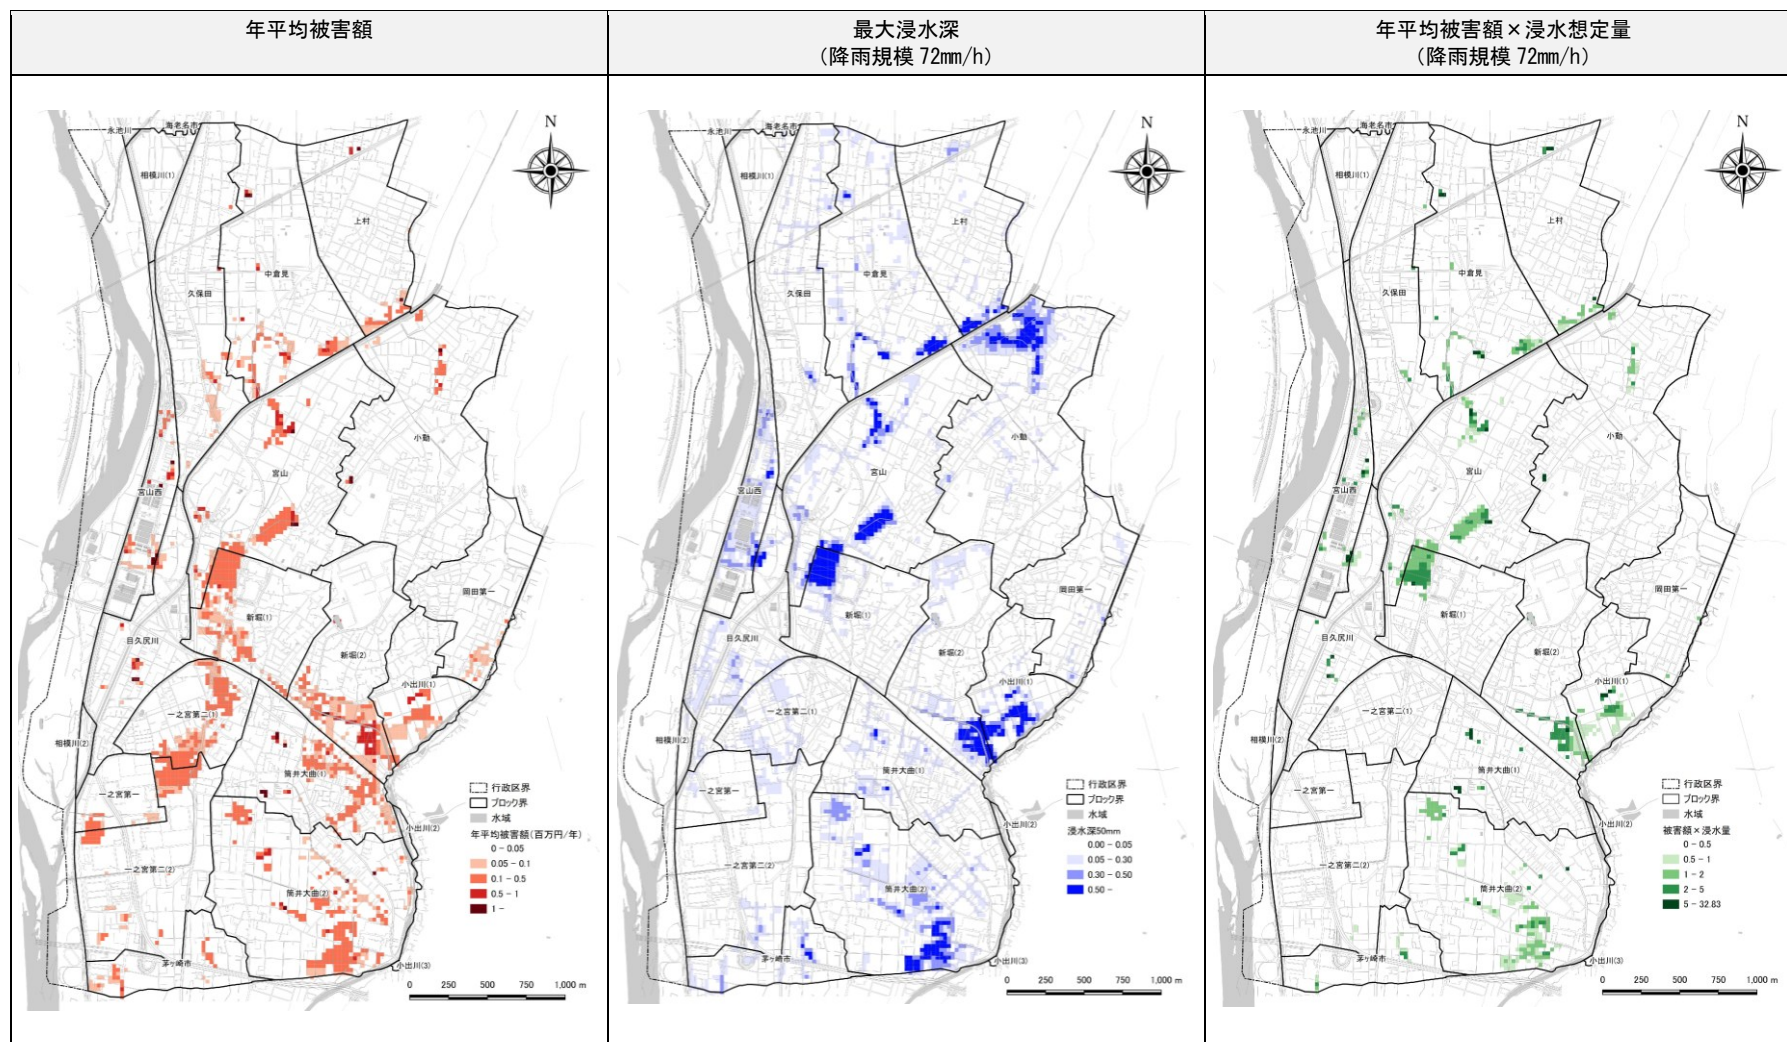


図 5.5 25m メッシュ単位の年平均被害額と浸水想定量の分布状況：降雨規模 72mm/h

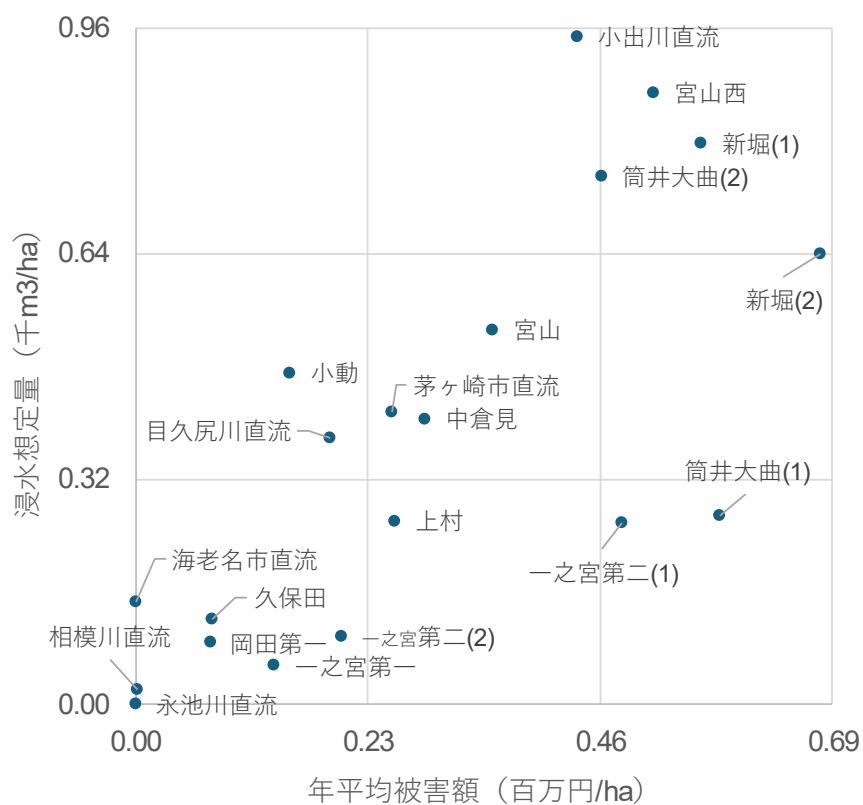


図 5.6 ブロック別の年平均被害額と浸水想定量の関係

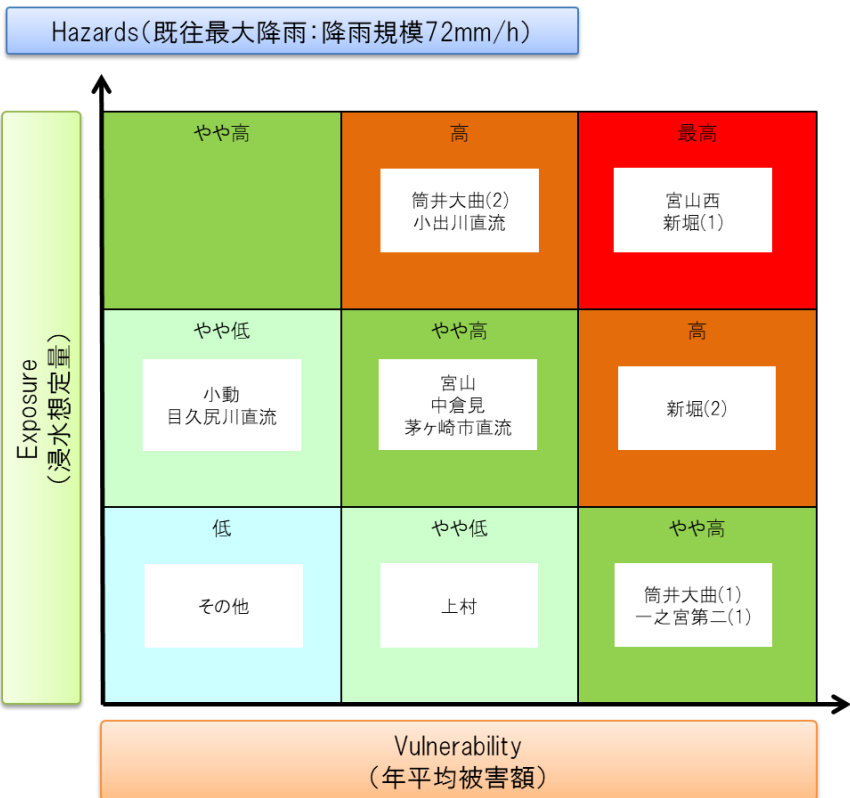


図 5.7 ブロック別のリスクマトリックス

5.2. 整備目標および対策目標の設定

ここでは、前述のリスク評価を踏まえ、整備目標と対策目標を設定する。整備目標とは「計画降雨に対するハード対策の目標」、対策目標とは「照査降雨に対するハード・ソフト対策の目標」のことである。

(1) 整備目標

今後の下水道計画では、下水道で浸水被害を防ぐべき目標となる降雨（計画降雨）を下水道管理者が定める事業計画に位置付け、施設整備の目標を明確化することが求められており、同時にこの計画降雨には気候変動による将来の降雨量増加を反映させることが推奨されているため、計画降雨について、現行計画降雨の降雨強度式（現計画公式）と気候変動を考慮した降雨強度式（新公式）を比較し、従来公式の妥当性を確認した。

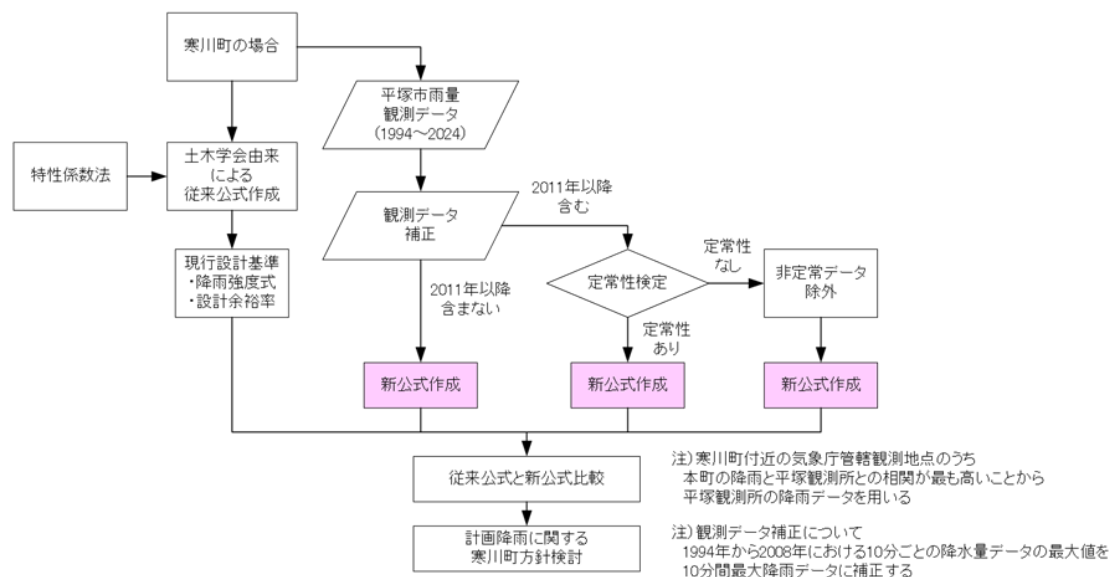


図 5.8 計画降雨の妥当性検討フロー

結論として、現計画公式と新公式による計画雨水量は大きく変わることがなく、また、下水道計画としての一貫性を考慮すると、現計画公式を引き続き採用することが適切であると考えことから、整備目標は、現計画公式（降雨確率年：5年、1時間雨量：50mm/h）を採用する。

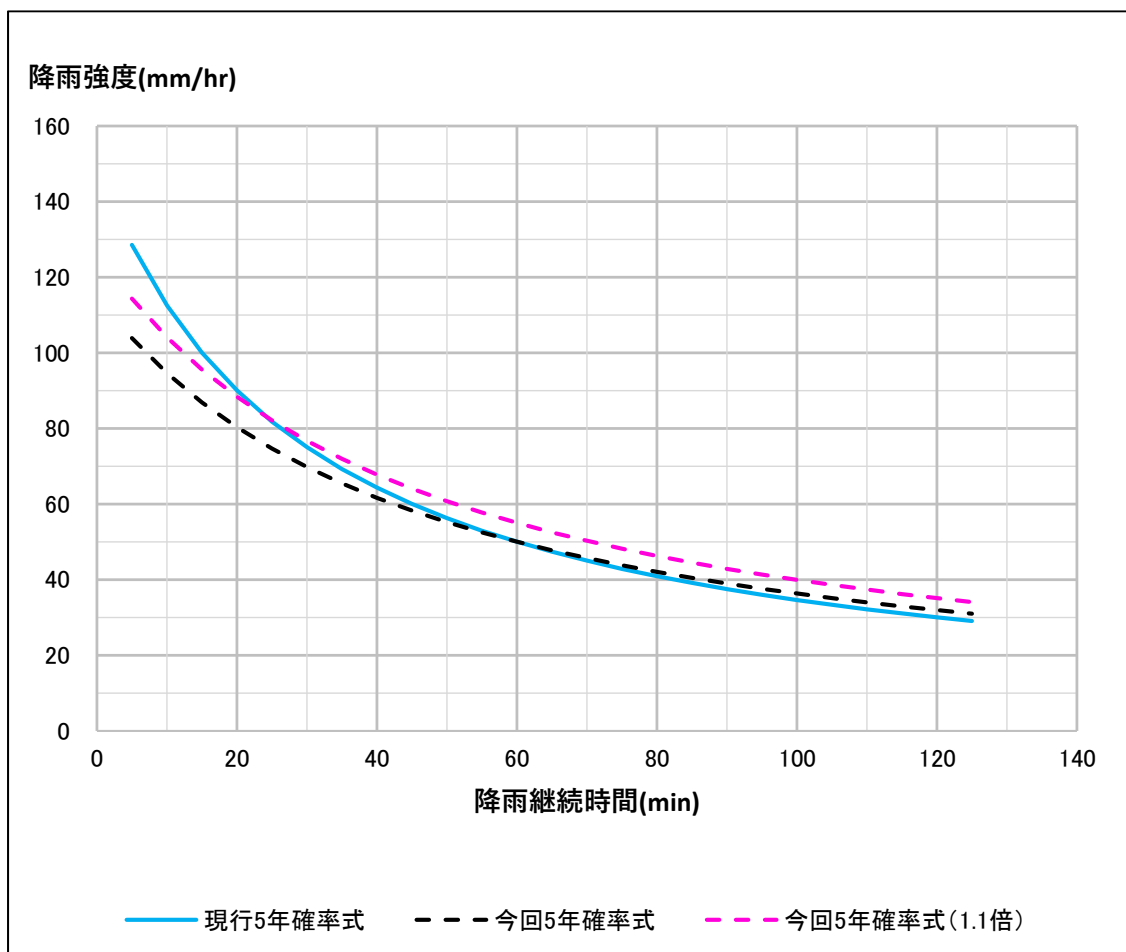


図 5.9 現行降雨強度式と新公式の比較（5 年確率）

(2) 対策目標

ハードのみの対策には限界があることから、照査降雨に対して浸水リスクに応じた細やかな対策目標を設定する。

照査降雨とは（L1'）、「下水道施設計画・設計指針と解説・2019 年版」によると、「下水道は河川と比べて流域面積が小さいことから、L1'降雨は、災害の再発防止の観点から流域で発生した降雨のうち、短時間雨量（10～60 分雨量）が既往最大の降雨や一定の被害が想定される降雨を基本とし、計画降雨から想定最大規模降雨（L2 降雨）の間で、地域の実情に応じて設定する」とある。

このため、照査降雨は、「計画降雨：50mm/h」から「想定最大規模降雨：153mm/h」の間の「既往最大降雨：72mm/h」を採用することとし、対策目標は、「命を守り」「壊滅的な被害を回避」する観点から、この照査降雨（既往最大降雨）に対して、「床上浸水の防除」とする。

6. 段階的対策方針・計画の検討

6.1. 段階的対策方針の設定

(1) 基本方針

段階的対策を検討するにあたり、下表に示すように基本方針を設定する。

表 6.1 基本方針

項目			内容
整備目標			下水道計画の確率降雨年を一律 5 年とする
対策 目標	計画降雨 (50mm/h)	目標	浸水抑止
		対策	事業計画のハード対策とし、長期的な面（枝線）整備を推進する
	照査降雨 (72mm/h)	目標	床上浸水の防除
		対策	浸水深 0.5m 以上となる箇所について、ハード対策として優先的に事業計画の枝線整備を推進し、足りない箇所については、既存ストックを最大限活用した下水道整備。ソフト対策として止水板や流出抑制施設の助成等の推進、内水ハザードマップ等の作成・公表、宅地のかさ上げ・ピロティ建築の推奨等とする
	浸水対策実施区域		下水道計画区域全域を対象に上記の目標に応じた対策を実施
	実施区域外		ハード対策は他部局が管理する既存水路等で対応する（既存水路を活用した対策を相互が協力する）ことを基本とし、ソフト対策として河床の掘り下げを河川管理者（神奈川県）に要請するなど、他部局と連携した対策とする

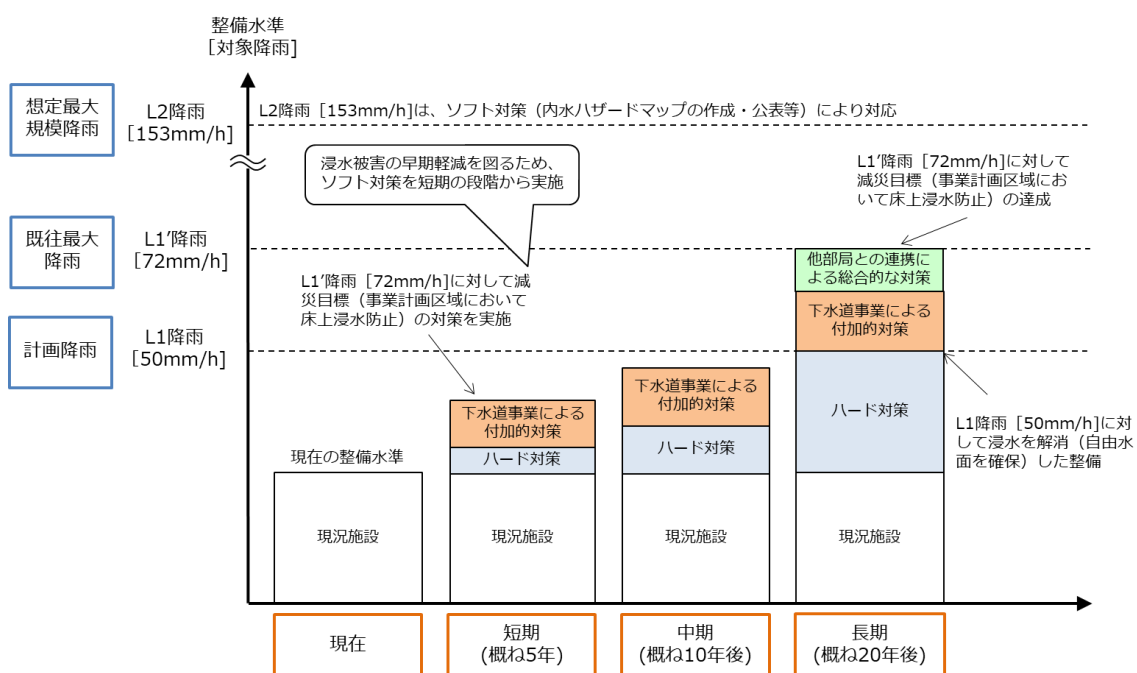


図 6.1 目標の達成に向けた段階的整備計画のイメージ

(2) 対策メニュー案

計画降雨に対しては、既定の下水道全体計画に基づき、長期的な面（枝線）整備対策が考えられる。一方、照査降雨に対しては、「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）、令和 3 年 11 月、国土交通省水管理・国土保全局下水道部」によると、ストックを活用して迅速かつ効率的に対策が可能なハード対策と、施設情報及び観測情報を活用したソフト対策の一覧が示されている。

以下、基本方針に基づいて各懸案箇所における対策メニュー案を検討する。なお、現在進行中の事業計画については、事業継続性を優先して優先度が高いと判断する。

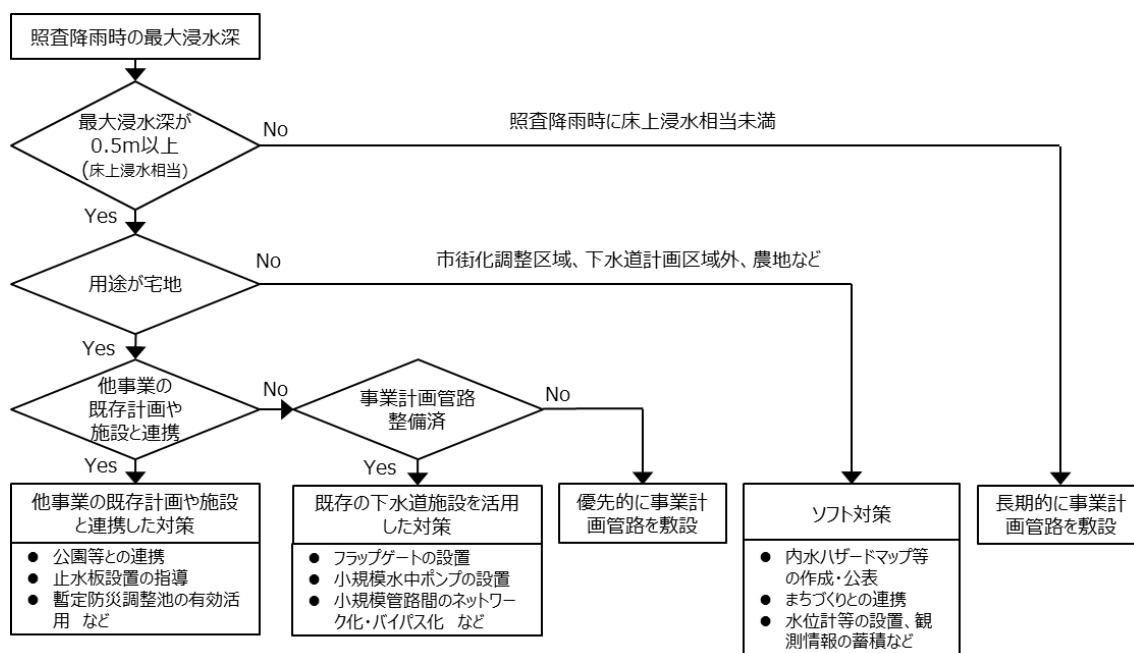


図 6.2 対策メニューの抽出フロー

表 6.2 ストックを活用したハード対策、ソフト対策の一覧

ハード対策	既存の下水道施設を活用した対策	付加的施設や改築等による最適化	1) 管きよの一部増径
			2) 大規模幹線間やポンプ場間のネットワーク化
			3) 小規模管路間のネットワーク化・バイパス化
			4) 改築にあたっての既存施設等の有効活用
			5) 既存管路活用と相乗して能力を高める雨水貯留施設整備
			6) 流下貯留型化による雨水貯留施設の有効活用
			7) フラップゲート、小規模水中ポンプ（可搬式ポンプ）、ポンプゲートの設置
	既存の下水道施設の多目的化	段階的な早期の効果発現	1) 合流式下水道の改善対策施設等の浸水対策利用
			1) 大規模幹線等の雨水貯留施設としての利用
			2) 取水施設の早期整備
ソフト対策	他事業の既存計画や施設と連携した対策		1) 河川の調整池と下水道の雨水貯留施設の直接接続等による連携
			2) 水路等との連携
			3) 取り込み施設の能力増強等による連携
			4) 小型雨水貯留浸透施設の道路側溝下部等への設置
			公園・緑地、校庭、駐車場、田んぼ、ため池等との連携
			5) （公用地での無動力型オフサイト調整池、校庭・田んぼ・お濠に雨水を一時的に貯留等）
			6) 流域保全林等との連携
			7) 官民連携した浸水対策（民間貯留施設等）
			8) 雨水貯留浸透施設整備や止水板設置の指導や助成制度の導入等（貯留浸透ます・貯留槽、駐車場等の透水性舗装、止水板等）
			9) 不要になった浄化槽の改造
			10) 河川部局等との合築
			11) 暫定防災調整池の恒久化・有効活用
	施設情報及び観測情報を下水道事業に活用した対策		1) 雨量計のほか、水位計や浸水計等の積極的な設置、観測、情報の蓄積・分析
			2) 流出解析モデルの精度向上や観測情報による水害要因分析に基づくきめ細やかな対策の検討
			3) 高精度降雨情報システム（XRAIN 等）の活用/リアルタイム運用システムの構築
	施設情報及び観測情報をリスクコミュニケーションに活用した対策		1) 内水ハザードマップ等の作成・公表
			2) 観測情報や施設運転状況の住民への多様な手法による情報発信（HP、エリアメール、行政メール、サイレン等）
			3) 災害対策基本法に基づく避難指示・避難勧告への反映
			4) 建築基準法に基づく災害危険区域への反映
			5) 地下街等の管理者に対する浸水リスクの啓発
			6) まちづくりとの連携
			7) まるごとまちごとハザードマップの実施
			8) 危機管理体制構築のための訓練/出前講座等による図上訓練
			9) 被災直後の速報性のある整備効果や今後の整備方針の広報
			10) 住民、事業者からの情報収集及び協働した水防活動

出典：「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）」（令和 3 年 11 月、国土交通省）

 ：本町の地域特性等を鑑みて有用性が高いと考えられる対策

6.2. 段階的対策計画の検討

段階的対策計画は、段階的対策方針に基づき、計画降雨に対するハード対策及び照査降雨に対するハード対策、ソフト対策を位置付ける。なお、事業化が想定される排水区に対しては、流出解析モデルによる段階的対策計画の効果検証を行う。また、将来的には気候変動の影響を考慮し見直しを行った後の計画降雨に対して自由水面を確保できる施設の整備を前提とした計画とする。

(1) 計画降雨における対策検討

計画降雨に対して、幹線、ポンプ場、貯留施設等のハード対策を検討する。検討にあたっては、ストックの活用等を含めたより実現性の高い計画とし、施設の配置、必要規模、概算事業費、整備スケジュール等を算定する。

(2) 照査降雨における対策検討

当該地域の計画降雨や既往最大降雨等を踏まえ、地域の状況に応じて照査降雨を設定し、照査降雨に対してハード対策とソフト対策を組み合わせた対策を検討する。具体的には、令和2年度報告書の段階的対策メニューを基に、整備済みの対策、整備困難な対策（関連部局と連携した対策が困難など）を確認した上で、地域の状況や当面・中期・長期の段階に応じた対策メニュー案を検討し、抽出する。

次頁に対策メニュー案の一覧表を示す。表中の①から⑱のハード対策については、シミュレーションモデルを用いて対策効果を検討した。なお、上村ブロック下流については、県道410号の建設に伴う計画調整池を活用できるかシミュレーションモデル等を用いて検討した。

検討の結果、事業計画の管路施設の布設やフラップゲートの設置を実施することで、宅地において浸水深0.5m以上（床上浸水相当）の浸水防止の効果が確認された。

表 6.3 照査降雨時の対策メニュー案一覧

番号	名称	土地利用	下水道計画区域内外	外水影響	対策メニュー案(照査降雨)		備考
					短中期対策 (ハード対策)	長期対策 (主にソフト対策)	
①	上村ブロック上流	宅地	区域内	無	管路布設	■内水ハザードマップ等公表	
		道路	区域内	無			
②	上村ブロック下流	農地	区域外	有	貯留施設	■内水ハザードマップ等公表 ■運用システム構築による情報発信 ■まちづくりとの連携	既設水門あり 都市計画道路(仮称)湘南台 寒川線が計画
		農地	区域内	有			
③	中倉見ブロック上流	道路	区域内	無		■内水ハザードマップ等公表 ■まちづくりとの連携	
		農地	区域内	無			
④	中倉見ブロック下流	農地	区域外	無		■内水ハザードマップ等公表 ■まちづくりとの連携	事業計画策定時に対策検討 を実施予定
		農地	区域内	無			
⑤	久保田ブロック上流	農地	区域内	無		■内水ハザードマップ等公表 ■まちづくりとの連携	新幹線新駅誘致の際に対策 検討を実施予定
		道路	区域内	無			
⑥	久保田ブロック下流	道路	区域内	無		■内水ハザードマップ等公表 ■まちづくりとの連携	
		農地	区域内	無			
⑦	小動ブロック下流	農地	区域外	有		■内水ハザードマップ等公表 ■運用システム構築による情報発信	既設水門あり
		宅地	区域内	無			
⑧	小動ブロック上流	宅地	区域内	無	管路布設	■内水ハザードマップ等公表	
		道路	区域内	無			
⑨	宮山ブロック上流	農地	区域外	無		■内水ハザードマップ等公表	
		宅地	区域内	有			
⑩	宮山ブロック下流・ 新堀ブロック上流	道路	区域内	有	フラップゲート	■内水ハザードマップ等公表	
		農地	区域外	有			
⑪	宮山西ブロック	宅地	区域内	無	次回見直し時に検討	■内水ハザードマップ等公表 ■まちづくりとの連携	県広域水道企業団で寒川浄 水場の廃止を計画しているた め、跡地利用時に対策検討 を実施予定
		道路	区域内	無			
⑫	目久尻川直接流出ブロック	道路	区域内	有		■内水ハザードマップ等公表	フラップゲートあり
		農地	区域外	有			
⑬	新堀ブロック下流	道路	区域内	無		■内水ハザードマップ等公表 ■水門等の設置	
		農地	区域内	無			
⑭	一之宮第二(1)ブロック	道路	区域内	無		■内水ハザードマップ等公表 ■まちづくりとの連携	
		農地	区域内	無			
⑮	筒井大曲(1)ブロック	荒地	区域内	無		■内水ハザードマップ等公表 ■まちづくりとの連携	
		農地	区域内	無			
⑯	筒井大曲(2)ブロック上流	道路	区域内	有		■内水ハザードマップ等公表 ■運用システム構築による情報発信	既設水門あり
		農地	区域外	有			
⑰	筒井大曲(2)ブロック下流	道路	区域内	無		■内水ハザードマップ等公表	
		農地	区域外	無			
⑱	茅ヶ崎市直接流出ブロック	道路	区域内	無		■内水ハザードマップ等公表	
		農地	区域外	無			
⑲	小動ブロック	—	—	—	管路布設	—	事業継続性の観点
⑳	岡田第一ブロック	—	—	—	吐口設置	—	事業継続性の観点
					管路布設		
㉑	筒井大曲(1)ブロック	—	—	—	管路布設	—	事業継続性の観点

流出解析モデルにおいて対策施設をモデル化して浸水軽減効果を確認

下水道計画区域内の宅地で浸水深0.5m以上のため、ハード対策を検討

下水道計画区域内の農地で浸水深0.5m以上のため、まちづくりとの連携(宅地の嵩上げ、ピロティ建築等)を検討

外水影響があるため、ゲートや運用システム構築による情報発信を検討

(3) 段階的整備計画

雨水管理総合計画の計画期間は、概ね 20 年の範囲で設定することとする。

雨水対策施設の整備・運営管理に関する目標については、社会資本や既存ストック等の整備状況等を踏まえ、現在の整備水準に加え、短期（概ね 5 年）、中期（概ね 10 年後）、長期（概ね 20 年後）とする。

目標の達成に向けた段階的整備計画は、下表に示すように、段階及び対象降雨ごとに目標を定めて立案する。短期では、主に重点整備地区において床上浸水を防止する対策を実施する。中期では、下水道計画区域において床上浸水を防止する対策を実施する。長期では、下水道計画区域において計画降雨に対し浸水を解消する対策を実施する。

表 6.4 目標の達成に向けた段階的整備計画

段階	計画降雨(L1 降雨) に対する目標 [50mm/h]	照査降雨(L1'降雨) に対する目標 [72mm/h]	想定最大規模降雨 (L2 降雨)に対する目標 [153mm/h]
短期 (5 年)	浸水を軽減 (圧力状態を許容)	一部において 床上浸水を防止	安全な避難の確保
中期 (10 年)			
長期 (20 年)	浸水を解消 (自由水面を確保)	下水道計画区域において 床上浸水を防止	

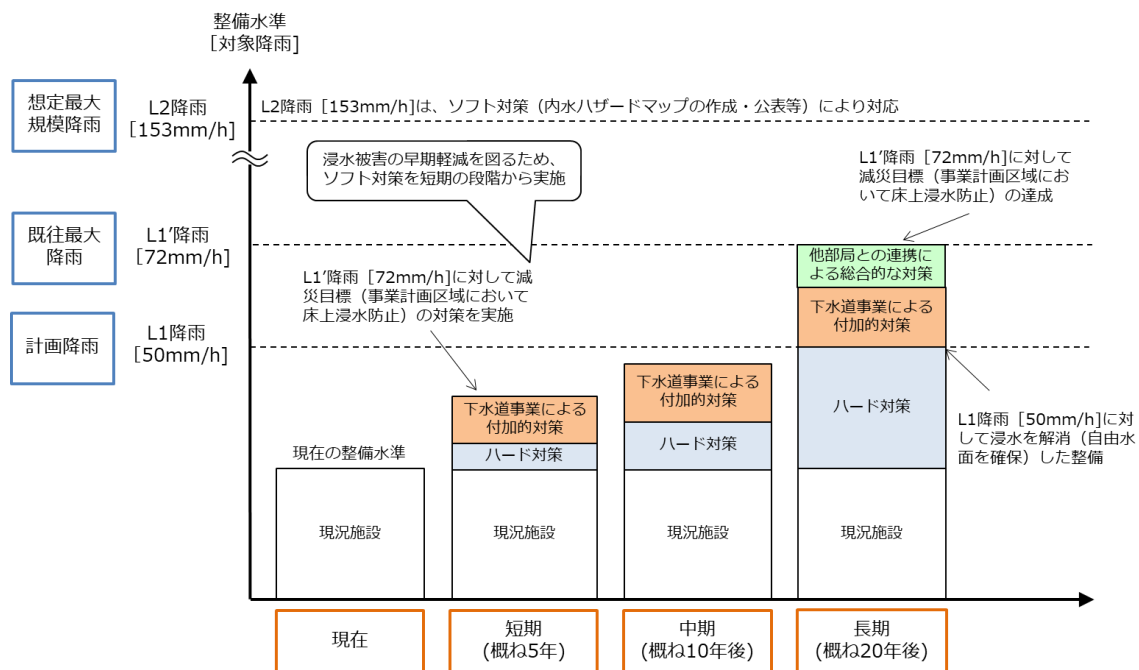


図 6.3 目標の達成に向けた段階的整備計画

対策の時期は、下図に示すように、浸水リスクの評価結果や現在進行中の事業を勘案して設定した。このうち、短期対策に該当する排水区は、重点整備地区と位置付け優先的に整備を実施する計画とした。

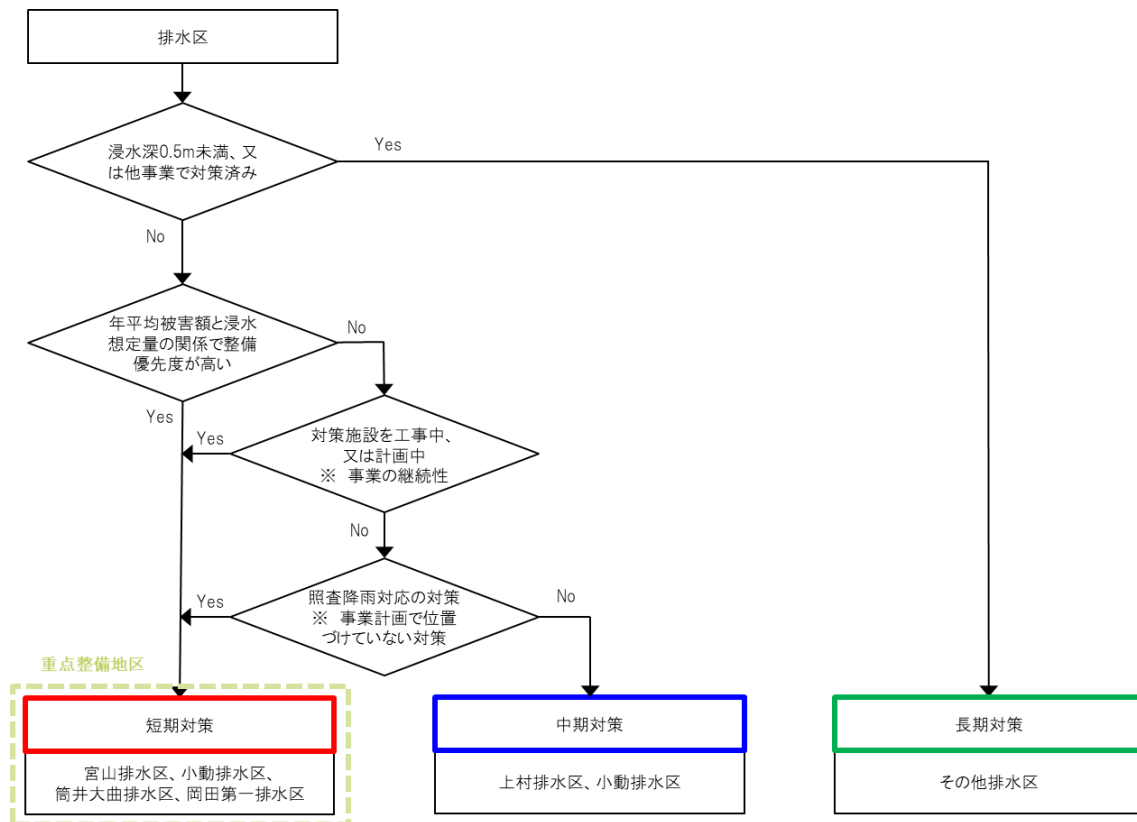


図 6.4 対策時期と重点整備地区の設定

表 6.5 段階的対策メニュー一覧

排水区	段階	対策メニュー	
		ハード	ソフト
久保田	長期	－	内水ハザードマップ等の作成・公表 まちづくりとの連携
中倉見	長期	－ ※事業計画策定時に対策検討を実施予定	内水ハザードマップ等の作成・公表 まちづくりとの連携
上村	中期	管路布設（U800×800）	内水ハザードマップ等の作成・公表 まちづくりとの連携
	中期	雨水調整池（2900m ³ ）	運用システム構築による情報発信
宮山	短期	フラップゲート設置（目久尻川）	内水ハザードマップ等の作成・公表
小動	短期	管路布設（○550～○1100） ※事業継続性の観点	
	中期	管路布設（U700×700～U1200×1100）	－
	長期	－	内水ハザードマップ等の作成・公表 運用システム構築による情報発信
目久尻川直接流出	長期	－	内水ハザードマップ等の作成・公表
宮山西	長期	－ ※浄水場跡地利用時に対策検討を実施予定	内水ハザードマップ等の作成・公表 まちづくりとの連携
一之宮第二	長期	－	内水ハザードマップ等の作成・公表 まちづくりとの連携
新堀	長期	水門等設置（小出川） ※今後対策検討を実施予定	内水ハザードマップ等の作成・公表
筒井大曲	短期	管路布設（U300×300～U400×500） ※事業継続性の観点	内水ハザードマップ等の作成・公表 運用システム構築による情報発信
岡田第一	短期	吐口設置（小出川） 管路布設（○400～○1650） ※事業継続性の観点	－
茅ヶ崎市直接流出	長期	－	内水ハザードマップ等の作成・公表
重点整備地区			

6.3. 財政計画

これまでの検討結果を基に、投資可能額を考慮し、財政計画の立案を行う。

表 6.6 対策メニューと概算事業費一覧

排水区名	幹線名	幹線(m)			対策施設			事業費（百万円）		
		整備済	未整備	計		延長 (m)	種別	短期	中期	長期
久保田	久保田	1,430.00	－	1,430.00	整備済み	－	－	－	－	－
中倉見	中倉見第一号	1,491.75	－	1,491.75	整備済み	－	－	－	－	－
	中倉見第二号	358.00	351.00	709.00	□1000×800～ □1600×1000	358.00	計画降雨	－	－	117
上村	上村	1,263.40	－	1,263.40	U800×800	126.00	照査降雨	－	35	－
		－	－	－	調整池	－	計画降雨	－	387	－
宮山	宮山第一号	1,089.00	－	1,089.00	フラップゲート	－	照査降雨	69	－	－
	宮山第二号	324.00	－	324.00	整備済み	－	－	－	－	－
小動	小動	1,377.00	235.92	1,612.92	○550～○1100	235.92	計画降雨	134	－	－
		－	－	－	U700×700～ U1200×1100	157.00	照査降雨	－	56	－
一之宮第一	一之宮西	115.00	－	115.00	整備済み	－	－	－	－	－
宮山西	宮山西	320.00	－	320.00	整備済み	－	－	－	－	－
一之宮第二	一之宮	1,520.00	－	1,520.00	整備済み	－	－	－	－	－
新堀	新堀	1,567.60	－	1,567.60	整備済み	－	－	－	－	－
		－	－	－	水門等の検討 対策により費用が変動 するため事業費は未定	－	－	－	－	－
	大塚	410.30	－	410.30	整備済み	－	－	－	－	－
筒井大曲	大曲	1,490.62	250.38	1,741.00	U300×300～ U400×500	250.38	計画降雨	53	－	－
岡田第一	岡田第一号	－	134.75	134.75	○400～○1650	134.75	計画降雨	86	200	143
		－	－	－	吐口	－	計画降雨	92	－	－
合 計		12,756.67	972.05	13,728.72	－	1,262.05	－	341	677	259

事業費累計		
短期 (5年)	中期 (10年)	長期 (20年)
3.4億	10.2億	12.8億
27%	80%	100%

7. 雨水管理総合計画マップ作成

地域ごとに下水道計画区域、計画降雨（整備目標）、段階的対策方針・計画をマップ化してとりまとめる。

7.1. 雨水管理総合計画マップへの掲載情報の選定

雨水管理総合計画マップに掲載する情報は、主に次の 5 項目とする。

- 下水道計画区域
- 重点整備地区
- 計画降雨（整備目標）
- 段階的対策方針（短期、中期、長期）
- 対策施設の位置及び諸元

7.2. 雨水管理総合計画マップの作成

前述の 5 項目の情報を網羅した雨水管理総合計画マップを作成する。ただし、計画降雨は下水道計画区域全域において一律 5 年確率（50mm/h）であるため（地域によって計画降雨が変わらないため）、代わりに各対策が計画降雨と照査降雨のどちらの降雨対応の対策であるかが把握できるようにマップを作成する。

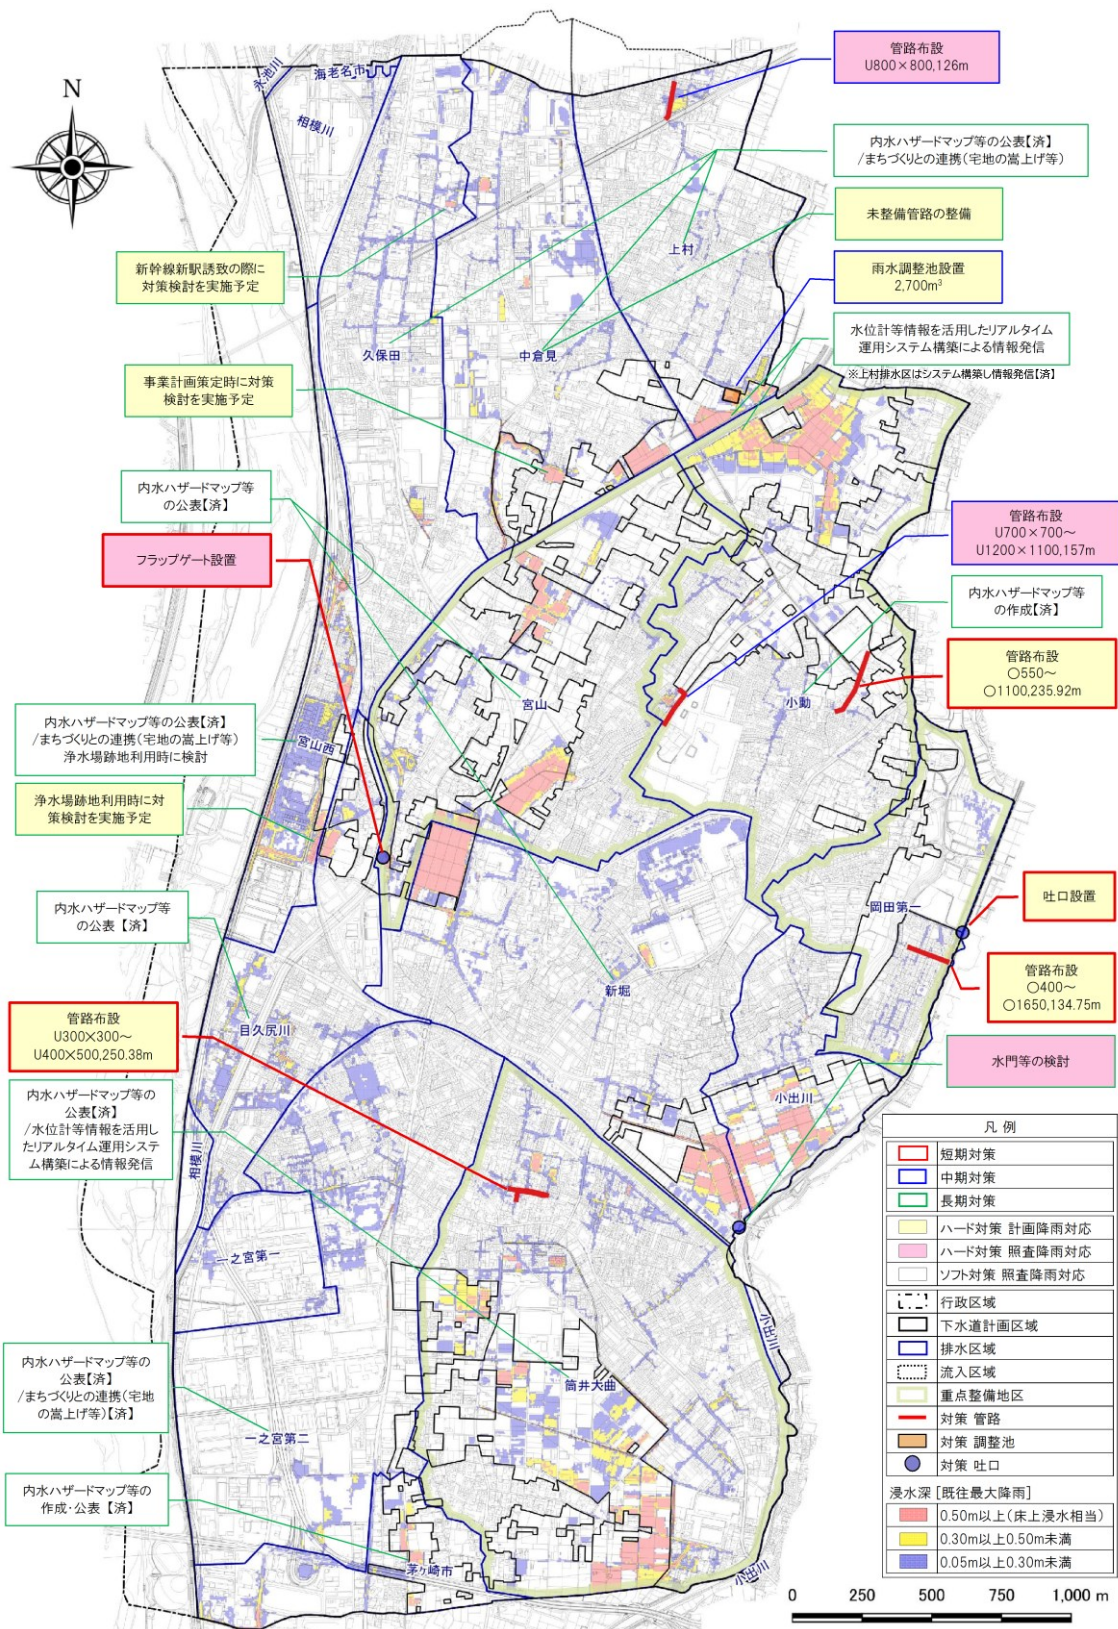


図 7.1 雨水管理総合計画マップ
